

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU 39 ML

Entreprise: SARL BREBANT FORAGE

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : L'Aumaurie

14380 LANDELLES ET COUPIGNY

Coordonnées :      **Longitude**      0      **Latitude**      0      Altitude :      0.00    m  
**Zone**    Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 05/05/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 05/05/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Stenuick

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 7.00    m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00    m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00    m

Notes : POMPAGE MAXIMUM : 4 M3 / HEURE

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU 39 ML

Client:

Maître d'oeuvre:

BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

L'Aumaurie

14380

LANDELLES ET COUPIGNY

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	SCHISTE MARRON
1.00	30.00	SCHISTE BLEU
30.00	39.00	SCHISTE FRACTURE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	39.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
31.00	15.00
36.00	8.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	15.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
15.00	23.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
23.00	27.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
27.00	31.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
31.00	35.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
35.00	39.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
9.00	10.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				

## FORAGE D'EAU 39 ML

Travaux réalisés :

1/1

du : 05/05/2023 au : 05/05/2023

Client :

Maitre d'oeuvre :

BREBANT FORAGE

Localisation de l'ouvrage :

14380 LANDELLES ET COUPIGNY

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/196

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

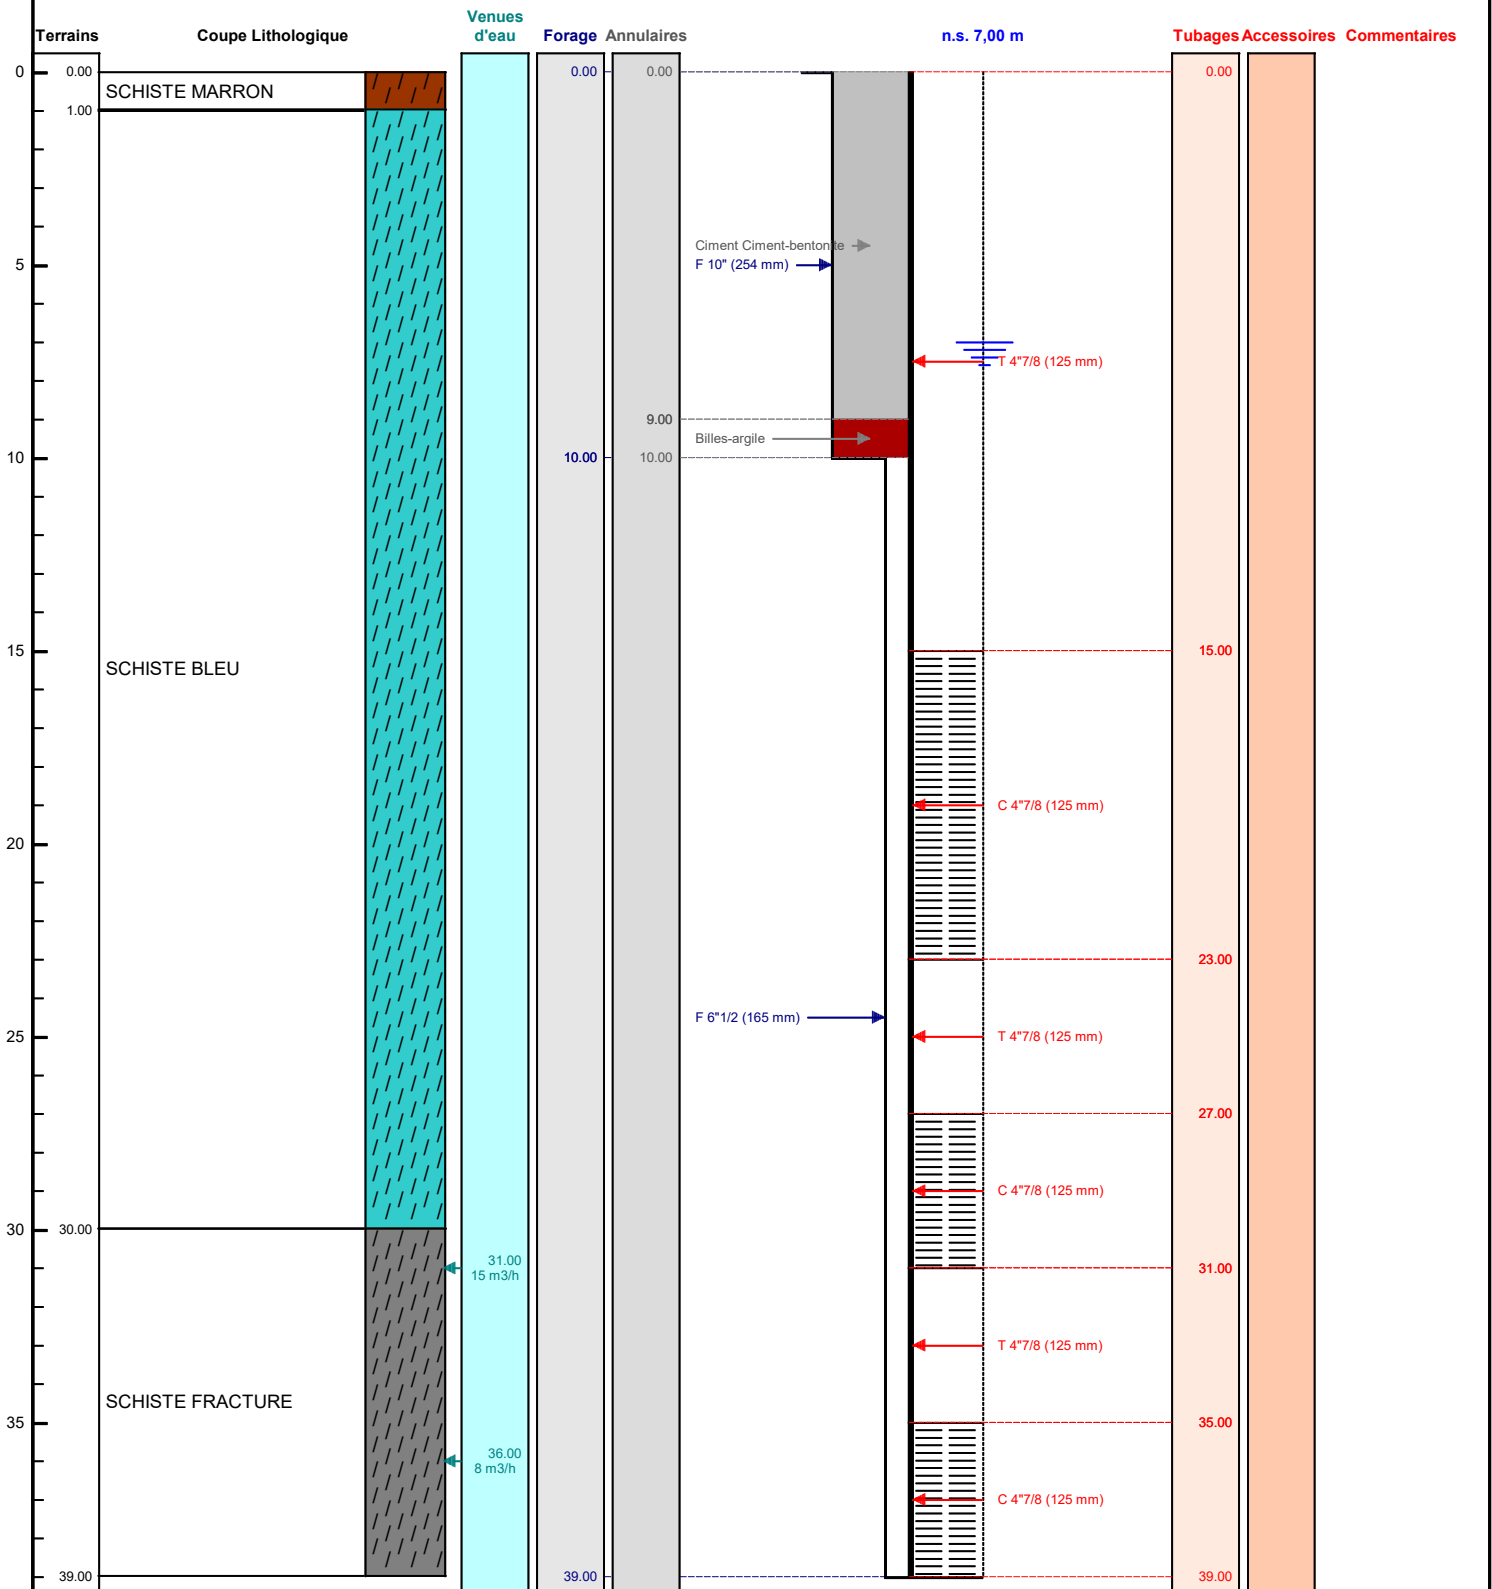

Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
