

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 46 ML

Entreprise: **SARL BREBANT FORAGE**

Client:

Maître d'oeuvre: **BREBANT FORAGE**
ZA DU CLOS DES MARES
50290 BREHAL

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 11 La Duquesnerie
50690 MARTINVAST

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 17/04/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 17/04/2023

Resp. M. Oeuvre :

Stenuick

Resp. Chantier :

début pompage :

Niveau statique non perturbé : 18.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : POMPAGE MAXIMUM: 5.50 M3 / HEURE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 46 ML

Client:

Maître d'oeuvre:

BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

11 La Duquesnerie

50690

MARTINVEST

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	TERRE
2.00	11.00	GRANITE TENDRE
11.00	46.00	GRANITE JAUNE ROSE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	46.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
36.00	1.00
38.00	10.00
46.00	11.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
18.00	26.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
26.00	34.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
34.00	38.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
38.00	42.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
42.00	46.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
11.00	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				

FORAGE D'EAU 46 ML

Travaux réalisés :
du : 17/04/2023 au : 17/04/2023

1/1

Client :

Maitre d'oeuvre :

BREBANT FORAGE

Localisation de l'ouvrage : 11 La Duquesnerie

50690 MARTINVEST

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/231

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

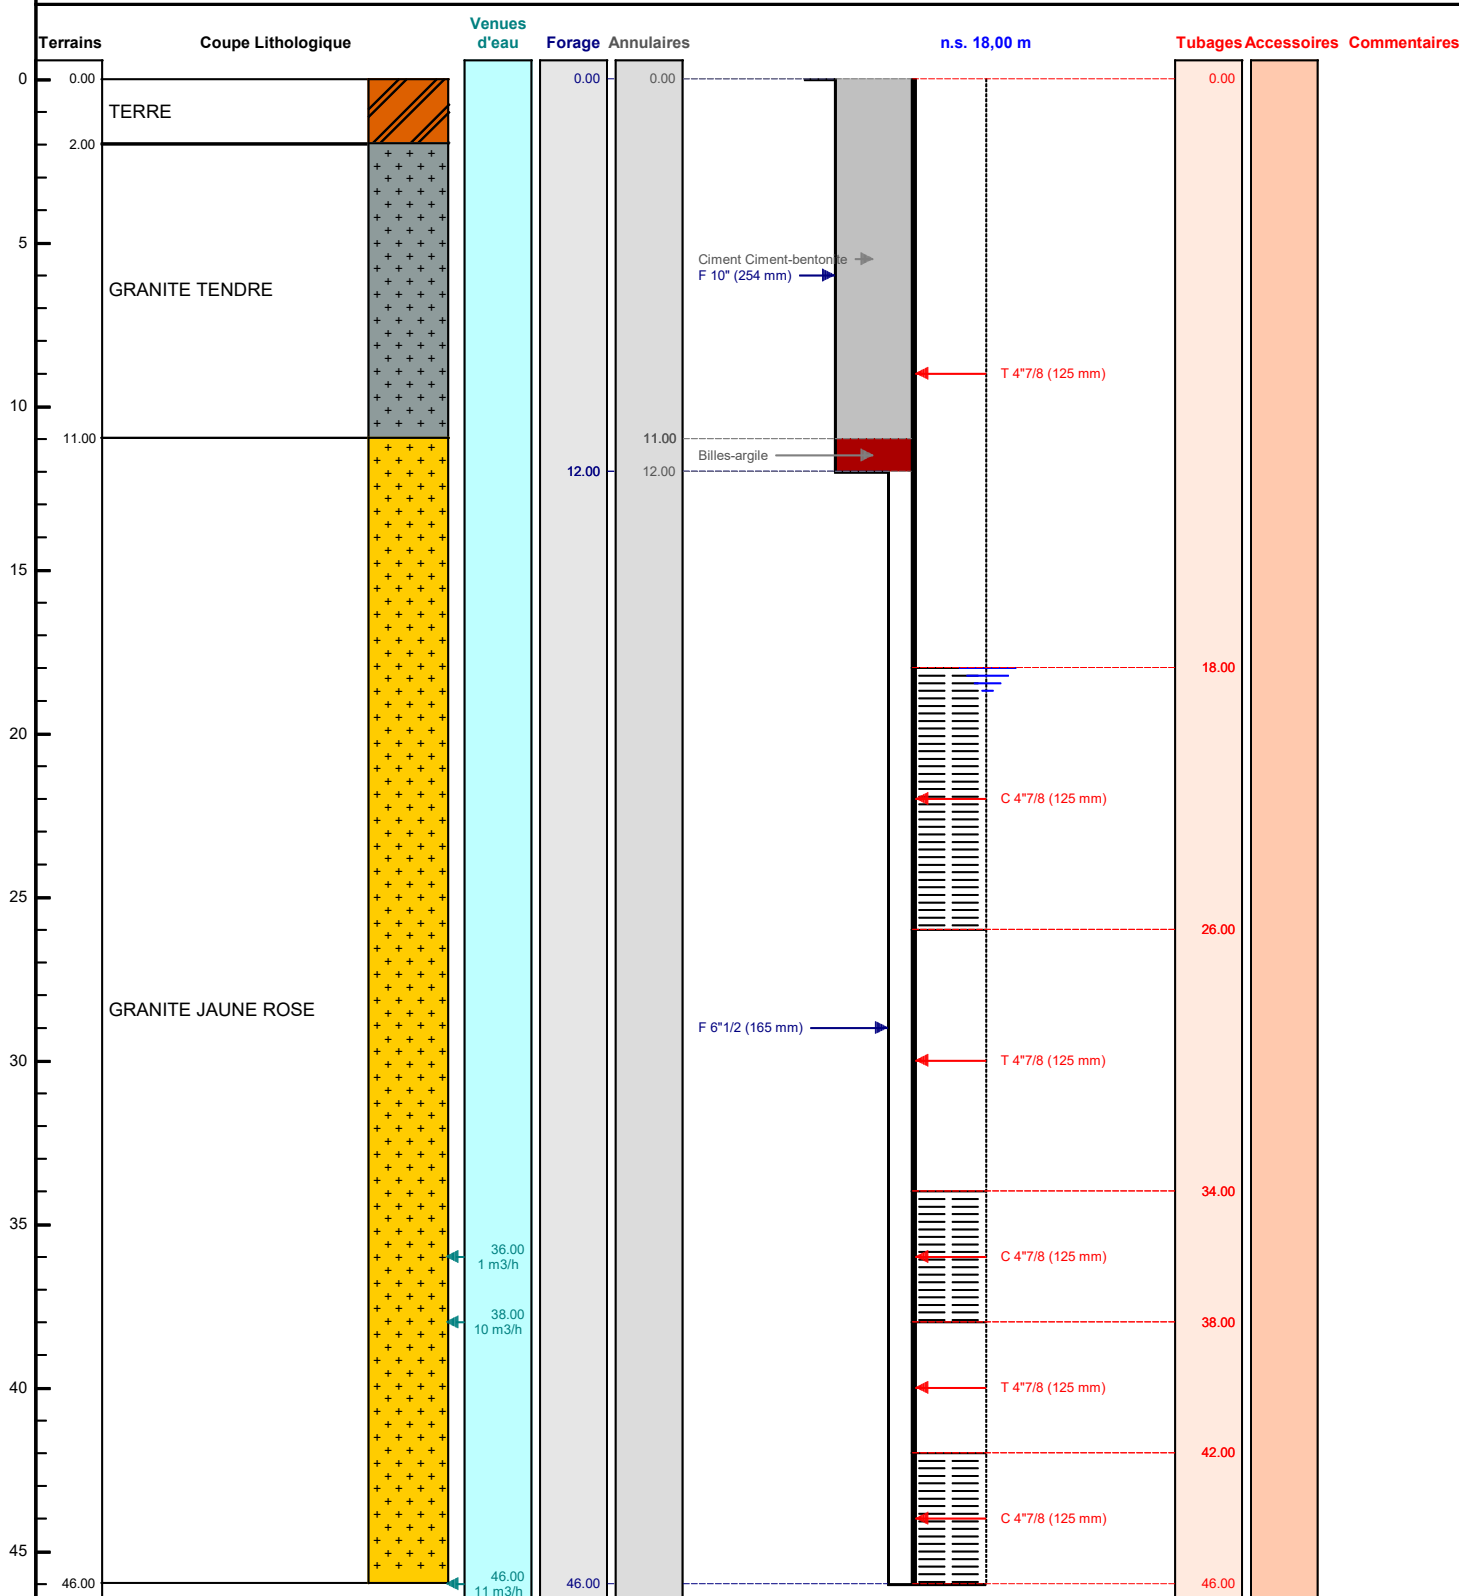

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3
