

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	NORMANDIE FORAGE.
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS : BSS0004EGSD

N° Déclaration ** : 214245

Police de l'eau * : 220824-094146-559-08

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : HARAS DU BOIS

14940 TOUFFREVILLE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 62.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 09/01/2023

Resp. M. Ouvrage : MAILLARD

Date fin de l'ouvrage : 09/01/2023

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 58.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 1.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	
Maitre d'oeuvre:	
Lieu de l'ouvrage :	HARAS DU BOIS
	14940 TOUFFREVILLE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	12.00	ARGILE MARRON CLAIRE
12.00	44.00	ARGILE GRISE
44.00	52.00	CALCAIRE JAUNE
52.00	70.00	ALTERNACE CALCAIRE JAUNE + MARNE
70.00	80.00	CALCAIRE BLANC + SABLE BLANC

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	80.00	8"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
72.00	1.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais	Ecr.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	60.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
60.00	66.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
66.00	72.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
72.00	76.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
76.00	80.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cik	Sous pression			
60.00	80.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU

Client

Maitre d'œuvre

Localisation de l'ouvrage

HARAS DU BOIS

14940 TOUFFREVILLE

Travaux réalisés du 09/01/2023 au 09/01/2023

Coordonnées de l'ouvrage

Lambert 11 (carte métrique)

Longitude (m)


Latitude (m)

Altitude sol (Z) m

Echelle : 1/402

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

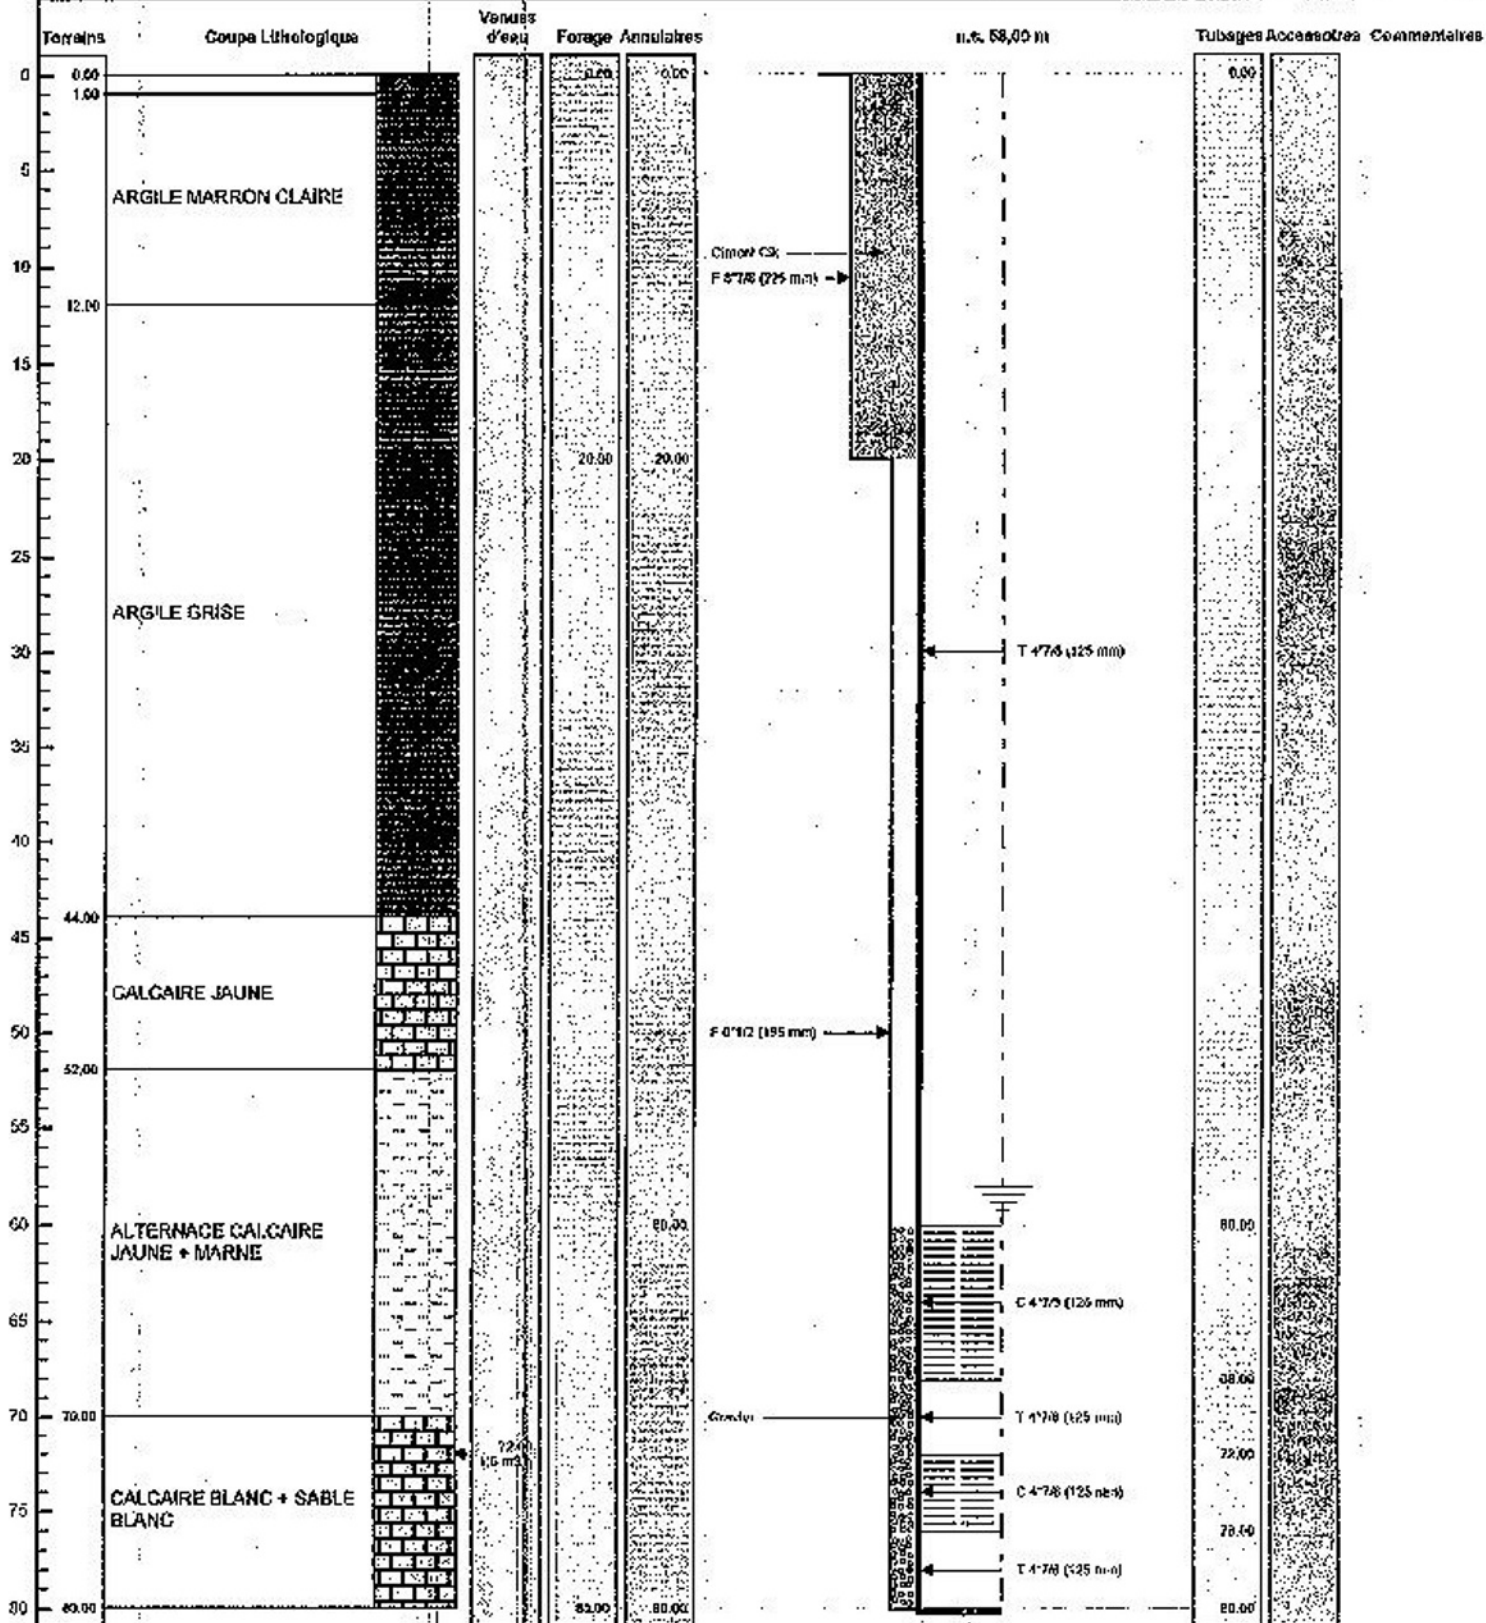

Le *Projet* a été
CERTIFIÉ CONFORME À L'OUV
Tampon et signature du chef d'en

ISON
16874

Lambert 11 (carte métrique)

0 Alt.: +62,000 m

PAGE: 3
