

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 182583

Police de l'eau * : 14-2022-00125

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : CHEMIN HERVIEU

14340 LE PRE D AUGE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 170.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 17/10/2022

Resp. M. Ouvrage : HECART

Date fin de l'ouvrage : 18/10/2022

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 19.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : CHEMIN HERVIEU
14340 LE PRE D AUGÉ

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	25.00	ARGILE MARRON CLAIRE
25.00	30.00	ARGILE ORANGE
30.00	36.00	ARGILE ROUGE
36.00	49.00	CALCAIRE + SABLE VERT BLANC

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
37.00	2.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	33.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
33.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
29.00	49.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 11
du : 17/10/2022 au : 18/10/2022 1

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : CHEMIN HERVIEU

14340 LE PRE D AUGE

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +170,000 m

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

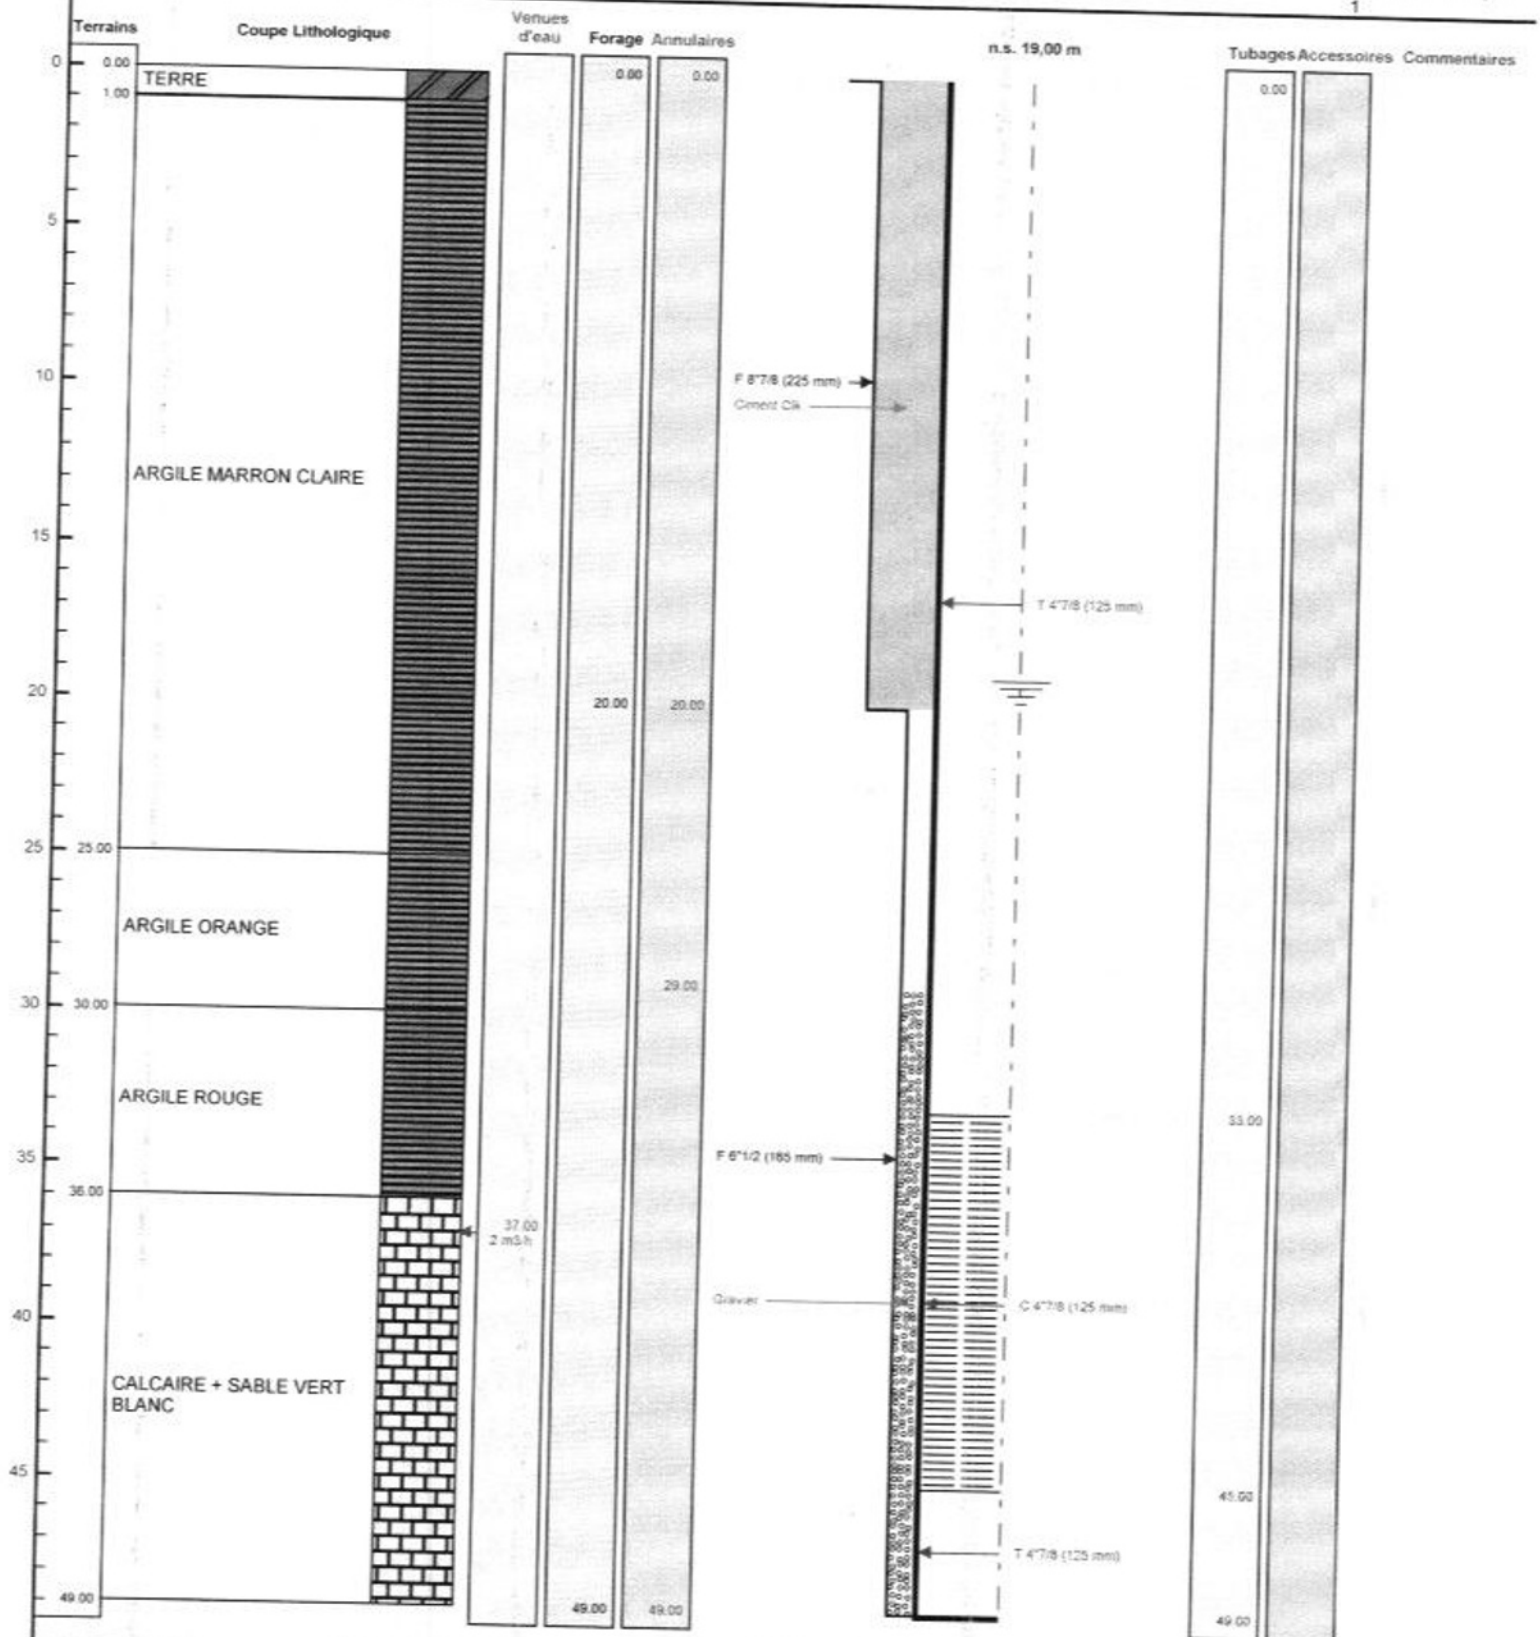

Le 17/11/2022 à version 251
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EX
Tampon et signature du chef d'entreprise

AGE
VERSION
15 05 68 74

Lambert 1 carto métrique Long.:

170,000 m

PAGE: 3
