

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	NORMANDIE FORAGE .
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 166206

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LA FOSSE BONY

14940 TOUFFREVILLE

Coordonnées :      **Longitude**      0      **Latitude**      0      **Altitude :**      0.00 m  
**Zone**      Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 03/05/2022

Resp. M. Ouvrage : DUPERRON

Date fin de l'ouvrage : 03/05/2022

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 16.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 6.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : LA FOSSE BONY  
14940 TOUFFREVILLE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	6.00	REMBLAI + ARGILE GRISE
6.00	12.00	CALCAIRE BLANC
12.00	27.00	ALTERNANCE CALCAIRE GRIS + BLANC + JAUNE
27.00	49.00	ALTERNANCE CALCAIRE DUR, MARRON GRIS CLAIRE, GRIS FONCE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
30.00	1.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	33.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50
33.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
29.00	49.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

# FORAGE D'EAU

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : **LA FOSSE BONY**

**14940 TOUFFREVILLE**


Travaux réalisés : 11  
du : 03/05/2022 au : 03/05/2022 1

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages :  
1

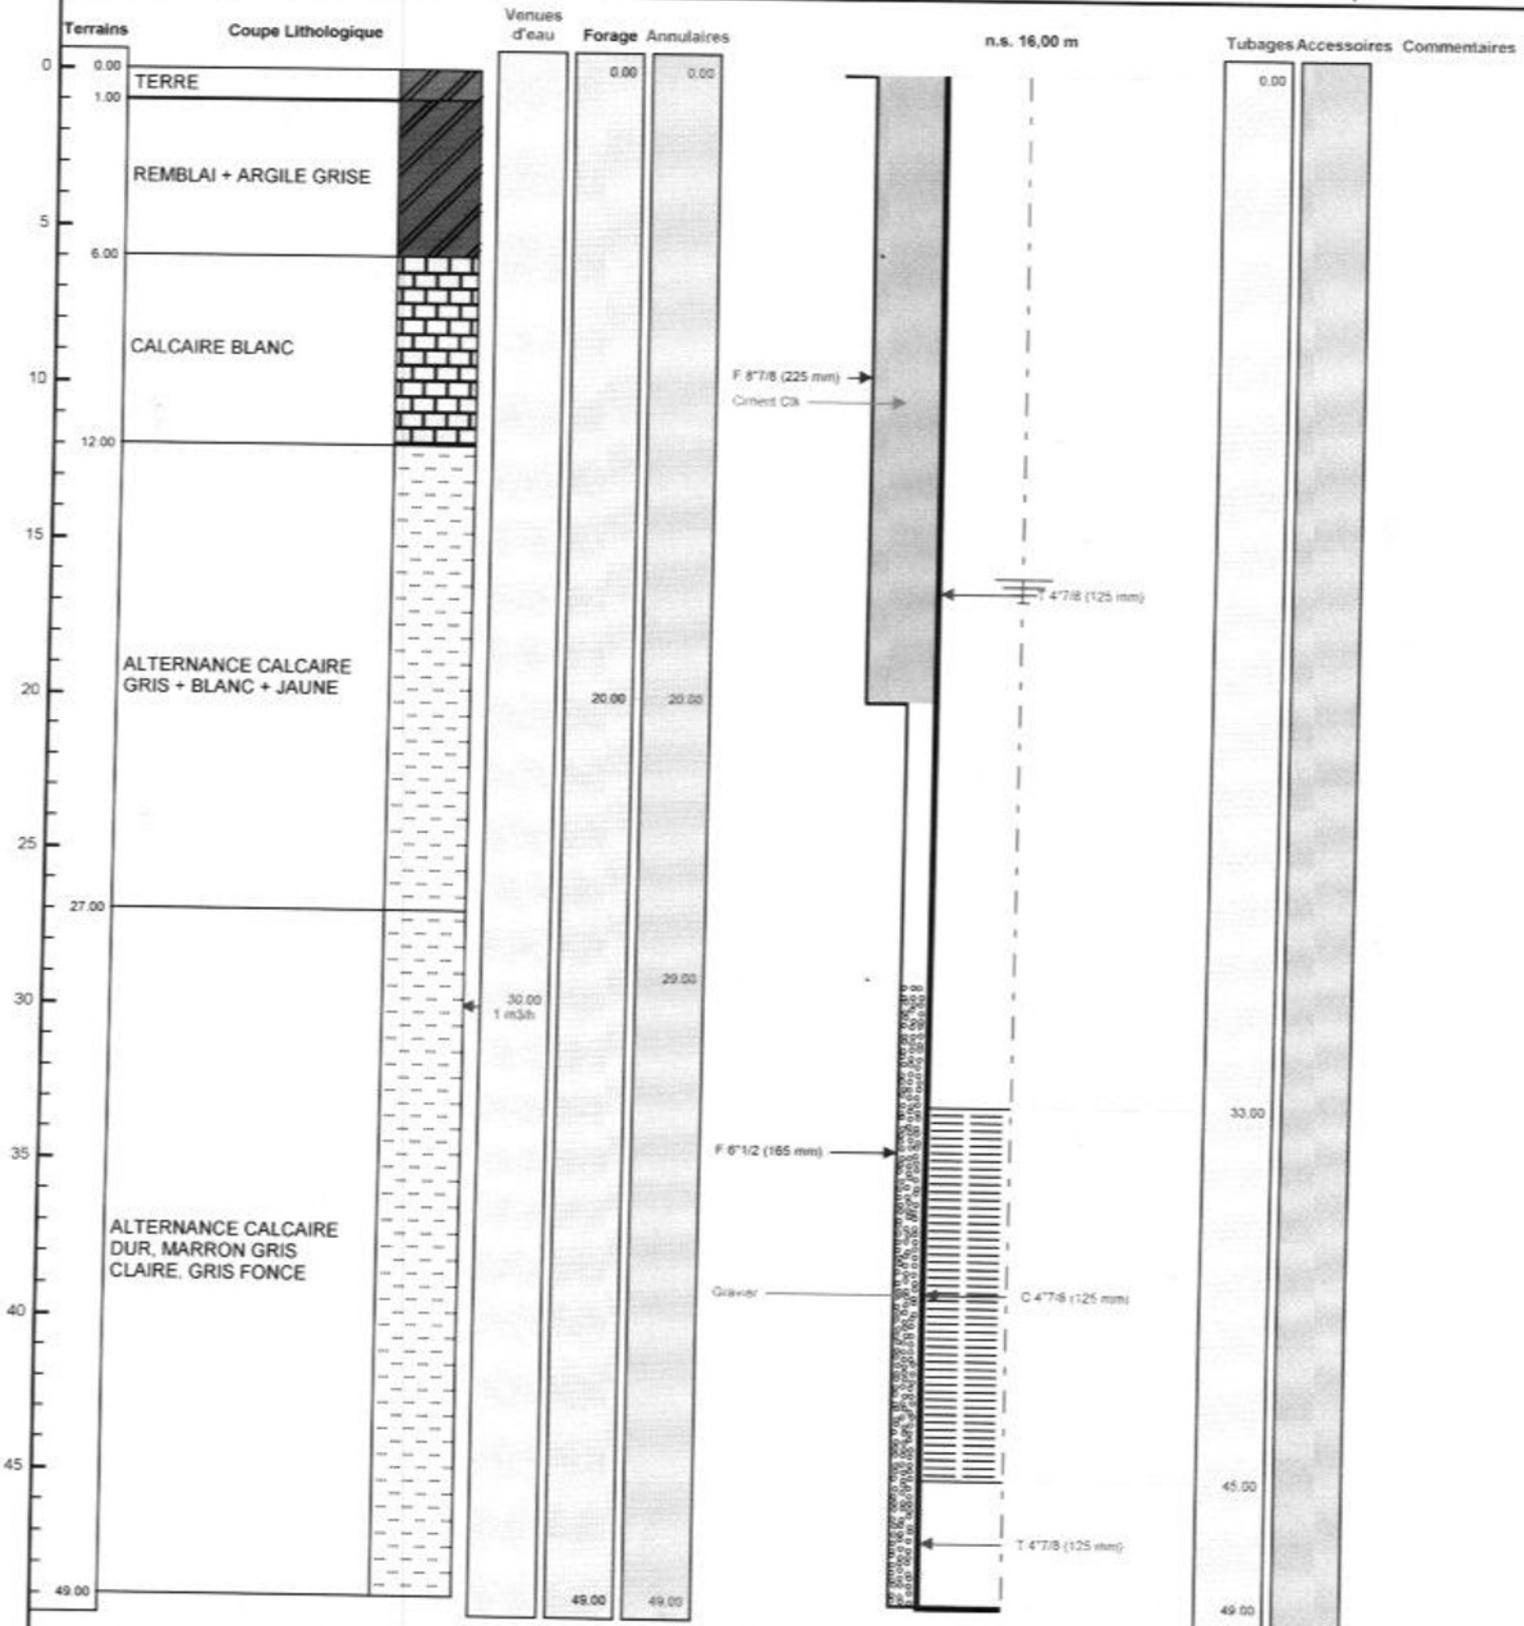

Le 03.05.2022 à ...VERSON...  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE E  
Tampon et signature du chef d'entreprise

**NORMANDIE FORAGE**

VERSON  
5.05 68 74

Lambert 1 carto métrique Long.:

100 m  
Ø 2 m

PAGE: 3
