

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 48 ML

Entreprise: SARL BREBANT FORAGE

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Bourberouge
50140 MORTAIN

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 09/03/2023 **Resp. M. Ouvrage :** JOURDAIN

Date fin de l'ouvrage : 09/03/2023 **Resp. M. Oeuvre :** PRUDENCE

Machine : Stenuick **Resp. Chantier :** PRUDENCE

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes : POMPAGE MAXIMUM: 2 M3 / HEURE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 48 ML

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Bourberouge

50140

MORTAIN

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	10.00	GRES ARGILEUX
10.00	48.00	GRES GRIS

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	14.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
14.00	48.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
35.00	1.00
40.00	4.00
48.00	4.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	24.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
24.00	28.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
28.00	32.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
32.00	40.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
40.00	44.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
44.00	48.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	13.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
13.00	14.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				


FORAGE D'EAU 48 ML		Travaux réalisés : 111 du : 09/03/2023 au : 09/03/2023
Client :		Coordonnées de l'ouvrage : Lambert 1 carto métrique Longitude (X): 0 Latitude (Y): 0 Altitude sol (Z): +0,000 m
Maitre d'oeuvre :		
Localisation de l'ouvrage :	Bourberouge	
	50140 MORTAIN	

50140	MORTAIN
-------	---------

1\1

+0,000 m

Nombre de forages : 1

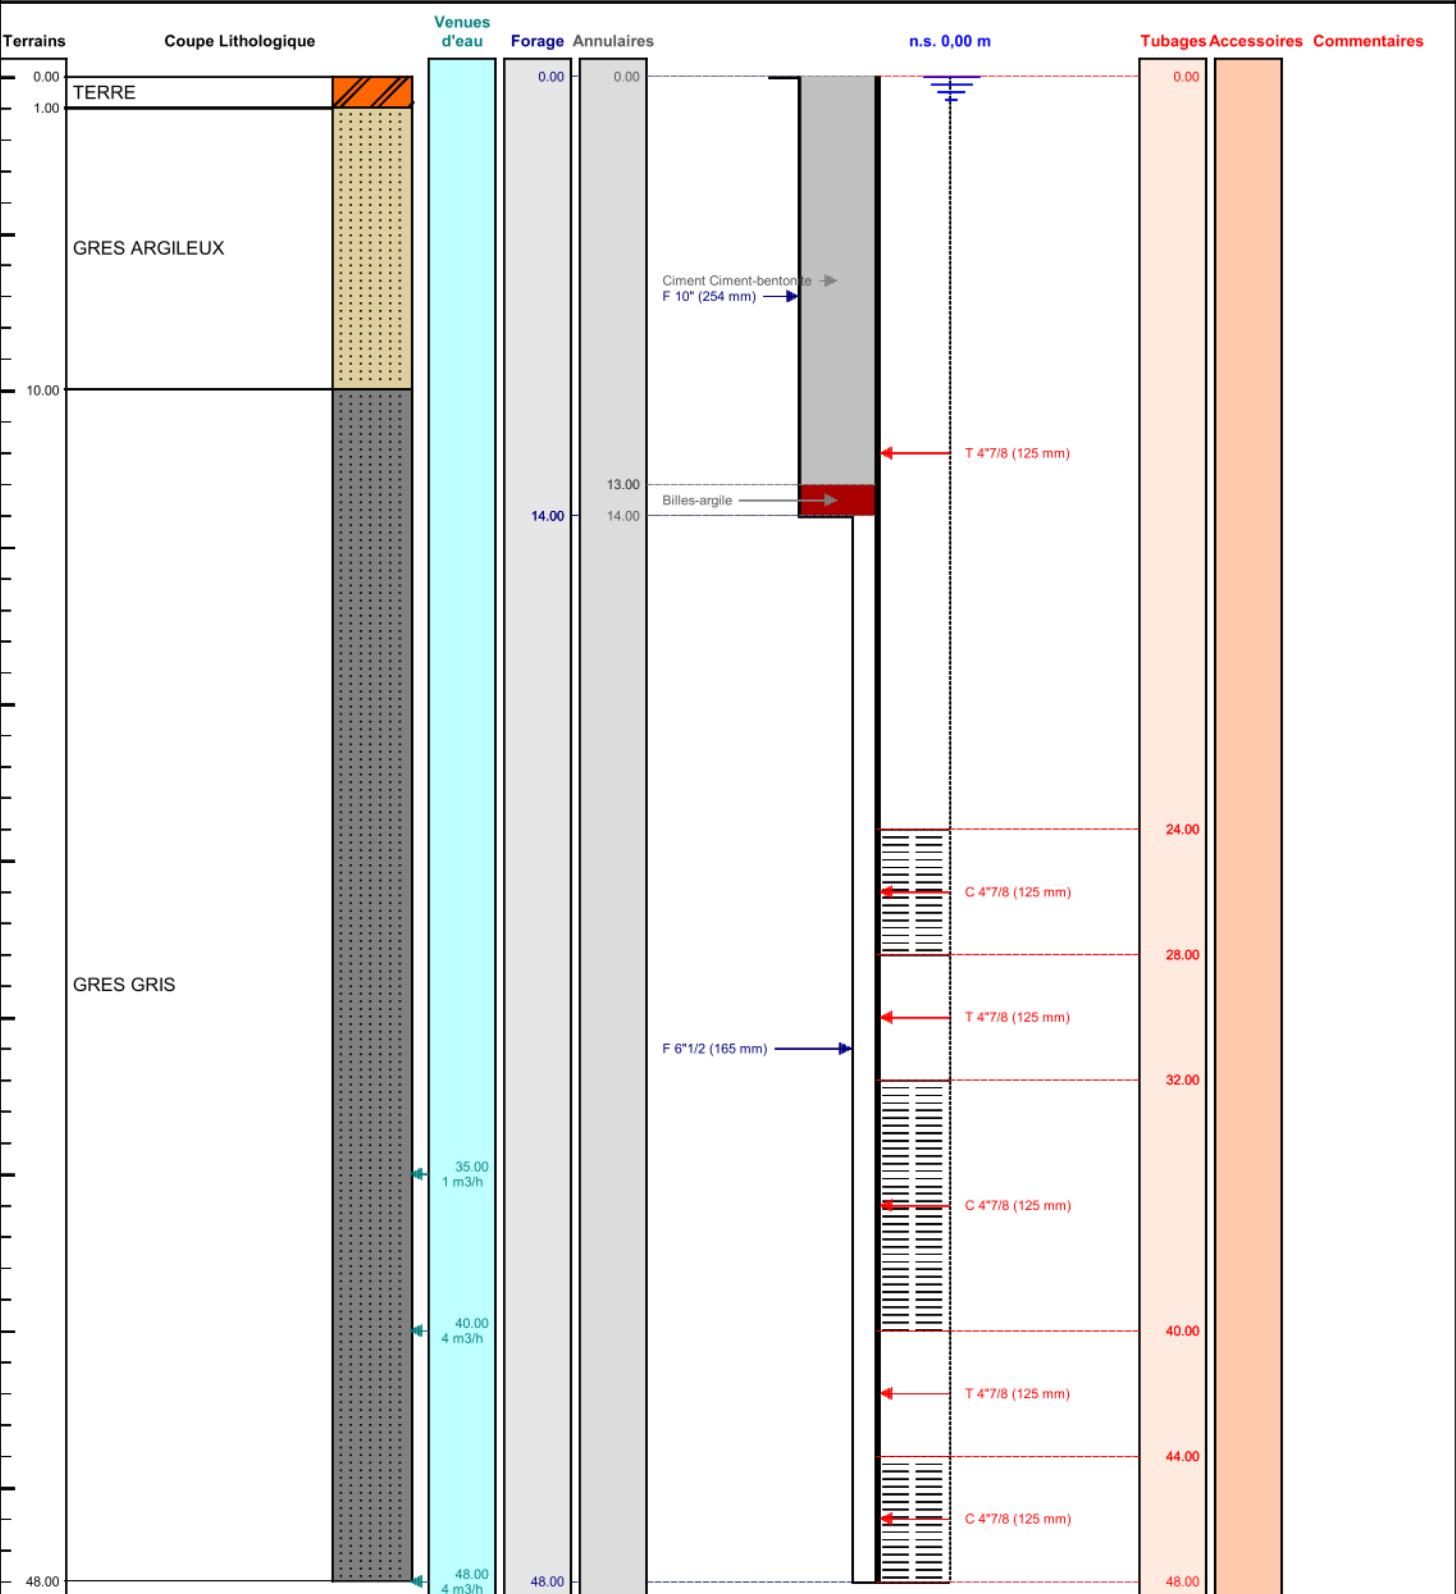

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
