




S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'ARROSAGE à Warmeriville (51)

**TRAVAUX REALISES
LES
12 et 13 Juillet 2023**

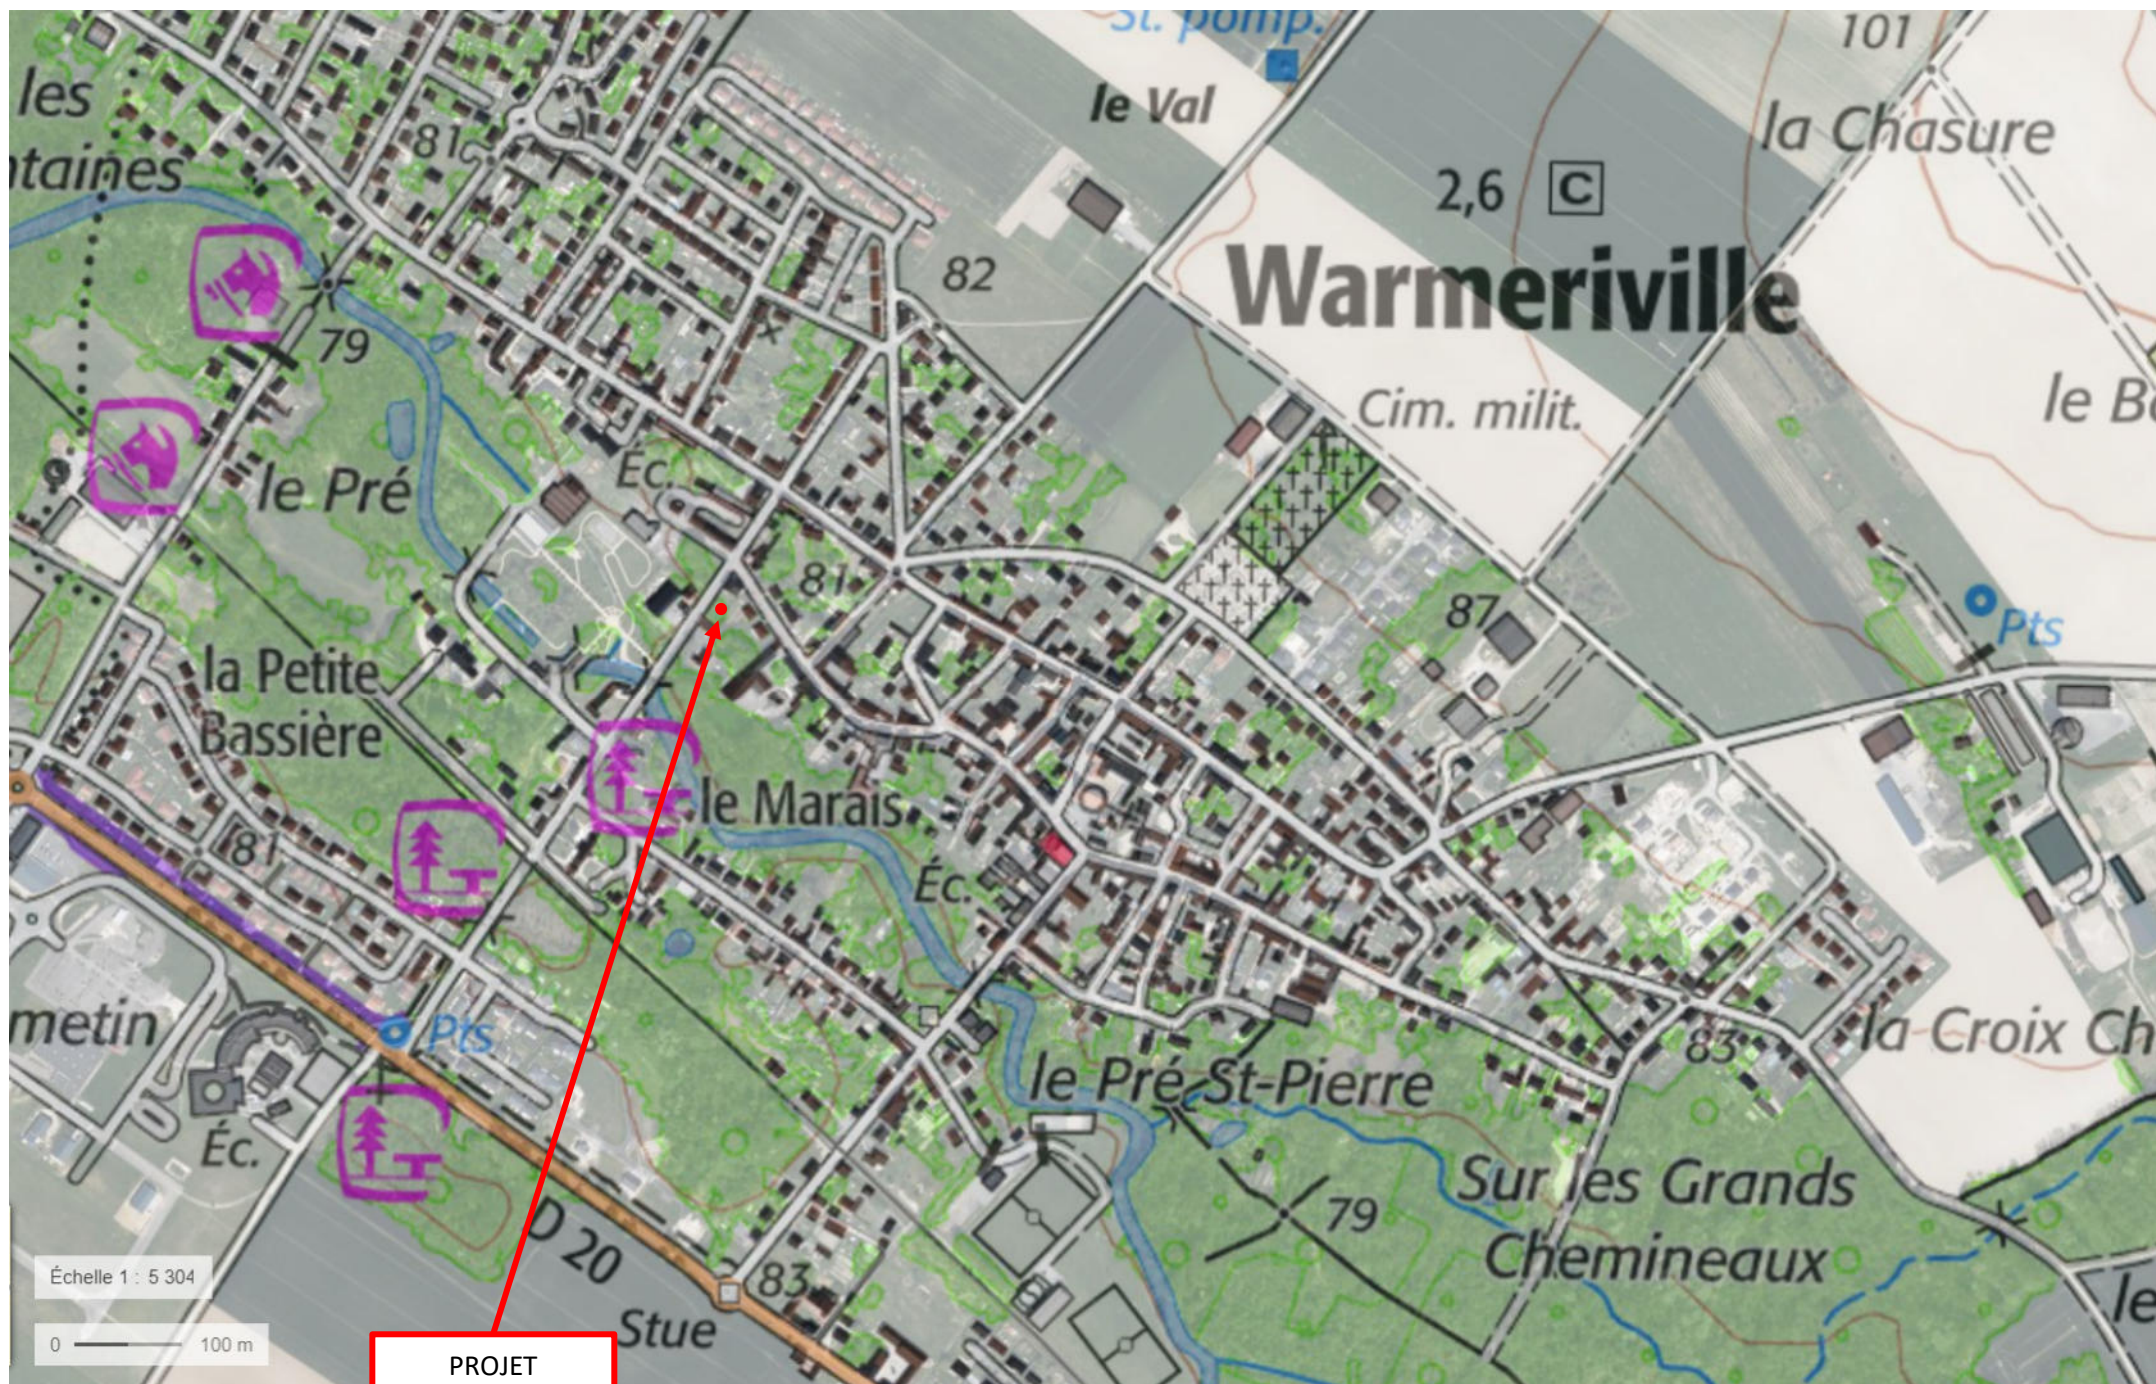

PROJET
Alt : 80 m

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :			
Date :	12/07/2023	n° DREAL :	533803
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage		
Lieu du chantier :	Warmeriville		

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	18,60
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	18,60	220	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,50	6,80	140	140/126	PVC		x
6,80	18,60	140	140/126	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :			
Date :	12/07/2023	n° DREAL :	533803
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage		
Lieu du chantier :	Warmeriville		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	6,00	CPJ45	x		220	140
6,00	6,50	Jupe			220	140

POMPAGE	NS (m) :	2,9	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe :	SPV 10
----------------	----------	-----	-----------------	------	---------	--------

ND (m)	Q (m3)	Temps
3,10	10,00	1h
3,10	10,00	2h
3,08	10,00	2h30
3,06	10,00	3h30
Acidification :	tonne(s)	
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
3,06	10,00	3h30
Débit spécifiques		
Q' =	62,50	m ³ / h / m
Coordonnées : - X : 4,21701 - Y : 49,35171 - Z : 80 m		
Observations : N° BSS : BSS004JBTK		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	12/07/2023	n° DREAL : 533803
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Warmeriville	

