

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	NORMANDIE FORAGE .
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 13538

Police de l'eau \* :

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

Lieu de l'ouvrage : 26 RUE DU PIROUET  
61210 HABLOVILLE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 2

Date début de l'ouvrage : 18/04/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 19/04/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 6.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m<sup>3</sup>/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 26 RUE DU PIROUET  
61210 HABLOVILLE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	REMBLAI SCHISTE GRIS
1.00	6.00	SCHISTE DEGRADE GRIS VERT
6.00	15.00	SCHISTE GRIS TENDRE
15.00	45.00	SCHISTE BLEU DUR

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	45.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
35.00	3.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	29.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
29.00	41.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
41.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cik	Gravitaire			

# FORAGE D'EAU


Client : \_\_\_\_\_  
 Maître d'oeuvre : \_\_\_\_\_  
 Localisation de l'ouvrage : **26 RUE DU PIROUET**  
**61210 HABLOVILLE**

Travaux réalisés : 1)  
 du : 18/04/2023 au : 19/04/2023 1  
 Coordonnées de l'ouvrage :  
 Lambert 1 carto métrique  
 Longitude (X): 0  
 Latitude (Y): 0  
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/226

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages :  
2

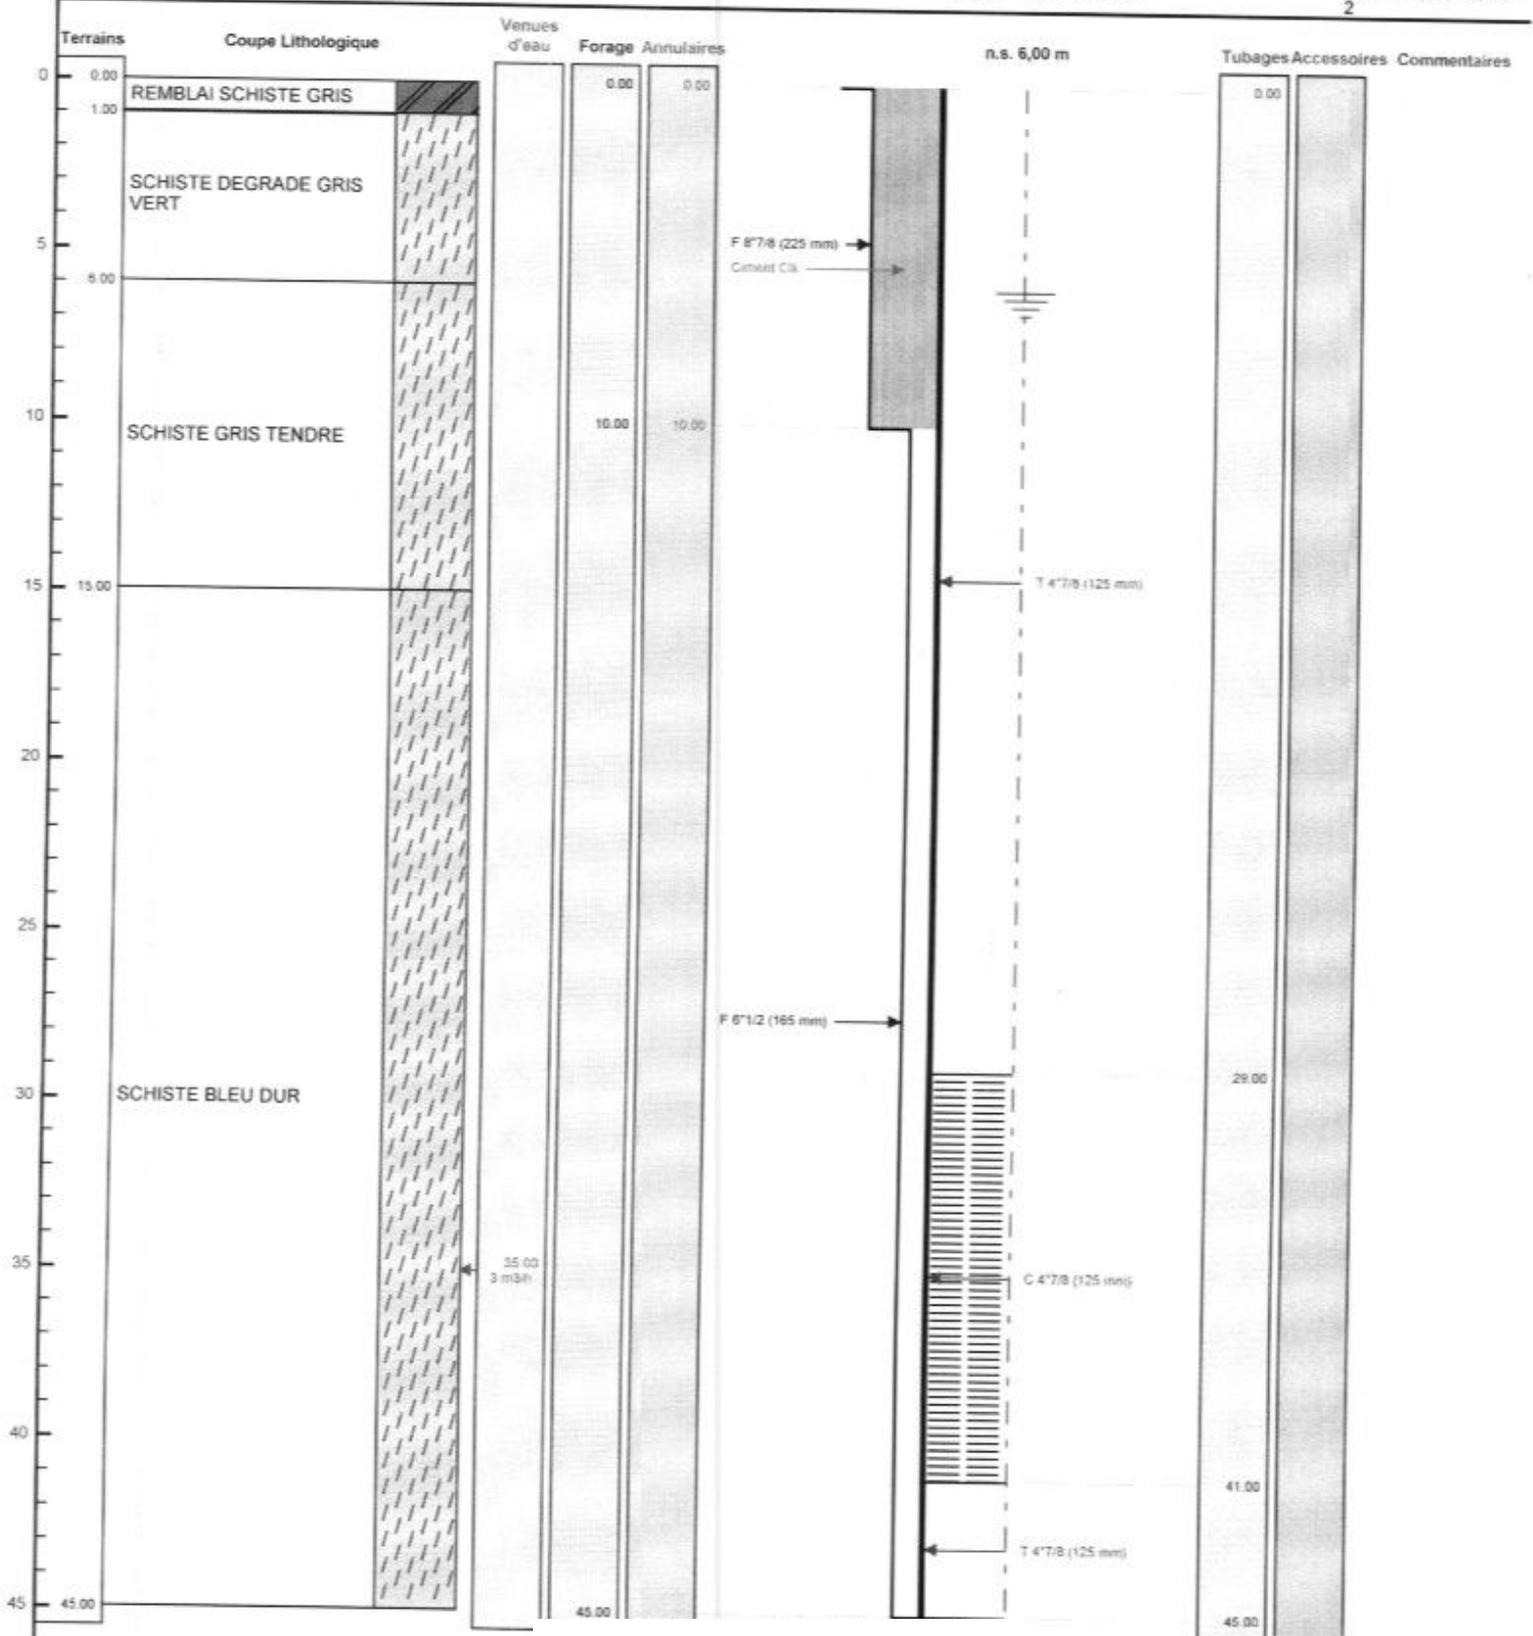

Le 16/06/2023 à  
 CERTIFIE CONFORME A  
 Tampon et signature du cl

Lambert 1 carto mé

00 m
