

## FORAGE D'EAU NEGATIF

<b>Entreprise:</b>	<b>PROSPER FORAGES</b>
<b>Client:</b>	
<b>Maître d'oeuvre:</b>	
<b>Exploitant:</b>	

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :**

64270 SALIES DE BEARN

**Coordonnées :**    **Longitude**    381 754    **Latitude**    6 272 250    **Altitude :**    57.74 m  
**Zone**    Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :**    11/07/2022    **Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :**    11/07/2022    **Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**    MORI P130    **Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**    **Niveau statique non perturbé :**    0.00 m

**Date fin de pompage :**    **Débit Maxi. d'essai :**    0.00 m<sup>3</sup>/h

**Nombre de nappes identifiées :**    **Rabattement correspondant :**    0.00 m

**Notes :**    11/04/2022:  
10h: Arrivée sur chantier

Notes (suite) :

10h - 11h: Mise en place du matériel de forage

11h -12h: Foration de 0 à 9m en 219mm au Marteau Fond de Trou

13h - 14h: Foration, de 9 à15m au Trilame

14h - 15h: Rebouchage et cimentation



## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU NEGATIF



Charte qualité

**Client:****Maître d'oeuvre:****Lieu de l'ouvrage :**

64270 SALIES DE BEARN

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.50	Terre, graviers secs
1.50	5.00	Argile gris foncé molle
5.00	7.00	Argile marron, graviers, sable, humidité
7.00	13.00	Argile dure gris bleu, passage rouge
13.00	15.00	Marne blanche poussière

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.00	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.50	Rebouc	0.00	Remblai					
0.50	5.50	Rebouc	0.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
5.50	15.00	Rebouc	0.00	Gravier	Gravier, sable et	Gravitaire	Autre		

# FORAGE D'EAU NEGATIF

Travaux réalisés : du : 11/07/2022 au : 11/07/2022

111

Client :  
Maitre d'oeuvre :  
Localisation de l'ouvrage :


**64270 SALIES DE BEARN**

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert-93 métrique  
Longitude (X): 381 754  
Latitude (Y): 6 272 250  
Altitude sol (Z): +57,740 m

Echelle : 1/75

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

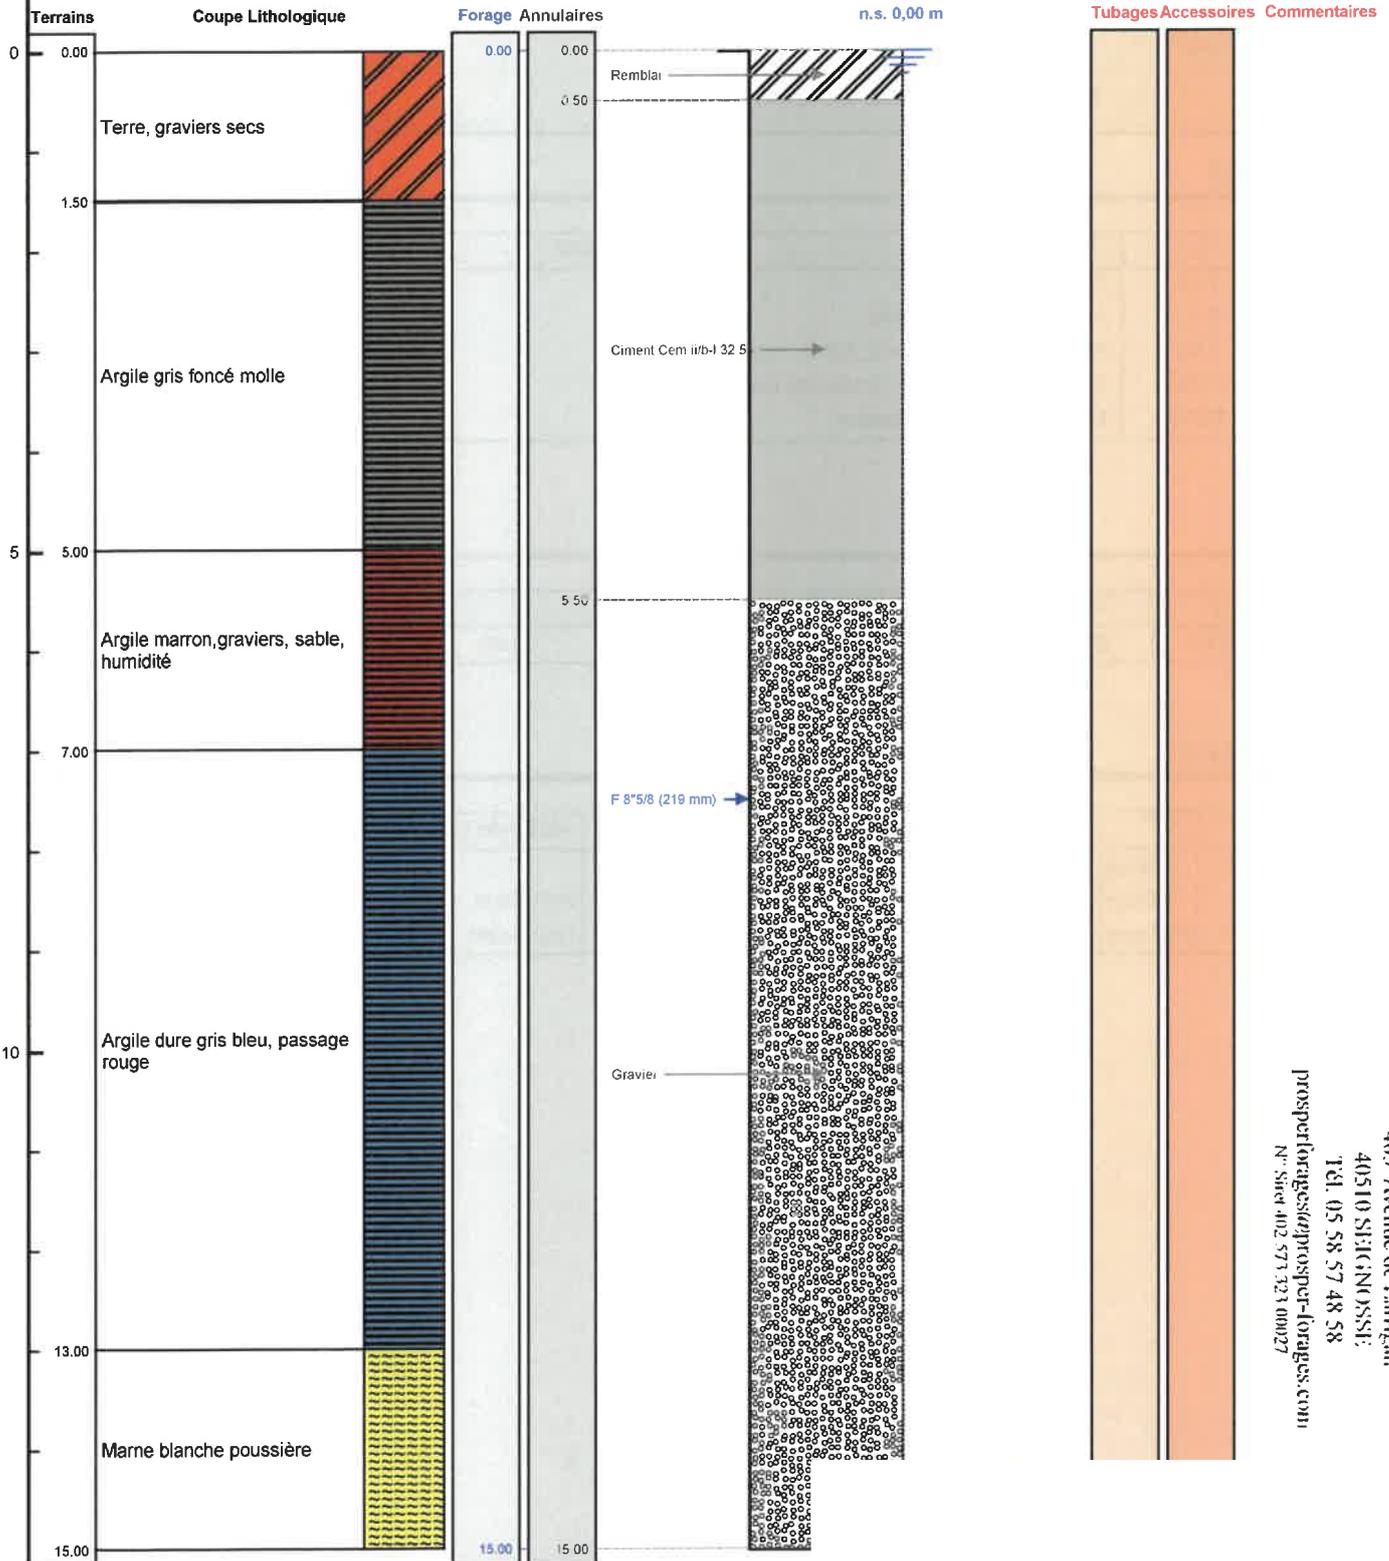

**PROSPER FORAGES S.A.R.L.**  
465 Avenue de Larrigan  
40510 SEIGNOSSÉ  
Tél. 05 58 57 48 58  
prospforages@prospert-forages.com  
N° Siret 402 573 323 00027



Le 5/6/2023 à SEIGNOSSÉ  
CERTIFIÉ CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise
