

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU NEGATIF

<b>Entreprise:</b>	<b>SARL PROSPER FORAGES</b>
<b>Client:</b>	
<b>Maître d'oeuvre:</b>	
<b>Exploitant:</b>	

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 61 route du Marensin  
40380 GAMARDE LES BAINS

**Coordonnées :** **Longitude** 387 863 **Latitude** 6 300 347 **Altitude :** 79.51 m  
**Zone** Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 20/04/2023

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 21/04/2023

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** MORI P30

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :** **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m<sup>3</sup>/h

**Nombre de nappes identifiées :** **Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

DENSITE LAITANCE: 1.82kg/L

Notes (suite) :

20/04/2023:

10h30 à 12h00:

Arrivée sur chantier  
Déchargement de la machine  
Mise en place de la machine

13h00 à 16h30:

Foration de 0 à 21m  
Sortie des tiges  
Sortie du tubage de 21m à 3m  
Rangement du matériel

21 AVRIL 2023:

9h00 à 10H30:

Comblement du forage  
Pose de la Sobranite et Cimentation  
Rangement du matériel  
Chargement de la machine  
Départ du chantier



## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU NEGATIF



Charte qualité

<b>Client:</b>	
<b>Maître d'oeuvre:</b>	
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>61 route du Marensin</b>
	<b>40380 GAMARDE LES BAINS</b>

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Terre végétale argileuse
2.00	3.50	Argile marron molle
3.50	4.50	Argile molle rouge
4.50	6.50	Argile rouge sableuse
6.50	8.50	Argile marron sableuse
8.50	12.00	Argile marron molle
12.00	21.00	Argile marron molle humide

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	21.00	8"5/8	219.00	Autre	Air

\* Reconnaissance

### REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.50	Rebouc	0.00	Remblai					
0.50	2.50	Rebouc	0.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
2.50	3.50	Rebouc	0.00	Billes-argile	Sopranite				
3.70	9.00	Rebouc	0.00	Gravier	Graviers "big bag"	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	
9.00	21.00	Rebouc	0.00	Remblai					

# FORAGE D'EAU NEGATIF

Travaux réalisés : 111  
du : 20/04/2023 au : 21/04/2023

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 61 route du Marensin

40380 GAMARDE LES BAINS

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 387 863


Latitude (Y): 6 300 347

Altitude sol (Z): +79,510 m

Echelle : 1/106

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

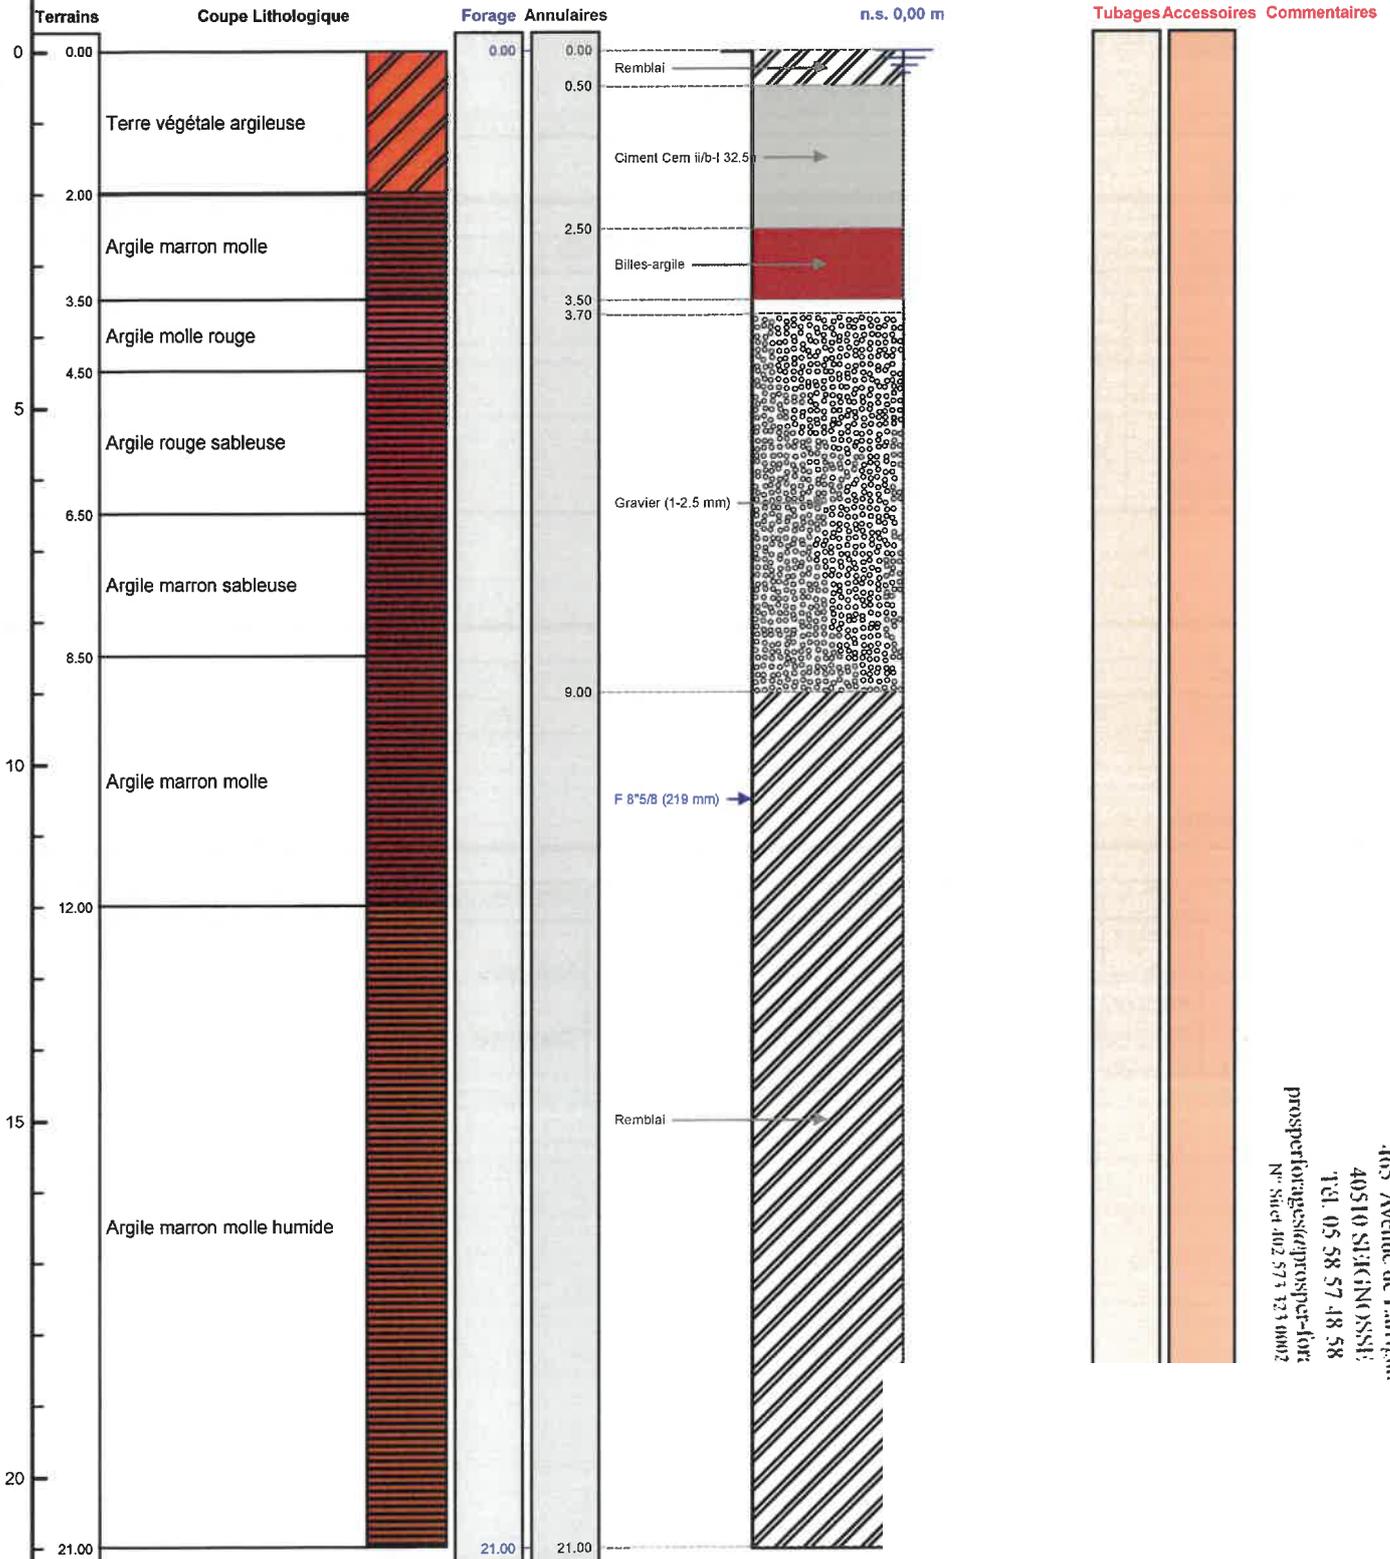

**PROSPER FORAGES SARL**  
465 Avenue de Lartigue  
40510 SAINCINOISSE  
TEL: 05 58 57 48 58  
prospertforages@prospert-for  
N° Siret: 402 573 123 0002



Le 12/05/2023 à 08:15:00  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise

Chercher un lieu, une adresse, une adresse

AFFICHER DES COORDONNÉES

X : 387862.76 m  
Y : 6300346.82 m  
Altitude : 79.51 m

SYSTEME DE REFERENCE

Lambert 93  
mètre

QUADRILLAGE  
Atchier

4372225 - 4371113  
23 Route du Maréchal  
45040 Gantoussiers-Dains  
Parcelle : 000 / OC / 0431  
Altitude : 79.51 m  
Voir : base données dérogées



Données cartographiques © IGN, D.G.F.P.

43 23200 - 0473115  
23 Rue du Maréchal  
40080 Camille-vestides  
Parcelle - 000 / DC / 0401  
Altitude : 79,51 m  
Wkt : [visualiseur/déposez](#)



AFFICHER DES COORDONNÉES

Latitude : 43 ° 43 ' 59,53 " N  
Longitude : 0 ° 52 ' 30,39 " O  
Altitude : 79,51 m

SYSTEME DE RÉFÉRENCE

Géographique  
degré sexagesimal

QUADRILLAGE

Archer
