

Date d'édition : 25/07/2019

N° d'Affaire : A36427

N° de Contrat :

Nom du site :

DIEUZE

Nom de l'ouvrage :

Pz-AX08 (PZ6)


Coordonnées

Système : Lambert cc49
Z repère (m NGF) : 209.18 THS

X (m) : 1 972 365.86

Y (m) : 8 186 660.17

Localisation

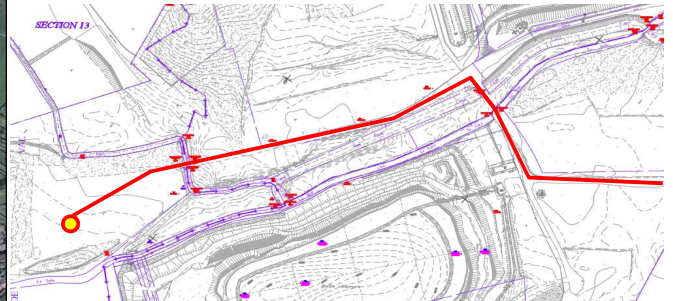

Caractéristiques

Tête verouillée : ☒
 Identification sur l'ouvrage: ☒
 Bouchon de tête: ☐
 Profondeur de l'ouvrage (m) : 9.8
 Diamètre int. de l'ouvrage (mm) : 64/75
 Date de réalisation de l'ouvrage : inconnue
 Equipement (PVC/PEHD/...) : PVC
 Hauteur capot (m): 0.57
 Par rapport à ☐ rehausse
 ou ☒ sol
 Z Capot (m NGF): 209.18
 Z Rehausse (m NGF): 208.73
 Z Sol (m NGF): 208.61

Vue de l'ouvrage ↓



Commentaire

| | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------|---------------------|
|  | DIEUZE Pose de piézomètre | | | n° affaire M.12.282 |
| | Date : 11/09/2012 | Cote NGF : | Profondeur : 0.00 - 10.00 m | |

1/50

Sondage : PZ6

EXGTE 2.30/GTE

| Cote NGF (m) | Lithologie | Niveau d'eau (m) | Outil | Tubage | Equipement forage | Profondeur (m) | Observations |
|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------|-------------------|----------------|--------------|
| | Remblais (blocs et pierres) | | | | | 0 | |
| -2.00 m | 2.00 m | | | | | 1 | |
| | | | | | | 2 | |
| | | | | | | 3 | |
| | | | | | | 4 | |
| | | | | | | 5 | |
| | Argile rouge-gris marneuse | Non rencontrée | TARIERE CONTINUE Ø 150 mm | | PVC Ø 64/75 mm | 6 | |
| | | | | | | 7 | |
| | | | | | | 8 | |
| | | | | | | 9 | |
| -10.00 m | 10.00 m | | 10.00 m | | 10.00 m | 10 | |

Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr
