

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise: SARL PROSPER FORAGES

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

40140 SOUSTONS

Coordonnées : **Longitude** 352 888 **Latitude** 6 302 322 **Altitude :** 34.47 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 28/02/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 02/03/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MORI P30

Resp. Chantier :

Date début pompage : 01/03/2023

Niveau statique non perturbé : 1.30 m

Date fin de pompage : 01/03/2023

Débit Maxi. d'essai : 10.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 3.50 m

Notes :

NS : 1,30 m
ND: 3,51 m 5 m³/h - 4,80 m 10 m³/h

DENSITE LAITANCE: 1.81kg/L

Notes (suite) :

28 FEVRIER 2023

10H00: Arrivée sur chantier. Mise en place du matériel.
11h00 à 12h00- Foration 0 à 9m

13h00 à 16h30:
Fin de la descente du tubage
Foration de 9m à 12m à la sonde
Equipement du forage en PVC 125mm
Repli du matériel et départ du chantier

1er MARS 2023:

10H30 à 12h00:
Réaliser un trou dans le mur à la trancheuse

13h00 à 16h30:
Installation de la pompe, du ballon et des deux robinets
Passage cable 4G 1,5
Rebouchage de la tranchée

2MARS 2023:

9h00 à 11H00:
Fixer robinet plus réglage
Tests de pompage
Finir de reboucher la tranchée
Retour au dépôt



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

**Client:****Maître d'oeuvre:****Lieu de l'ouvrage :****40140 SOUSTONS**

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Sable noir
1.00	4.00	Sable brun humide
4.00	6.00	Sable gris humide
6.00	12.00	Sable gris + eau

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	8"5/8	219.00	Autre	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	8.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
8.00	12.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	5
12.00	12.20	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.20	2.20	4"7/8	125.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
2.20	3.20	4"7/8	125.00	Billes-argile	Sopranite				
3.20	12.00	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Socket beton 0.40m x 0.40m + regard fonte

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Travaux réalisés : 111
du : 28/02/2023 au : 02/03/2023


Client :
Maitre d'oeuvre :
Localisation de l'ouvrage :
40140 SOUSTONS

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert-93 métrique
Longitude (X): 352 888
Latitude (Y): 6 302 322
Altitude sol (Z): +34,470 m

Echelle : 1/61

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

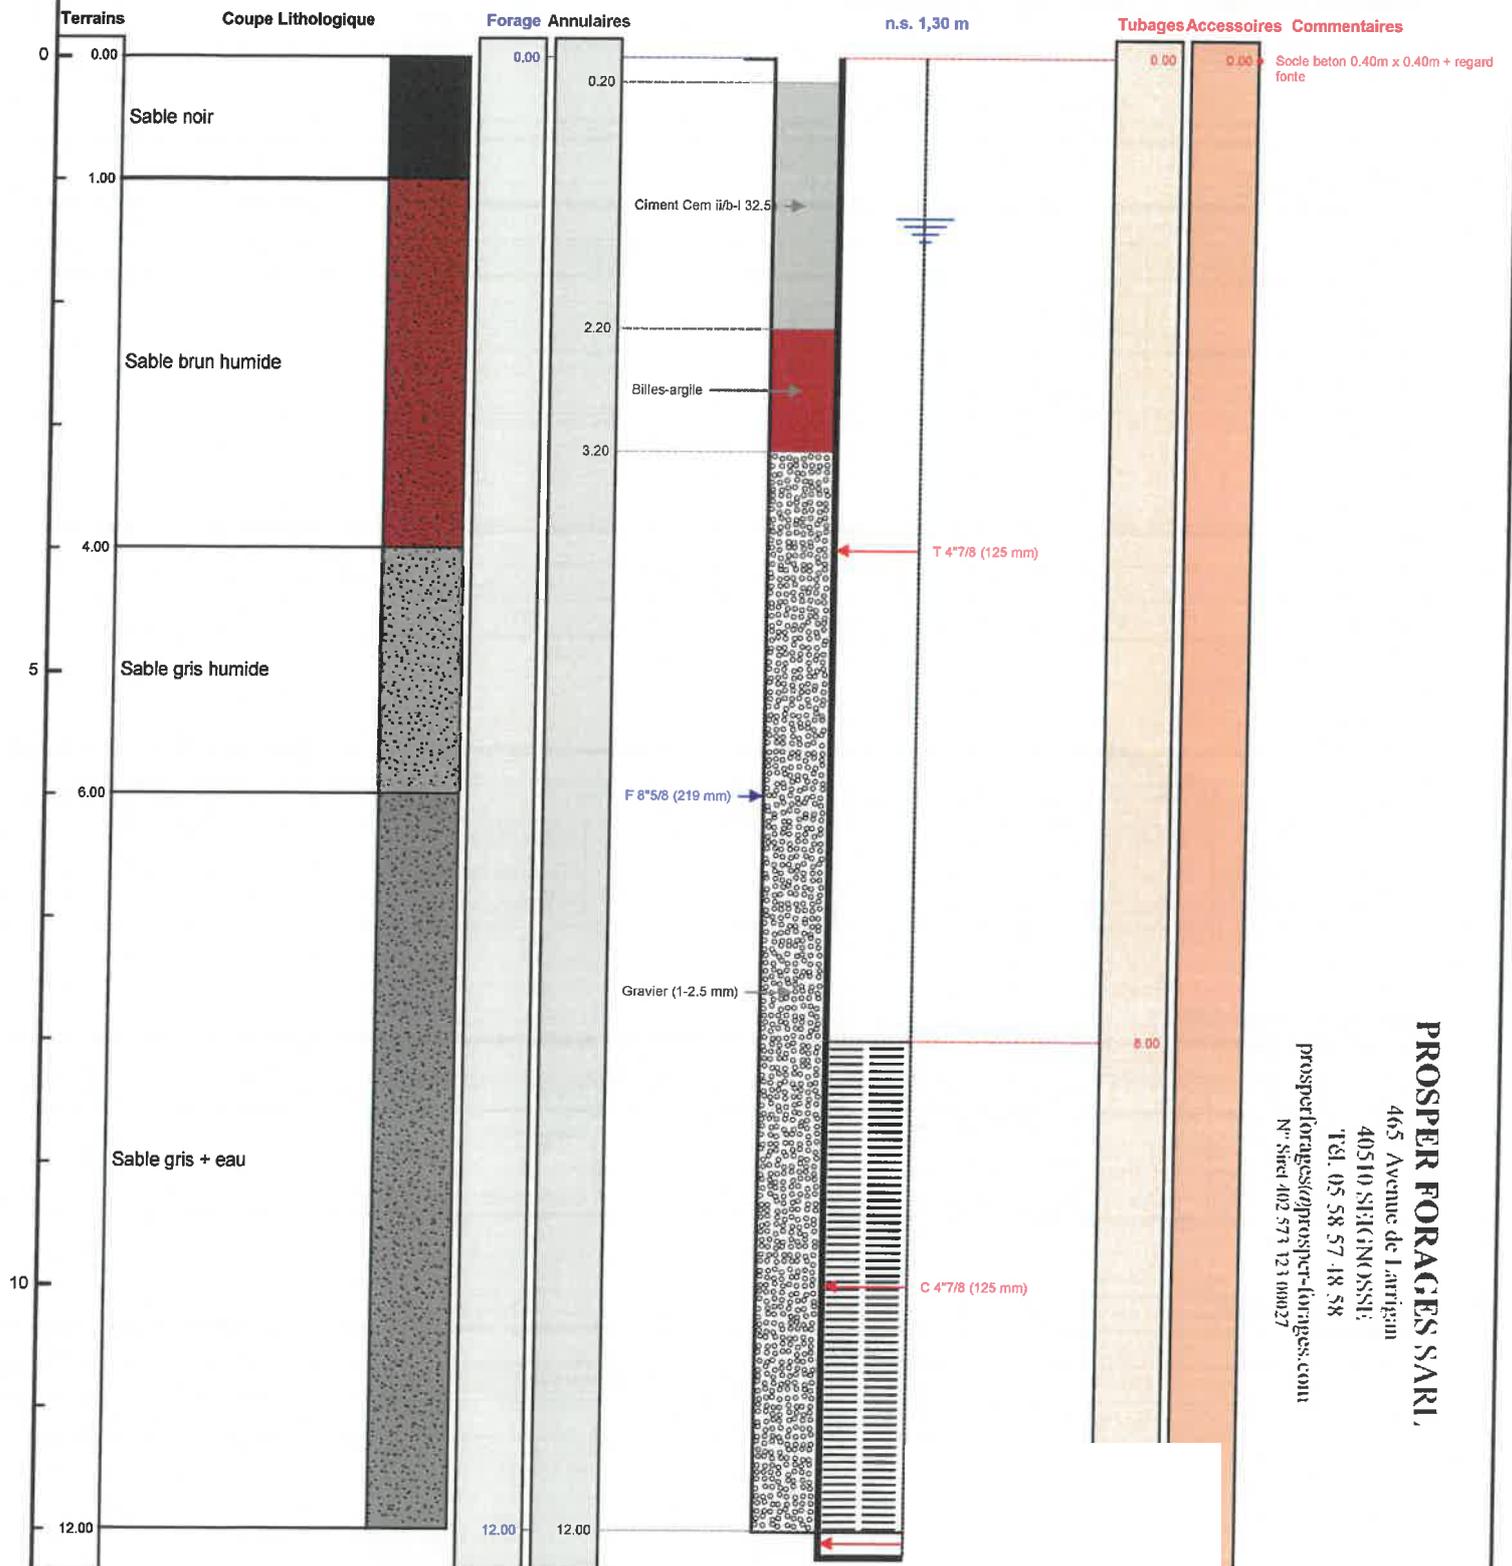

PROSPER FORAGES SARI
465 Avenue de Larrigan
40510 SEIGNOSSE
Tél: 05 58 57 48 58
prospertforages@prospert-forages.com
N° Siret 402 573 12 1 00027



Le 7.3.2023 à SEIGNOSSE
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 géoportail

CARTES 

Q sources, 40140 

?   

AFICHER DES COORDONNÉES
 Latitude : 43° 44' 4,79" N
 Longitude : 1° 18' 35,4" O
 Altitude : 34,47 m

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE
 Géographique
 depuis escarpéismaur

QUADRILLAGE
 Afficher

0127
 0178
 0301
 0116
 0114
 0179
 0248
 0246
 0161
 0163
 FORAGE
 BM 0178

1979 Marchand
 40140 Soustons
 Parcelle : 000 / BM / 0178
 Adresse : 14,7 m
 VCL - Adresse premier gendre

Echelle : 1:500
 0 10 m

Données cartographiques © IGN DGFIP

