

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise: **SARL PROSPER FORAGES**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 619 avenue de Pascouaou
40150 SOORTS HOSSEGOR

Coordonnées : Longitude 346 747 Latitude 6 295 456 **Altitude :** 14.39 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 08/03/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 10/03/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE P30

Resp. Chantier :

Date début pompage : 10/03/2022

Niveau statique non perturbé : 2.62 m

Date fin de pompage : 10/03/2022

Débit Maxi. d'essai : 11.20 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabatement correspondant : 1.13 m

Notes :

NS: 2.62m
ND: 4.6m3/h - 3.20m 6.4m3/h - 3.35m 8.6m3/h - 3.45m 11.2m3/h - 3.75m
Densité Laitance: 1.806kg/l



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

**Client:****Maître d'oeuvre:**

Lieu de l'ouvrage : 619 avenue de Pascouaou
40150 SOORTS HOSSEGOR

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.90	Terre marron sableuse
0.90	1.50	Sable jaune
1.50	2.00	Sable marron + tourbe
2.00	2.50	Sable jaune
2.50	3.50	Sable jaune + boulettes de Tourbe
3.50	6.00	Sable tourbeux
6.00	11.00	Sable jaune mouillé
11.00	11.25	Argile grise

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	11.25	8"5/8	219.00	Autre	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	7.25	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
7.25	11.25	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	5
11.25	11.45	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.30	2.30	4"7/8	125.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
2.30	3.20	4"7/8	125.00	Billes-argile	Sopranite				
3.20	11.25	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Travaux réalisés : 1/2
du : 08/03/2022 au : 10/03/2022

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 619 avenue de Pascouaou
40150 SOORTS HOSSEGOR

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 346 747


Latitude (Y): 6 295 456

Altitude sol (Z): +14,390 m

Echelle : 1/58

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

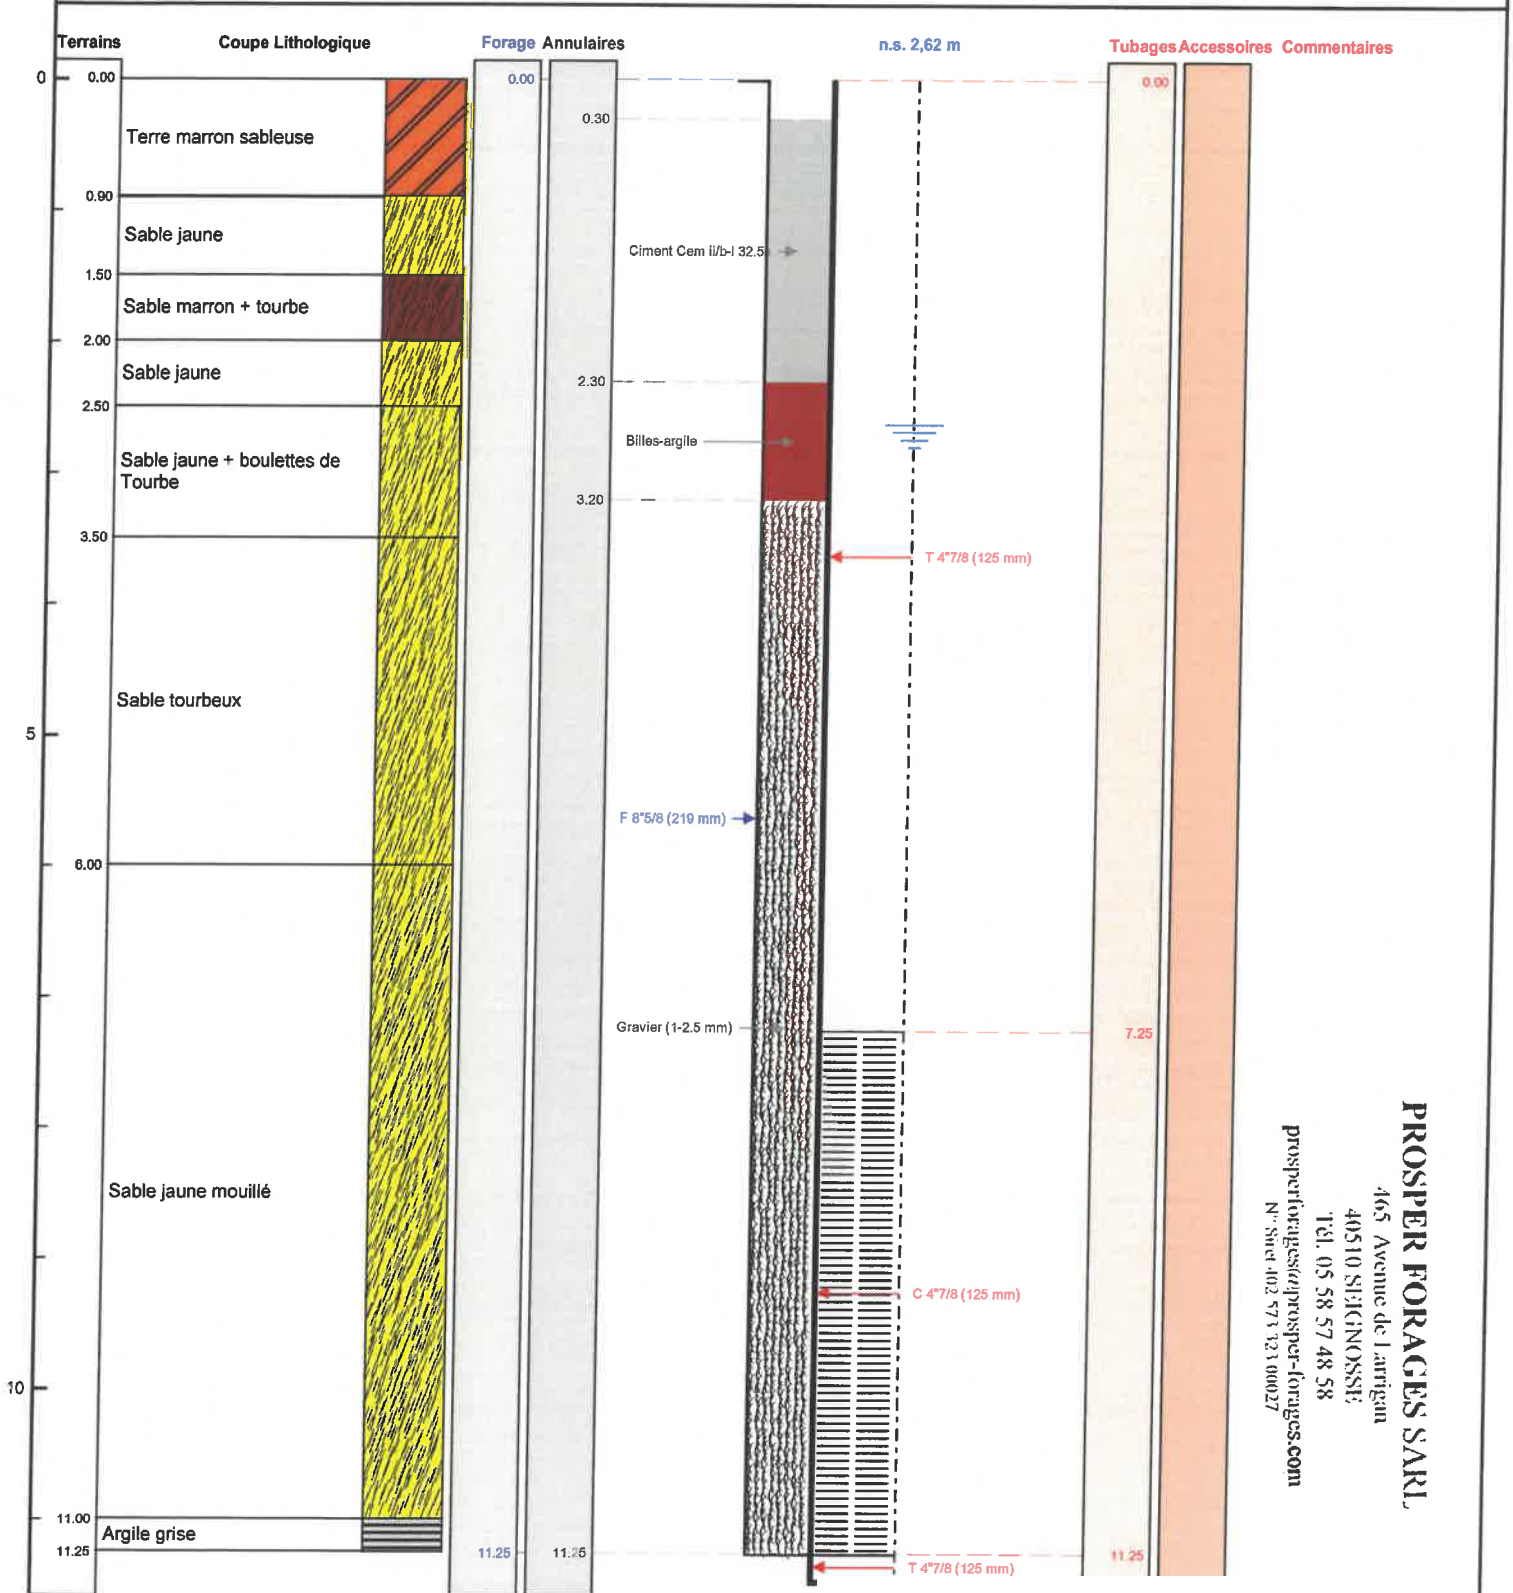

PROSPER FORAGES SARL

465 Avenue de l'artigau
40510 SIEGINOSSIE
Tél. 05 58 57 48 58
prosperforages@prosper-forages.com
N° Siret 402 573 521 00027



Le 10/03/2022 à 08h05
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert-93 métrique Long.: 346 747 Lat.: 6 295 456 Alt.: +14,390 m

PAGE: 3
