

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU



Charte qualité

| | |
|------------------|---|
| Entreprise: | AQUAFORAGE |
| Client: | CEST MED 1641 avenue du Golf 34280 LA GRANDE MOTTE |
| Maître d'oeuvre: | CEST MED 1641 avenue du Golf 34280 LA GRANDE MOTTE |
| Exploitant: | CEST MED 1641 avenue du Golf 34280 LA GRANDE MOTTE |

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 703254

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 1641 avenue du Golf
34280 LA GRANDE MOTTE

Coordonnées : Longitude 004°06'3,82"E Latitude 043°34'13,99"N **Altitude :** 150.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 21/11/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 23/11/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MASSENZA MI-4

Resp. Chantier : GAT

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 2.20 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 40.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

Température : 17°C

Salinité mesurée par le client : 4 gr de plus que l'eau de mer

Client: CEST MED
Maître d'oeuvre: CEST MED
Lieu de l'ouvrage : 1641 avenue du Golf
 34280 LA GRANDE MOTTE

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|--------------------|
| 0.00 | 1.00 | Limon |
| 1.00 | 9.00 | Sable fin gris |
| 9.00 | 14.00 | Sable marron clair |
| 14.00 | 25.00 | Marne marron beige |
| 25.00 | 29.00 | Galets |
| 29.00 | 31.00 | Sable fin |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|-------|--------|-----------------|------------------|
| 0.00 | 31.00 | 8"5/8 | 219.10 | Roto-percussion | Air |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| -0.50 | 20.00 | 4"7/8 | 125.00 | 6.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 20.00 | 31.00 | 4"7/8 | 125.00 | 6.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | 1.00 | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|-------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 15.50 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Cpa 45 | Sous pression | | | 0.80 |
| 15.50 | 16.00 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Compactonite | | | | |
| 16.00 | 31.00 | 4"7/8 | 125.00 | Gravier | Gravier de silice | Gravitaire | Roule | 2.00-4.00 | 0.60 |

ACCESSOIRE

| De | à | Type d'accessoire |
|-------|-------|-------------------|
| -0.50 | -0.50 | Tête de forage |
| 31.00 | 31.00 | Bouchon |

FORAGE D'EAU

Client : CEST MED
 Maître d'oeuvre : CEST MED
 Localisation de l'ouvrage : 1641 avenue du Golf
 34280 LA GRANDE MOTTE


Travaux réalisés : 1\1
 du : 21/11/2023 au : 23/11/2023

Coordonnées de l'ouvrage :
 Géographique
 Longitude (X): 004°06'3,82"E
 Latitude (Y): 043°34'13,99"N
 Altitude sol (Z): +150,000 m

Echelle : 1/158

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

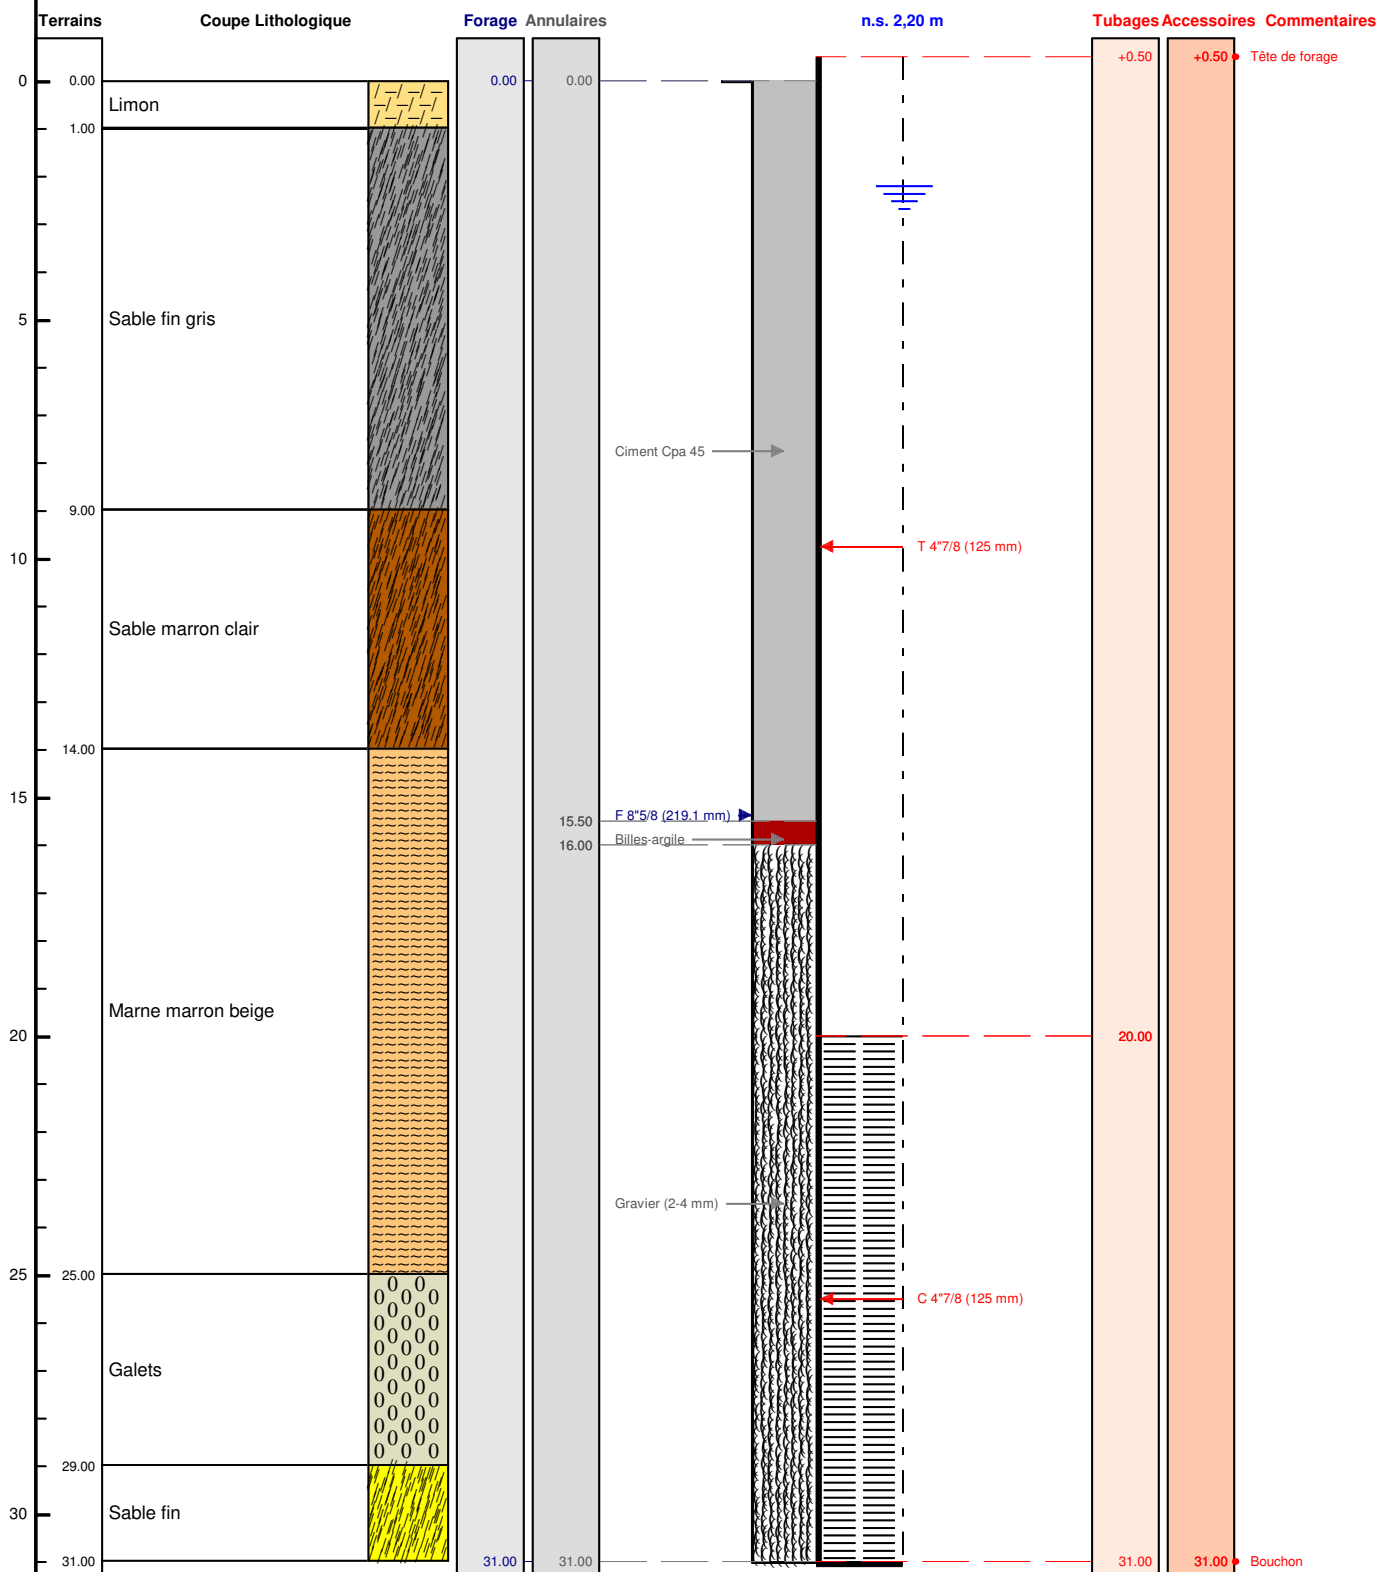

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
