


# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

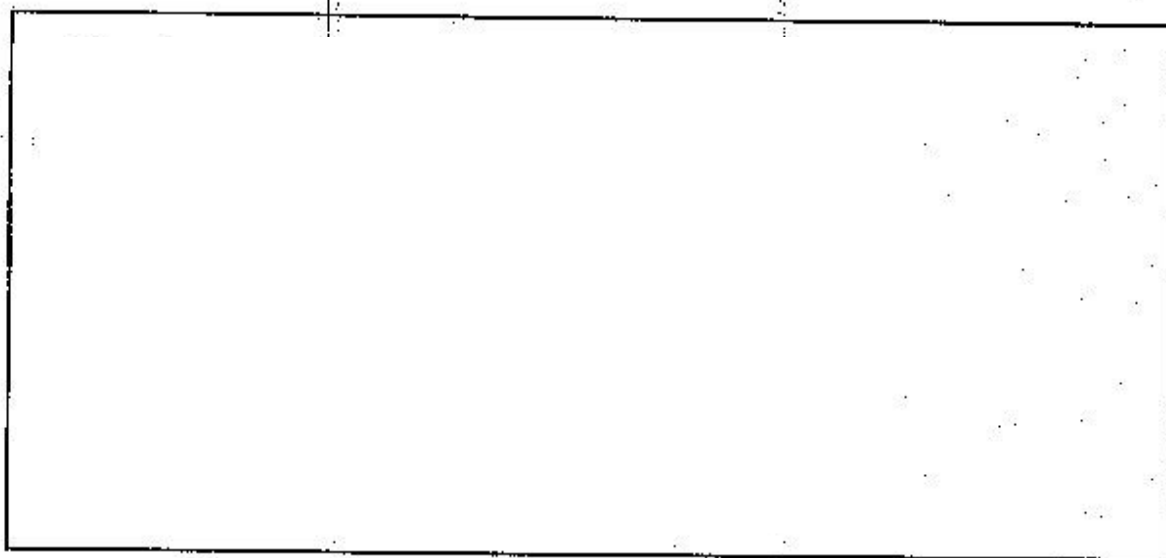

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 426043

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LES MERS DE SAY

61310 SILLY EN GOUFFERN

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 174.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 24/04/2023

Resp. M. Ouvrage : PERIGAULT

Date fin de l'ouvrage : 24/04/2023

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 18.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 6.00 m<sup>3</sup>/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	12.00	ARGILE SABLÉ VERT
12.00	42.00	ARGILE GRIS ALTERNANCE LEGER CALCAIRE GRIS
42.00	49.00	CALCAIRE GRIS BLANC + LEGER SABLE GLAUCONIE

## FORAGE

De	a	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
43.00	4.00

## TUBAGE

De	a	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide. %
0.00	33.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube plein		
33.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube plein		

## REMPLISSAGE

De	a	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
10.00	49.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

# FORAGE D'EAU

Travaux réalisés du 24/04/2023 au 24/04/2023  
 Coordonnées de l'ouvrage  
 UTM (carte métrique)  
 Longitude (X) : 0  
 Latitude (Y) : 0  
 Altitude sol (Z) : 174,000 m

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

