

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU NEGATIF

Entreprise: **SARL PROSPER FORAGES**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 164 ROUTE DU PONT DU LOUTS
40380 LOUER

Coordonnées : Longitude 386 441 Latitude 6 302 818 **Altitude :** 33.35 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/01/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 23/01/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine : FRASTE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

DENSITE LAITANCE: 1.82kg/L

Notes (suite) :

22/01/2023:

14h30 à 16h30:

Arrivée sur chantier

Déchargement de la machine

Mise en place du matériel et de la machine

Foration tubes 1 et 2

23/01/2024:

09h30 à 12h45:

Foration de 0 à 21m

Pas d'eau

Retrait de tubes

14h30 à 16h00:

Rangement du matériel

Comblement du forage

Chargement du matériel et de la machine

Retour au dépôt



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU NEGATIF

**Client:****Maître d'oeuvre:**

Lieu de l'ouvrage : 164 ROUTE DU PONT DU LOUTS
40380 LOUER

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.50	Sable jaune
2.50	3.00	Sable orange + alios
3.00	7.50	Agile jaune, orange et grise molle
7.50	9.00	Argile bleue compacte
9.00	15.00	Argile grise sableuse
15.00	18.00	Argile grise compacte
18.00	21.00	Argiel grise + galets

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	21.00	11"	279.00	Autre	Air

* Reconnaissance

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.00	Rebouc	0.00	Gravier	Graviers "big bag"	Gravitaire	Roule		
3.00	8.00	Rebouc	0.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
8.00	9.50	Rebouc	0.00	Billes-argile	Sopranite				
9.50	21.00	Rebouc	0.00	Remblai					

FORAGE D'EAU NEGATIF

Travaux réalisés : 1/1
du : 22/01/2024 au : 23/01/2024

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 164 ROUTE DU PONT DU LOUTS

40380 LOUER

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 386 441


Latitude (Y): 6 302 818

Altitude sol (Z): +3 535,000 m

Echelle : 1/106

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

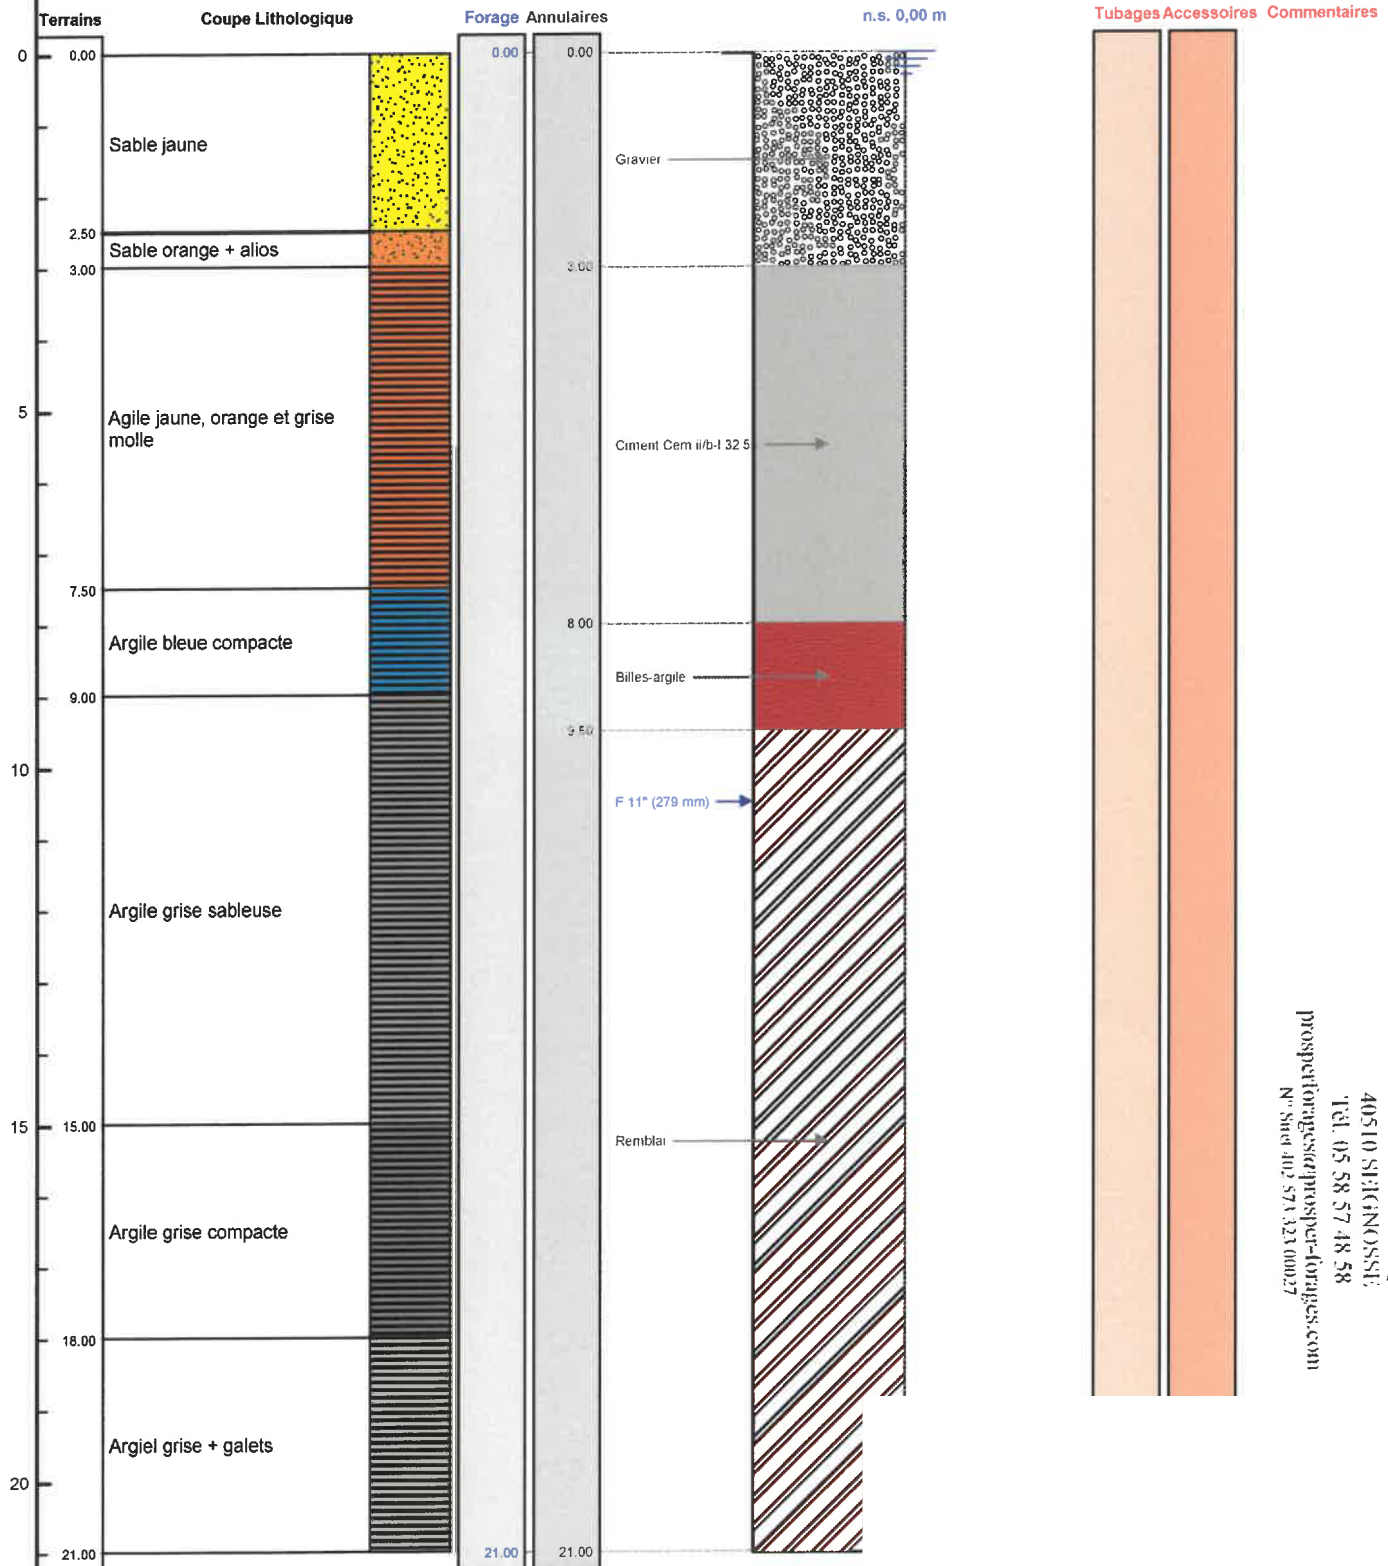

Le 19/2/2024 à SEIGNOSSE
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert-93 métrique Long.: 386 441 Lat.: 6 302 8

GE: 4

PROSPER FORAGES S.A.R.L.

465 Avenue de Larrigan

40510 SEIGNOSSE

TEL: 05 58 57 48 58

prospertforages@prospertforages.com

N° Siret 402 571 321 00027

