


DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

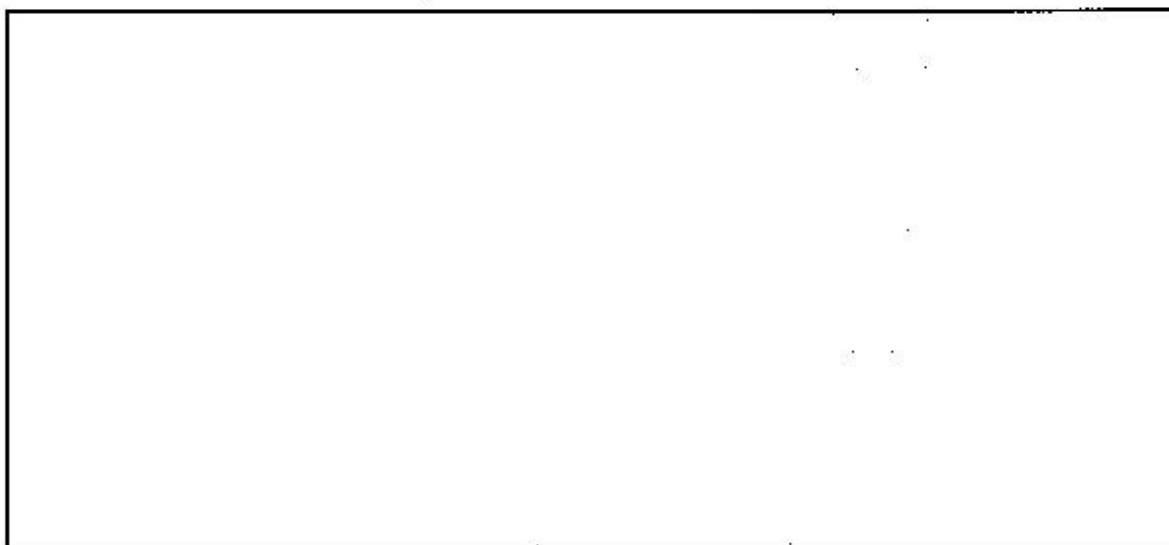

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 440707

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 3 BIS ROUTE DE PONT
14170 VENDEUVRE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 38.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 05/12/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 08/12/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 8.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

FORAGE D'EAU

LITHOLOGIE

De	A	Libellé
0.00	1.00	CAILLOUX REMBLAYE SABLÉ
1.00	19.00	CALCAIRE BLANC JAUNE EBOULANT

FORAGE

De	A	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
5.00	19.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
9.00	1.00
16.00	4.00

TUBAGE

De	a	Ø	Ømm	Epais	Ecran	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	11.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
11.00	15.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
15.00	19.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLESSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

Echelle : 1/95

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

