


DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

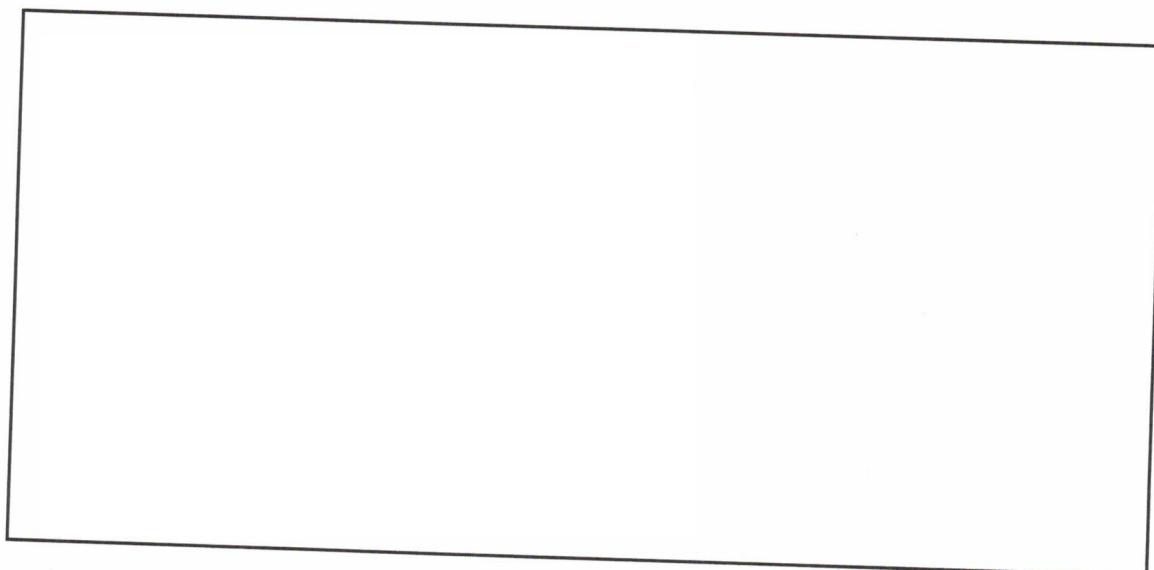

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 428205

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 8 HAMEAU DE MEDINE
76890 BUTOT

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 166.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 26/10/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 30/10/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 53.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 2.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	4.00	LIMON
4.00	10.00	ARGILE ROUGE
10.00	24.00	ARGILE MARRON NOIR
24.00	27.00	CRAIE EBOULANTE BLANCHE
27.00	118.00	CRAIE BLANCHE
118.00	125.00	CALCAIRE GRIS PASSAGE SABLE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	125.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
118.00	2.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	109.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
109.00	121.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
121.00	125.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés :
du : 26/10/2023 au : 30/10/2023

111

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0

Altitude sol (Z):

+166,000 m

Echelle : 1/628

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

