

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	SARL BOTTA
Client:	[REDACTED]
Maître d'oeuvre:	[REDACTED]
Exploitant:	[REDACTED]

Code National BSS :


N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :



Coordonnées : Longitude 005°41'57,7"E Latitude 045°44'16,5"N Altitude : 228.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 12/02/2024 Resp. M. Ouvrage : JS SERVICES

Date fin de l'ouvrage : 13/02/2024 Resp. M. Oeuvre : JS SERVICES

Machine : Egt 700 Resp. Chantier : MADELAINE

Date début pompage : 15/02/2024 Niveau statique non perturbé : 1.70 m

Date fin de pompage : 16/02/2024 Débit Maxi. d'essai : 20.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1 Rabattement correspondant : 0.21 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre
1.00	2.50	Argile
2.50	8.00	Gravier et sable
8.00	15.00	Molasse

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.00	9"1/4	237.00	Roto-percussion	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	4"7/8	125.00	6.00		P.v.c.	Tube-plein		
3.00	15.00	4"7/8	125.00	6.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.50	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Gravitaire			
2.50	15.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU

Client :
Maitre d'oeuvre :
Localisation de l'ouvrag

Travaux réalisés :
du : 12/02/2024 au : 13/02/2024

1\1


Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique
Longitude (X): 005°41'57,7"E
Latitude (Y): 045°44'16,5"N
Altitude sol (Z): +228,000 m

Echelle : 1/75

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)


Nombre de forages : 1

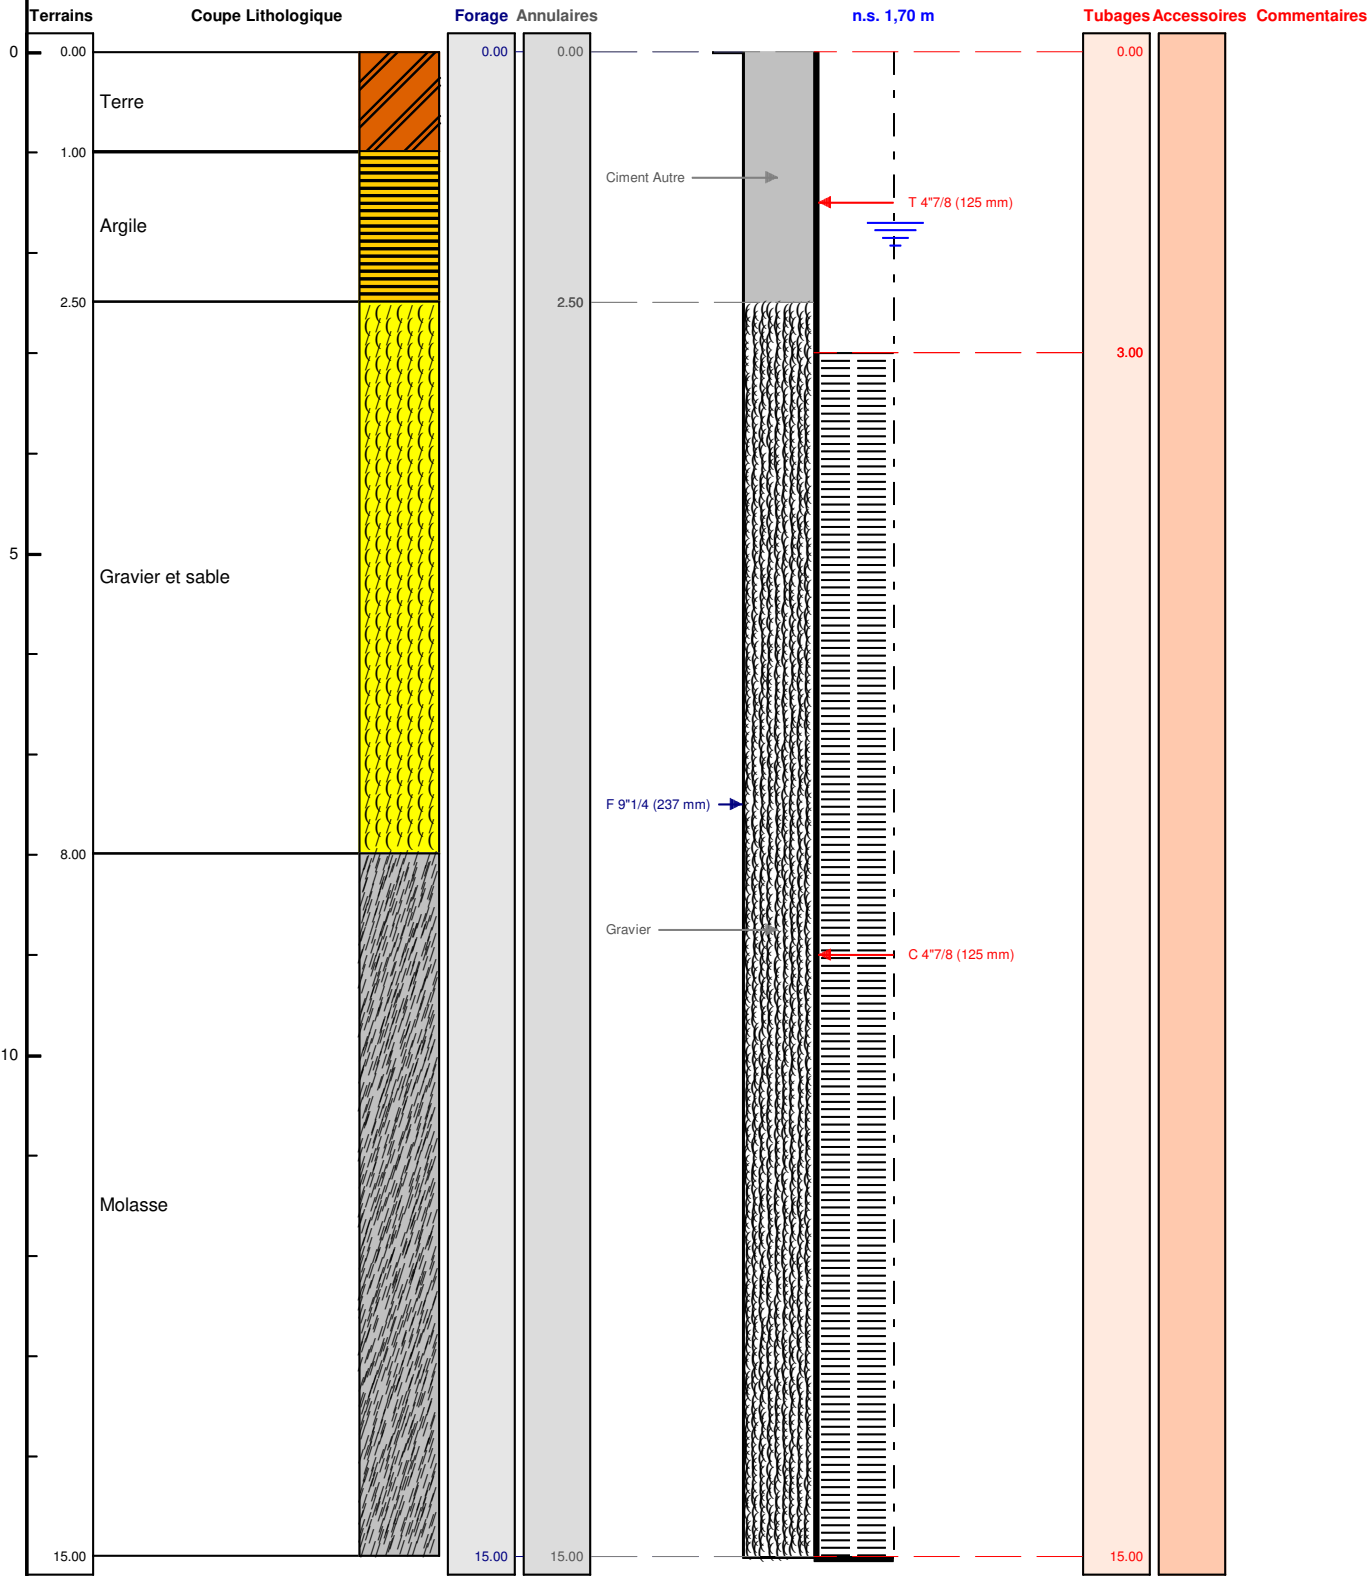

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

COURBE DE POMPAGE
FORAGE D'EAU
Pompage d'essai

Date début: 15/02/2024
Heure début: 08:00

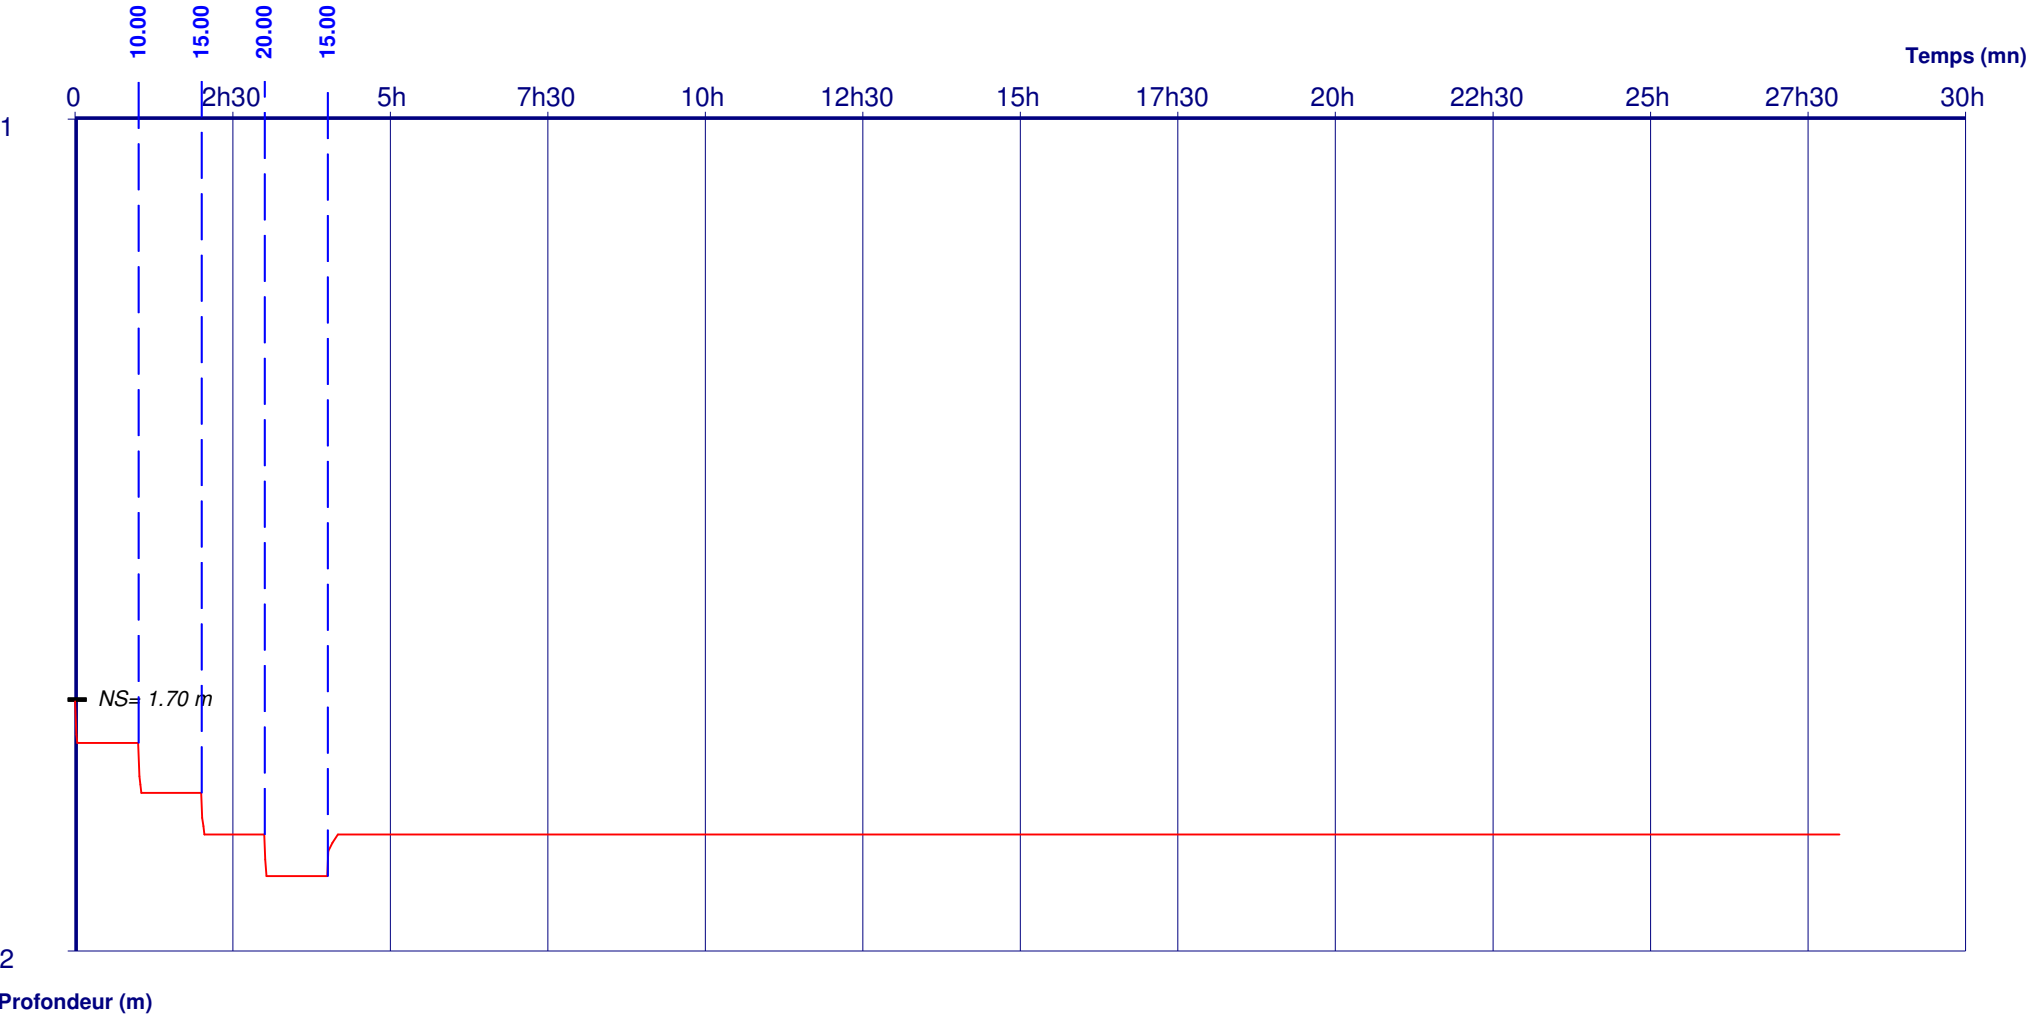

Débits:							
1h00 - 2h00	=	5.00	m3/h	4h00 - 28h00	=	20.00	m3/h
2h00 - 3h00	=	10.00	m3/h				
3h00 - 4h00	=	15.00	m3/h				

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	SARL BOTTA
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

Coordonnées : Longitude 005°41'58,8"E Latitude 045°44'16,1"N Altitude : 228.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 12/02/2024

Resp. M. Ouvrage : PALMER

Date fin de l'ouvrage : 12/02/2024

Resp. M. Oeuvre : PALMER

Machine : Egt 700

Resp. Chantier : MADELAINE

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre
1.00	2.00	Argile
2.00	4.50	Gravier et sable
4.50	15.00	Molasse

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.00	9"1/4	237.00	Roto-percussion	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	4"7/8	125.00	6.00		P.v.c.	Tube-plein		
3.00	15.00	4"7/8	125.00	6.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.00	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Gravitaire			
2.00	15.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU


Localisation de l'ouvrage

du : 12/02/2024 au : 12/02/2024

1\1

+228,000 m

Nombre de forages : 1

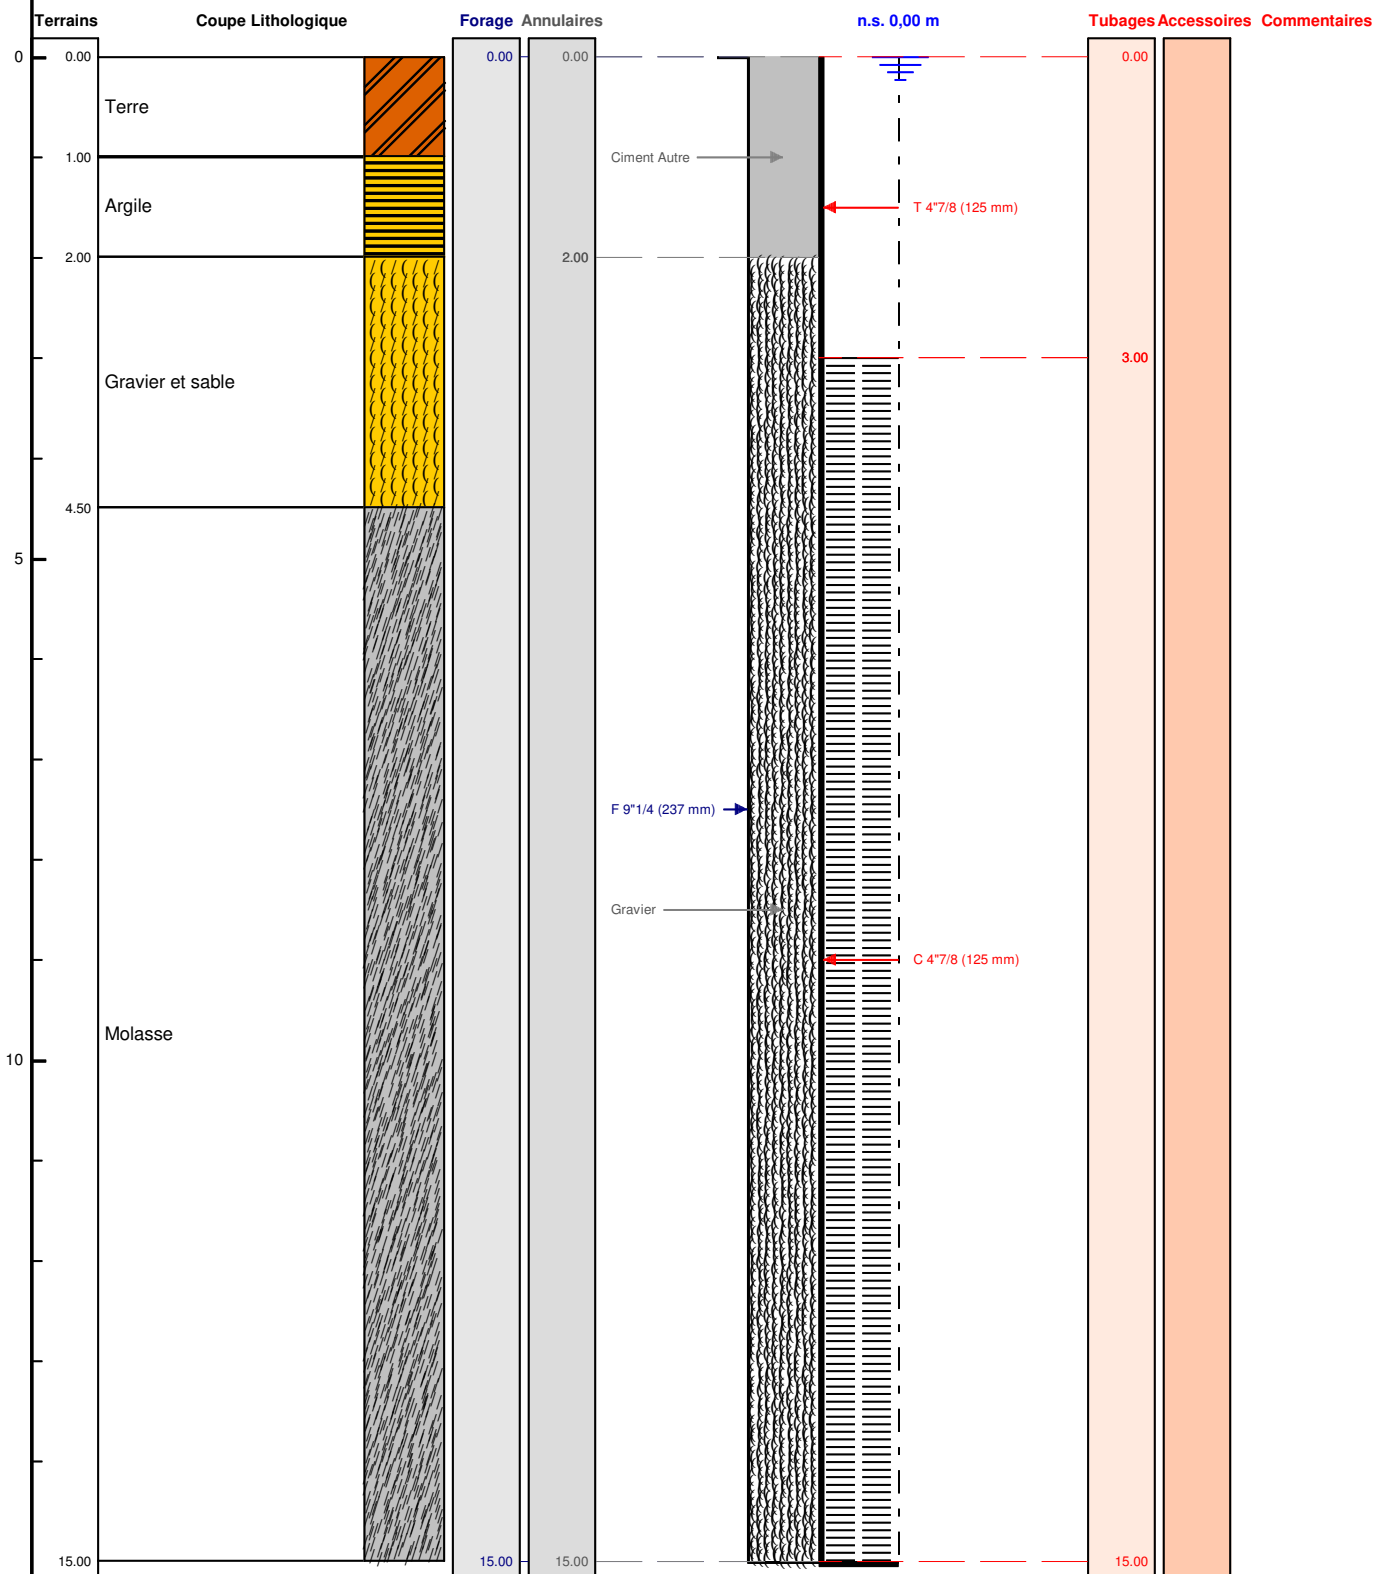

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
