

# DOSSIER TECHNIQUE

## GEOOTHERMIE CAPTEUR N° 1

Entreprise:	SARL BREBANT FORAGE
Client:	[REDACTED]
Maître d'oeuvre:	BREBANT FORAGE ZA DU CLOS DES MARES 50290 BREHAL
Exploitant:	[REDACTED]

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : [REDACTED]  
[REDACTED]

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 02/11/2022 Resp. M. Ouvrage : LEGALLAIS

Date fin de l'ouvrage : 02/11/2022 Resp. M. Oeuvre : PRUDENCE

Machine : Stenuick Resp. Chantier : PRUDENCE

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 0.00 m


Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## GEOthermie CAPTEUR N° 1

<b>Client:</b>		
<b>Maître d'oeuvre:</b>		
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>		

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	7.00	CALCAIRE ALTERE
7.00	72.00	CALCAIRE JAUNE
72.00	85.00	ARGILE GRIS
85.00	100.00	CALCAIRE GRIS TRES FRACTURE

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air
12.00	100.00	5"3/4	147.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
55.00	1.00
76.00	5.00
100.00	12.00

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	100.00	Rebouc	0.00	Ciment	Prestobent	Sous pression			

### ACCESSOIRE


De	à	Type d'accessoire
0.00	100.00	Sonde géothermique

GEOTHERMIE CAPTEUR N° 1

Client :  
Maitre d'oeuvre :  
Localisation de l'ouvrage

Travaux réalisés : 1\1  
du : 02/11/2022 au : 02/11/2022  
Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/503 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1

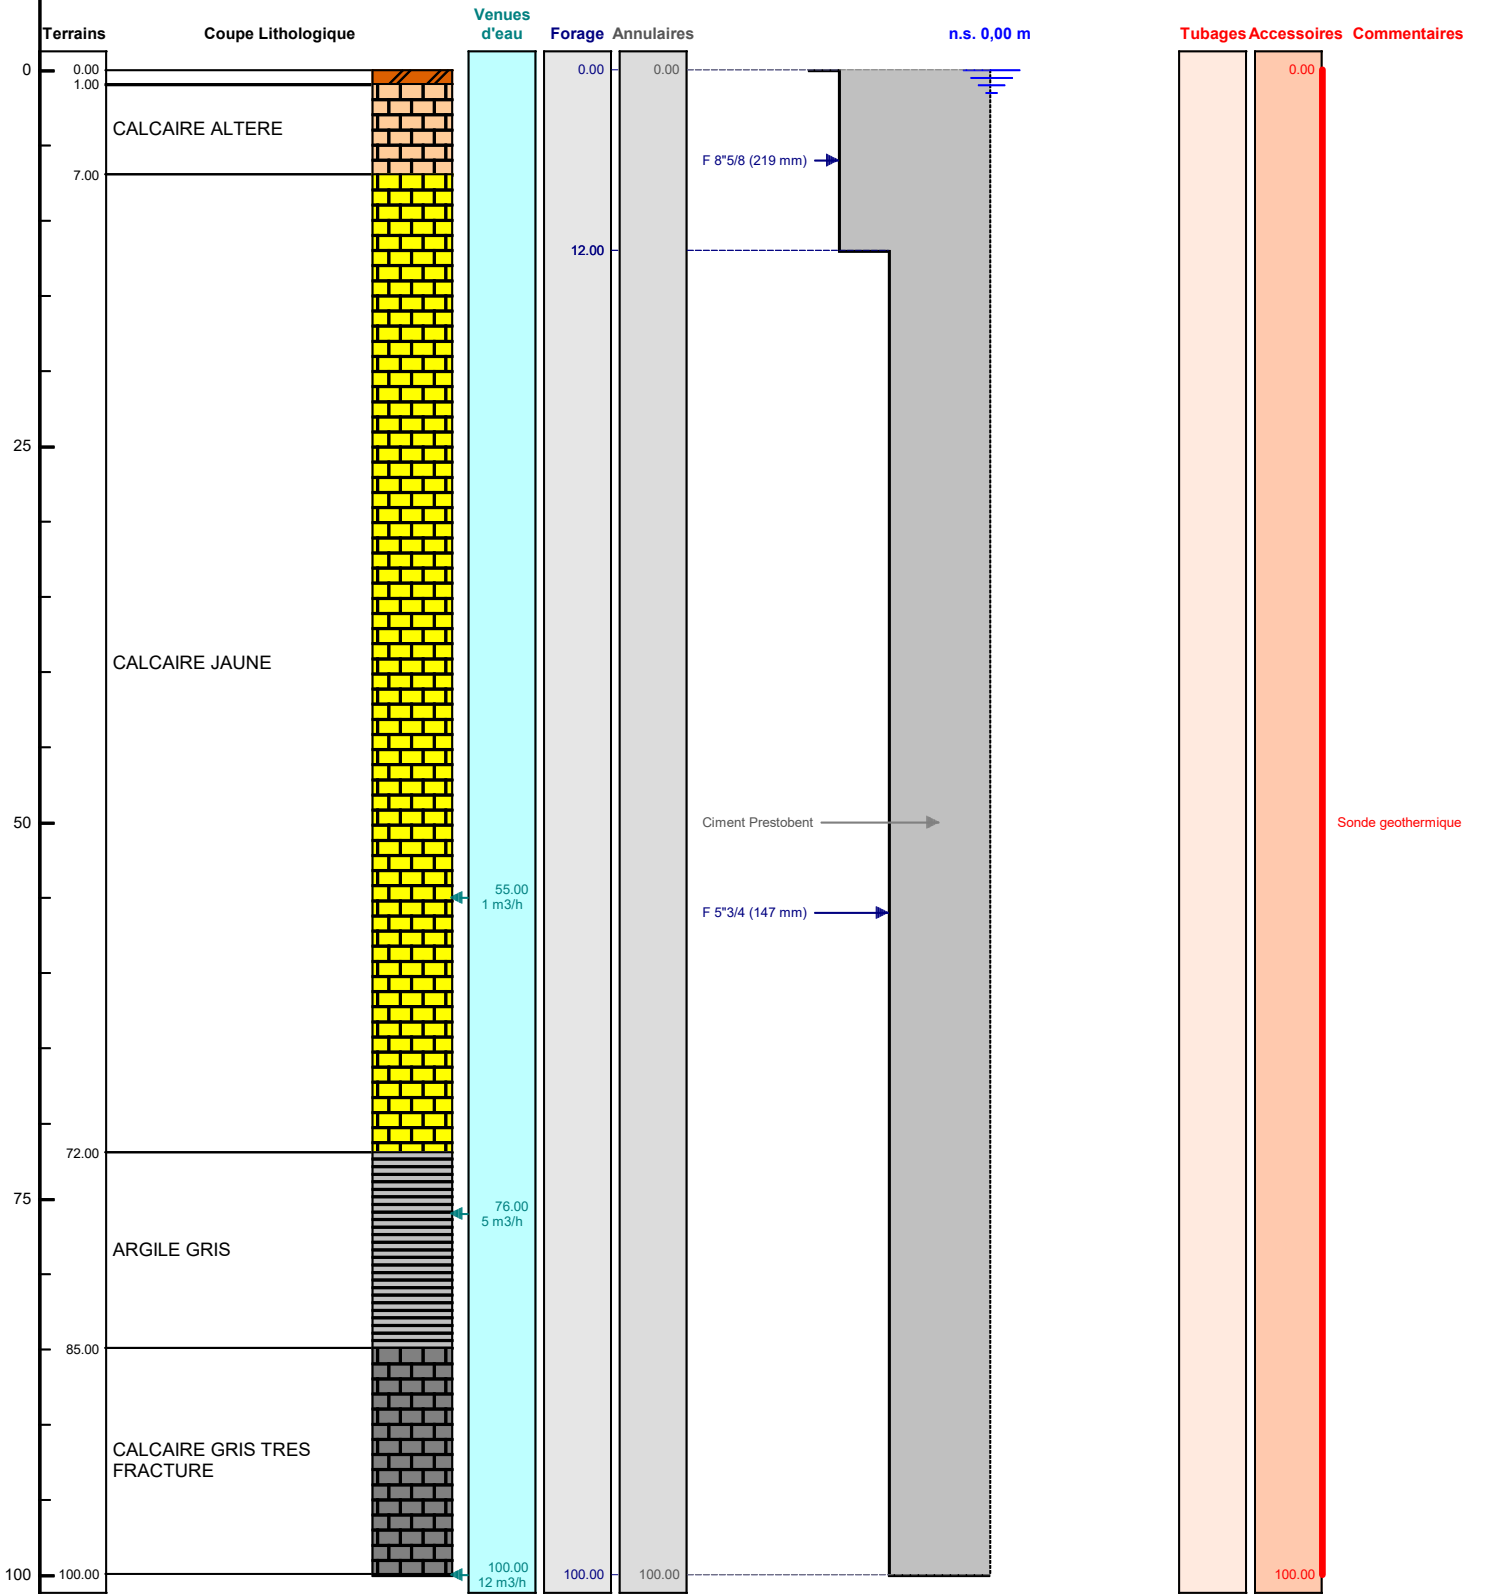

Le ...../...../..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise
