

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	PIJASSOU TP
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 221428

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 102 impasse du meneur de Loup
24450 ST PIERRE DE FRUGIE

Coordonnées : Longitude 001°01'18,63"E Latitude 045°33'48,89"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 08/08/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 12/08/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MFT

Resp. Chantier :

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 102 impasse du meneur de Loup

24450 ST PIERRE DE FRUGIE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	4.50	TUF
4.50	17.00	ARENE FRACTURE
17.00	40.00	ARENE DUR

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	40.00	7"1/8	180.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	25.00	4"7/8	125.00	6.50		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
25.00	37.00	4"7/8	125.00	6.50		P.v.c.-lisse	Crepine autre		
37.00	39.00	4"7/8	125.00	6.50		P.v.c.-lisse	Tube-decanteur		
39.00	40.00	4"7/8	125.00	6.50		P.v.c.-lisse	Fond-conique		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.00	4"7/8	125.00	Ciment	Thermocem	Annulaire			
4.00	6.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				
6.00	40.00	4"7/8	125.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Autre	2.00-4.00	0.54

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés :
du : 08/08/2022 au : 12/08/2022

1/1


Client :
Maitre d'oeuvre :
Localisation de l'ouvrage : 102 impasse du meneur de Loup
24450 ST PIERRE DE FRUGIE

Coordonnées de l'ouvrage :
Géographique
Longitude (X): 001°01'18,63"E
Latitude (Y): 045°33'48,89"N
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/201

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

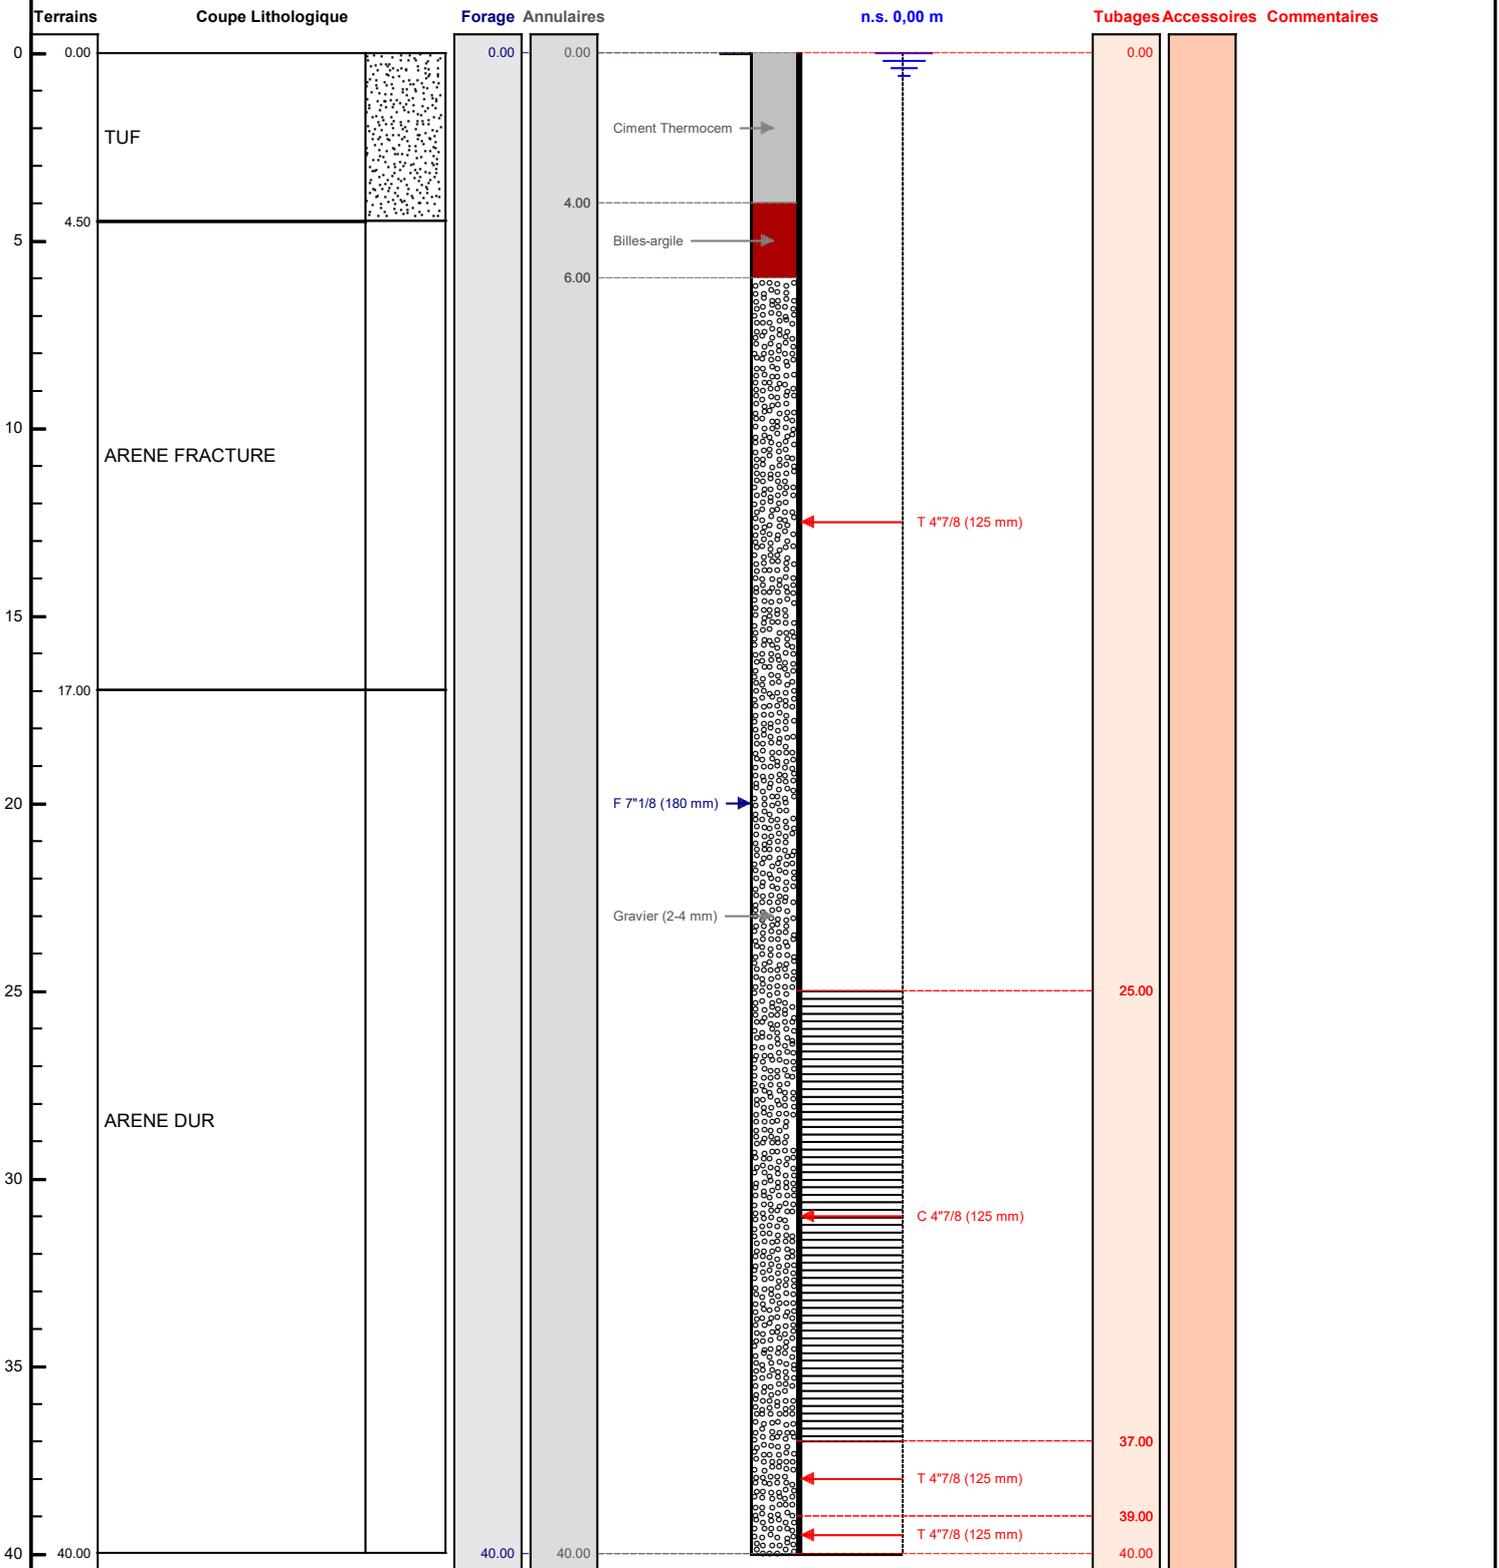

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

FORAGE D'EAU

Client :

_____ :

Localisation de l'ouvrage : 102 impasse du meneur de Loup

24450 ST PIERRE DE FRUGIE

Travaux réalisés :

du : 08/08/2022 au : 12/08/2022

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

X: 001°01'18,63"E

Y: 045°33'48,89"N

Z altitude sol: +0,000 m

