

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: **SARL SOGAMA**

Client:

Maître d'oeuvre:

Code National BSS : BSS004KRVJ

N° Déclaration : 701106

Lieu de l'ouvrage :

82800 VAISSAC

Coordonnées : X

Y

Altitude : 0.00 m

Date début de l'ouvrage : 26/02/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 29/02/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine : EGT Vd 518

Responsable Chantier :

Date début pompage :

Profondeur hydrostatique/sol : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m³/h

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

82800

VAISSAC

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre végétale
0.50	2.00	Argile
2.00	5.00	Argile sableuse
5.00	6.00	Graviers argileux
6.00	16.00	Marne argileuse
16.00	19.00	Sable argileux
19.00	28.00	Marne argileuse
28.00	34.00	Argile sableuse
34.00	53.00	Marne argileuse
53.00	59.00	Argile grise sableuse
59.00	63.00	Marne argileuse
63.00	67.00	Sable fin argileux
67.00	77.00	Marne argileuse
77.00	78.00	Petit passage sableux
78.00	85.00	Marne argileuse
85.00	91.00	Sable grossier
91.00	93.00	Argile
93.00	106.00	Sable
106.00	110.00	Marne argileuse

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	6.00	8"5/8	219.00	TARIERE	Autre
6.00	110.00	7"1/4	184.00	ROTARY	BOUE

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0.00	75.00	4"7/8	125.00	6.00		P.V.C.	TUBE-PLEIN		
75.00	110.00	4"7/8	125.00	6.00		P.V.C.	FENTE	0.50	

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	15.00	4"7/8	125.00	CIMENT	CLK	Sous pression	Roule	2.00-4.00	

REPLISSAGE (suite)

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
15.00	110.00	4"7/8	125.00	GRAVIER	Graviers de Silacq	Gravitaire	Roule	2.00-5.00	

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés :
du : 26/02/2024 au : 29/02/2024


Client :
Maitre d'oeuvre :
Localisation de l'ouvrage :

82800 VAISSAC

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique
X:
Y:
Z altitude sol: +0,000 m

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

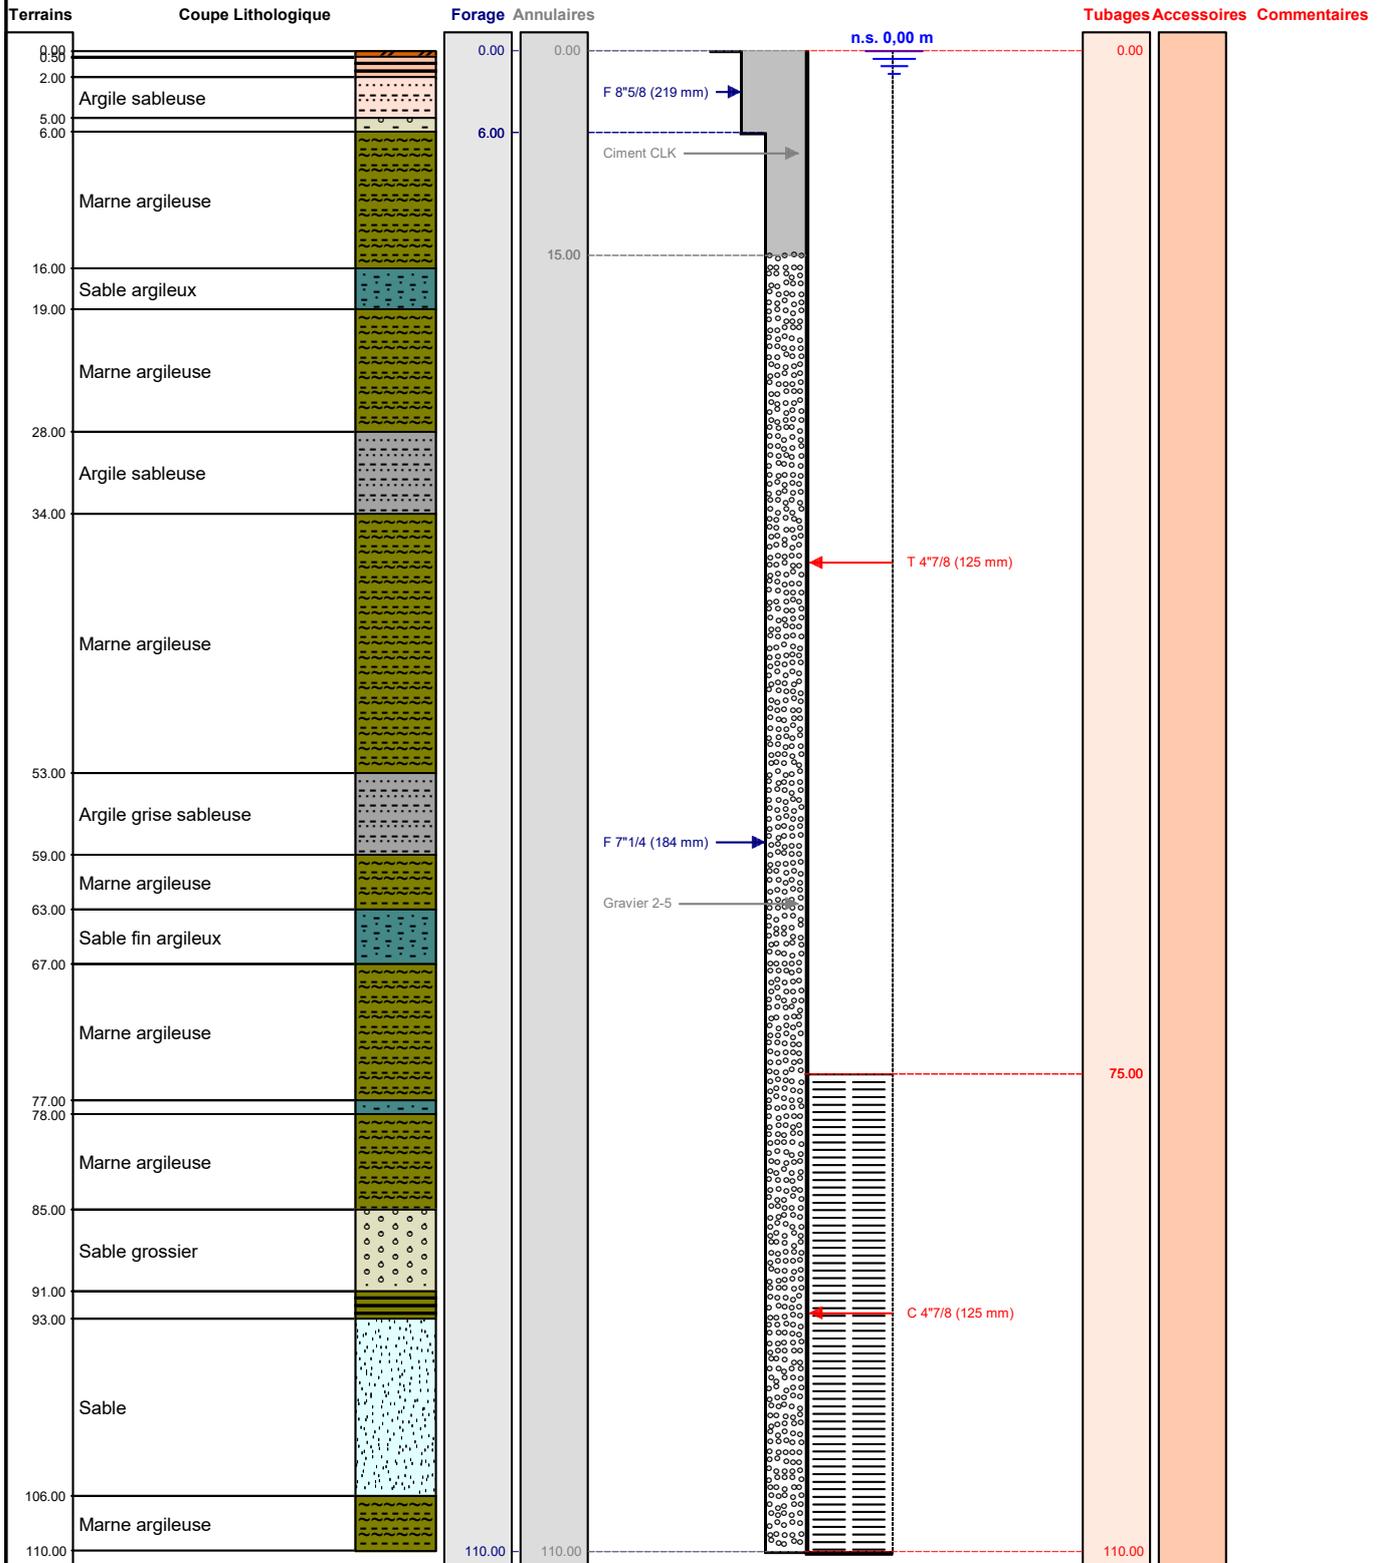

Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
