

DOSSIER TECHNIQUE

COMPLEMENT FORAGE ESSAI

Entreprise: SAS RAFFNER

Exploitant: /

Code National BSS : BSS000KJLY / X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

55270 VERY

Coordonnées : **Longitude** 799 237 **Latitude** 2 476 493 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 09/09/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 09/09/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 1.50 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : BSS000KJLY

TRONCONS de L'OUVRAGE

COMPLEMENT FORAGE ESSAI

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

55270

VERY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.20	Terre végétale
0.20	2.25	Argile
2.25	2.80	Alluvion
2.80	5.00	Argile
5.00	5.50	Calcaire
5.50	6.60	Argile
6.60	7.50	Calcaire
7.50	23.00	Calcaire fin
23.00	25.50	Argile grise/calcaire

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	0.70	15"3/4	400.00	Autre	Autre
0.70	7.50	12"1/4	311.00	Rotary	Eau-claire
7.50	25.50	8"5/8	220.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.40	7.50	9"	230.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.40	7.50	6"1/4	160.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
7.50	25.50	6"1/4	160.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.20	9"	230.00	Ciment	Béton 350kg	Annulaire			
0.00	0.50	Rebouc	0.00	Remblai					
0.50	0.70	Rebouc	0.00	Ciment	Cem ii/a -32.5	Autre			
0.20	6.50	Rebouc	0.00	Ciment	Cem ii/a -32.5	Annulaire			0.13
6.50	7.00	Rebouc	0.00	Billes-argile	Oregonite				0.01
0.40	7.00	6"1/4	160.00	Ciment	Cem ii/a -32.5	Annulaire			
0.40	7.50	9"	230.00	Ciment	Cem ii/a -32.5	Annulaire			
7.00	8.00	6"1/4	160.00	Billes-argile	Oregonite				
7.00	21.50	Rebouc	0.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	11.00-22.00	0.30

REPLISSAGE (suite)

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
8.00	25.50	6"1/4	160.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule		
21.50	25.50	Rebouc	0.00	Remblai					

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

55270	VERY
-------	------

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 2 étendu métrique

Longitude (X):

Latitude (Y):

Altitude sol (Z):

799 237


2 476 493

+0,000 m

Echelle : 1/128

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

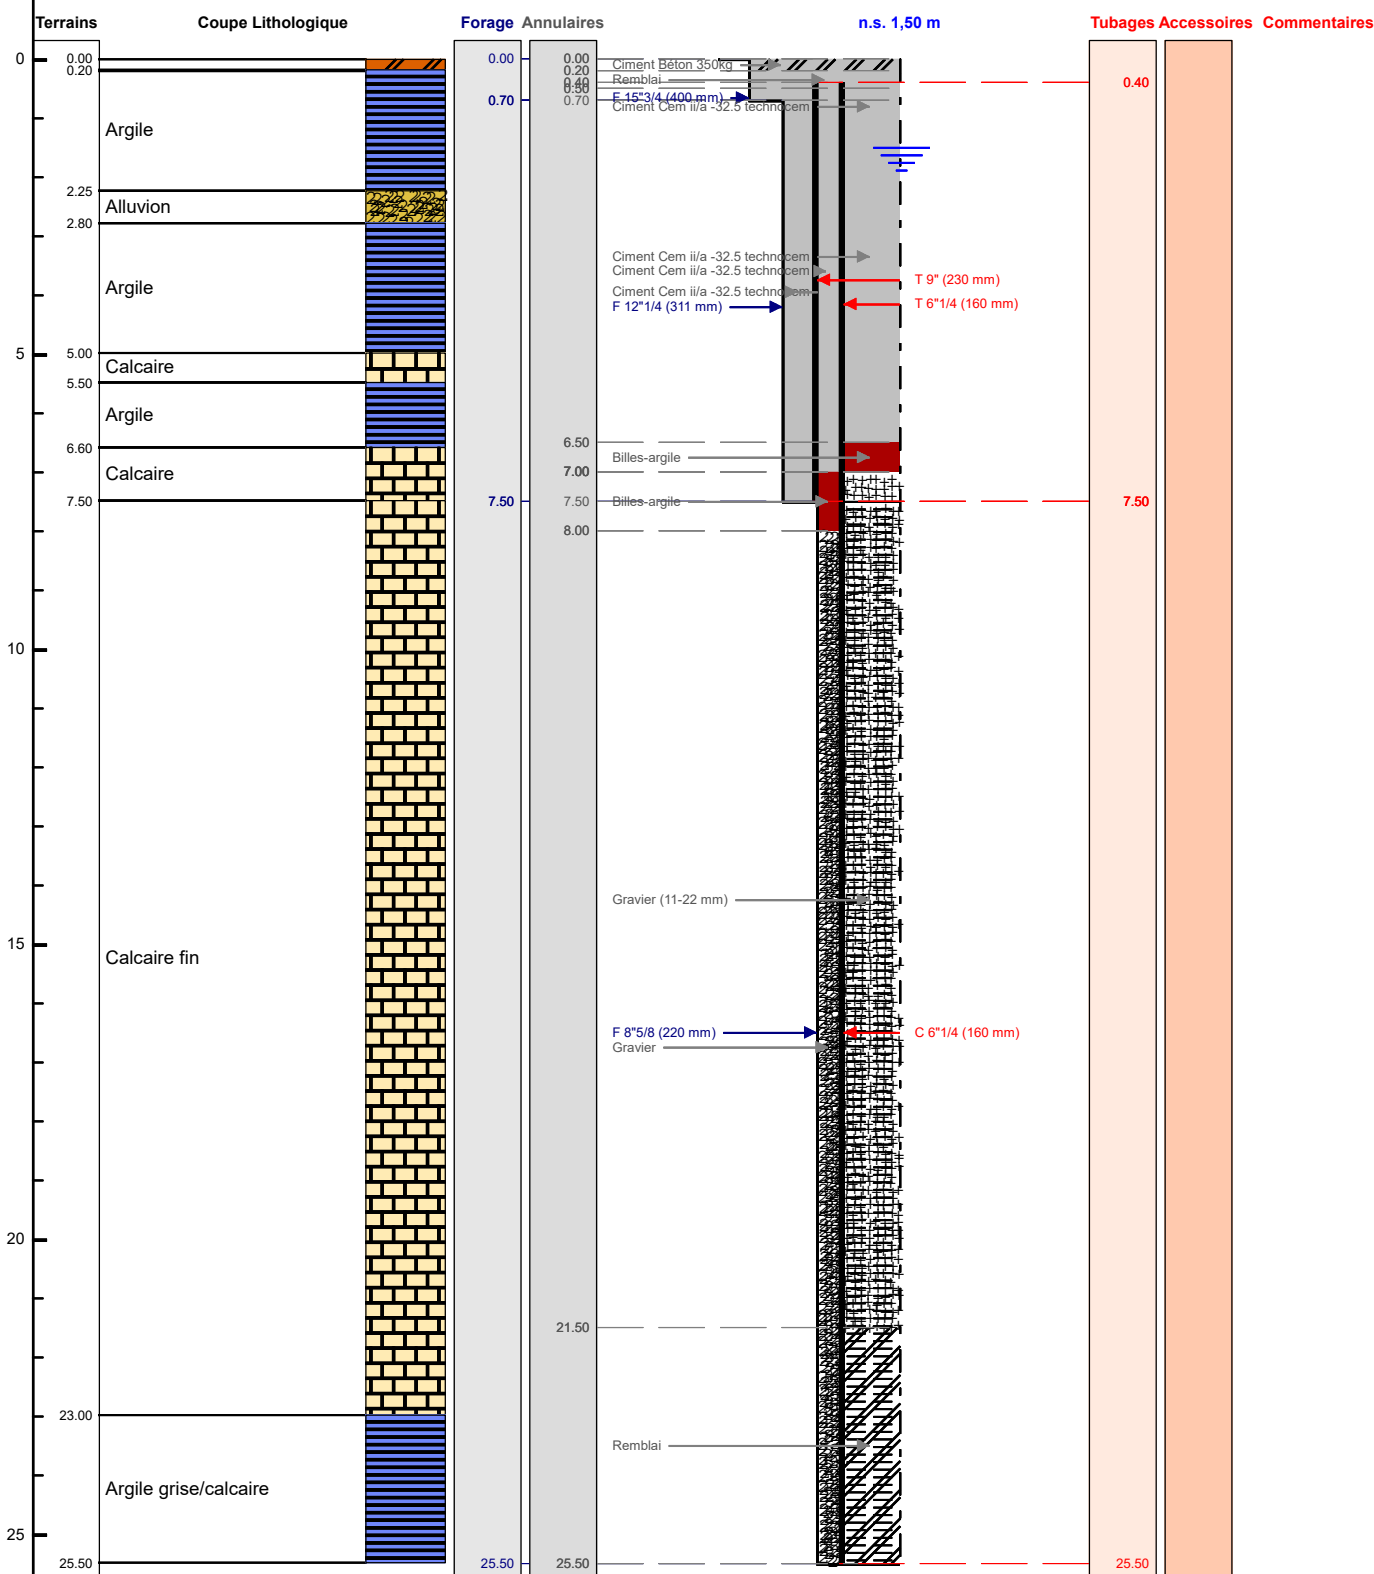

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
