

DOSSIER TECHNIQUE

GEOthermie CAPTEUR N° 1

Entreprise:	SARL BREBANT FORAGE
Client:	GROUPE SCOLAIRE Ecole - 2 Rue Alphonse Lenoir 50220 ST QUENTIN SUR LE HOMME
Maître d'oeuvre:	BREBANT FORAGE ZA DU CLOS DES MARES 50290 BREHAL
Exploitant:	GROUPE SCOLAIRE Ecole - 2 Rue Alphonse Lenoir 50220 ST QUENTIN SUR LE HOMME

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : ECOLE, 2 Rue Alphonse Lenoir
50220 ST QUENTIN SUR LE HOMME

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 18/12/2022 **Resp. M. Ouvrage :** GROUPE SCOLAIRE

Date fin de l'ouvrage : 18/12/2022 **Resp. M. Oeuvre :** PRUDENCE

Machine : Stenuick **Resp. Chantier :** PRUDENCE

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

GEOthermie CAPTEUR N° 1

Client: GROUPE SCOLAIRE
Maître d'oeuvre: BREBANT FORAGE
Lieu de l'ouvrage : ECOLE, 2 Rue Alphonse Lenoir
50220 ST QUENTIN SUR LE HOMME

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	43.00	SCHISTE MARRON GRIS
43.00	100.00	SCHISTE GRIS

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air
10.00	100.00	5"3/4	147.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
60.00	1.00

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	100.00	Rebouc	0.00	Ciment	Prestobent	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	100.00	Sonde géothermique

GEOTHERMIE CAPTEUR N° 1

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

GROUPE SCOLAIRE

BREBANT FORAGE

ECOLE, 2 Rue Alphonse Lenoir

50220

ST QUENTIN SUR LE HOMME

Travaux réalisés :

du : 18/12/2022 au : 18/12/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

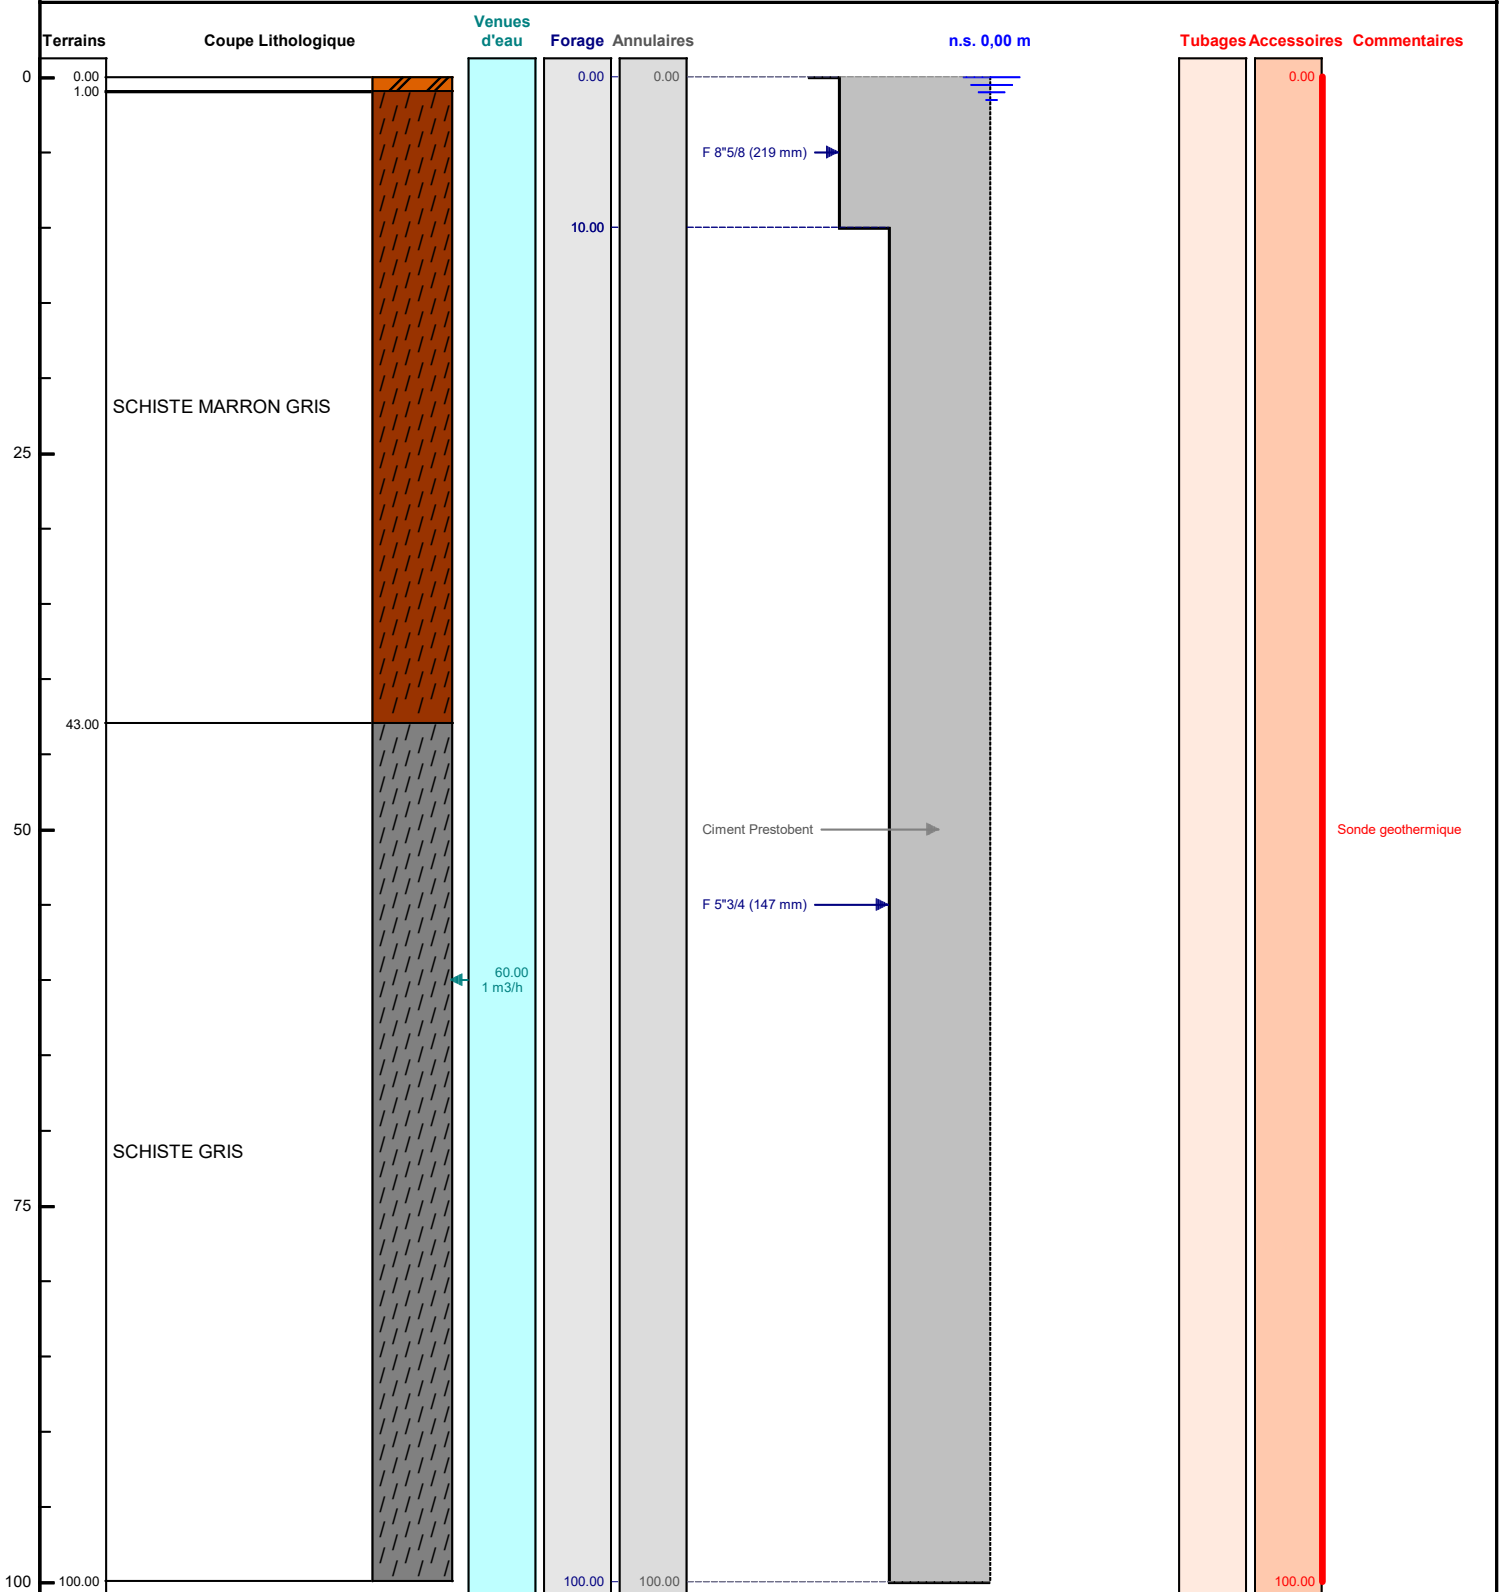

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
