

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 46 ML

Entreprise: SARL BREBANT FORAGE

Client: EARL DE LA FIEFFE

Rue du Hamel Besnée

50800 LA COLOMBE

Maître d'oeuvre: BREBANT FORAGE

ZA DU CLOS DES MARES

50290 BREHAL

Exploitant: EARL DE LA FIEFFE

Rue du Hamel Besnée

50800 LA COLOMBE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Rue du Hamel Besnée

50800 LA COLOMBE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m

Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 06/03/2023

Resp. M. Ouvrage : EARL DE LA FIEFFE

Date fin de l'ouvrage : 06/03/2023

Resp. M. Oeuvre : PRUDENCE

Machine : Stenuick

Resp. Chantier : PRUDENCE

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : POMPAGE MAXIMUM: 9 M3 / HEURE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 46 ML

Client: **EARL DE LA FIEFFE**

Maître d'oeuvre: **BREBANT FORAGE**

Lieu de l'ouvrage : **Rue du Hamel Besnée**

50800 **LA COLOMBE**

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	11.00	SCHISTE MARRON
11.00	46.00	SCHISTE BLEU PASSAGE MARRON

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	46.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
30.00	1.00
37.00	15.00
39.00	17.00
46.00	17.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	26.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
26.00	30.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
30.00	34.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
34.00	38.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
38.00	42.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
42.00	46.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REEMPLISSAGE


De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
11.00	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				

		FORAGE D'EAU 46 ML		Travaux réalisés : du : 06/03/2023 au : 06/03/2023		1/1	
Client :		EARL DE LA FIEFFE				Coordonnées de l'ouvrage : Lambert 1 carto métrique Longitude (X): 0 Latitude (Y): 0 Altitude sol (Z): +0,000 m	
Maitre d'oeuvre :		BREBANT FORAGE					
Localisation de l'ouvrage :		Rue du Hamel Besnée					
		50800 LA COLOMBE					

Echelle : 1/231

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

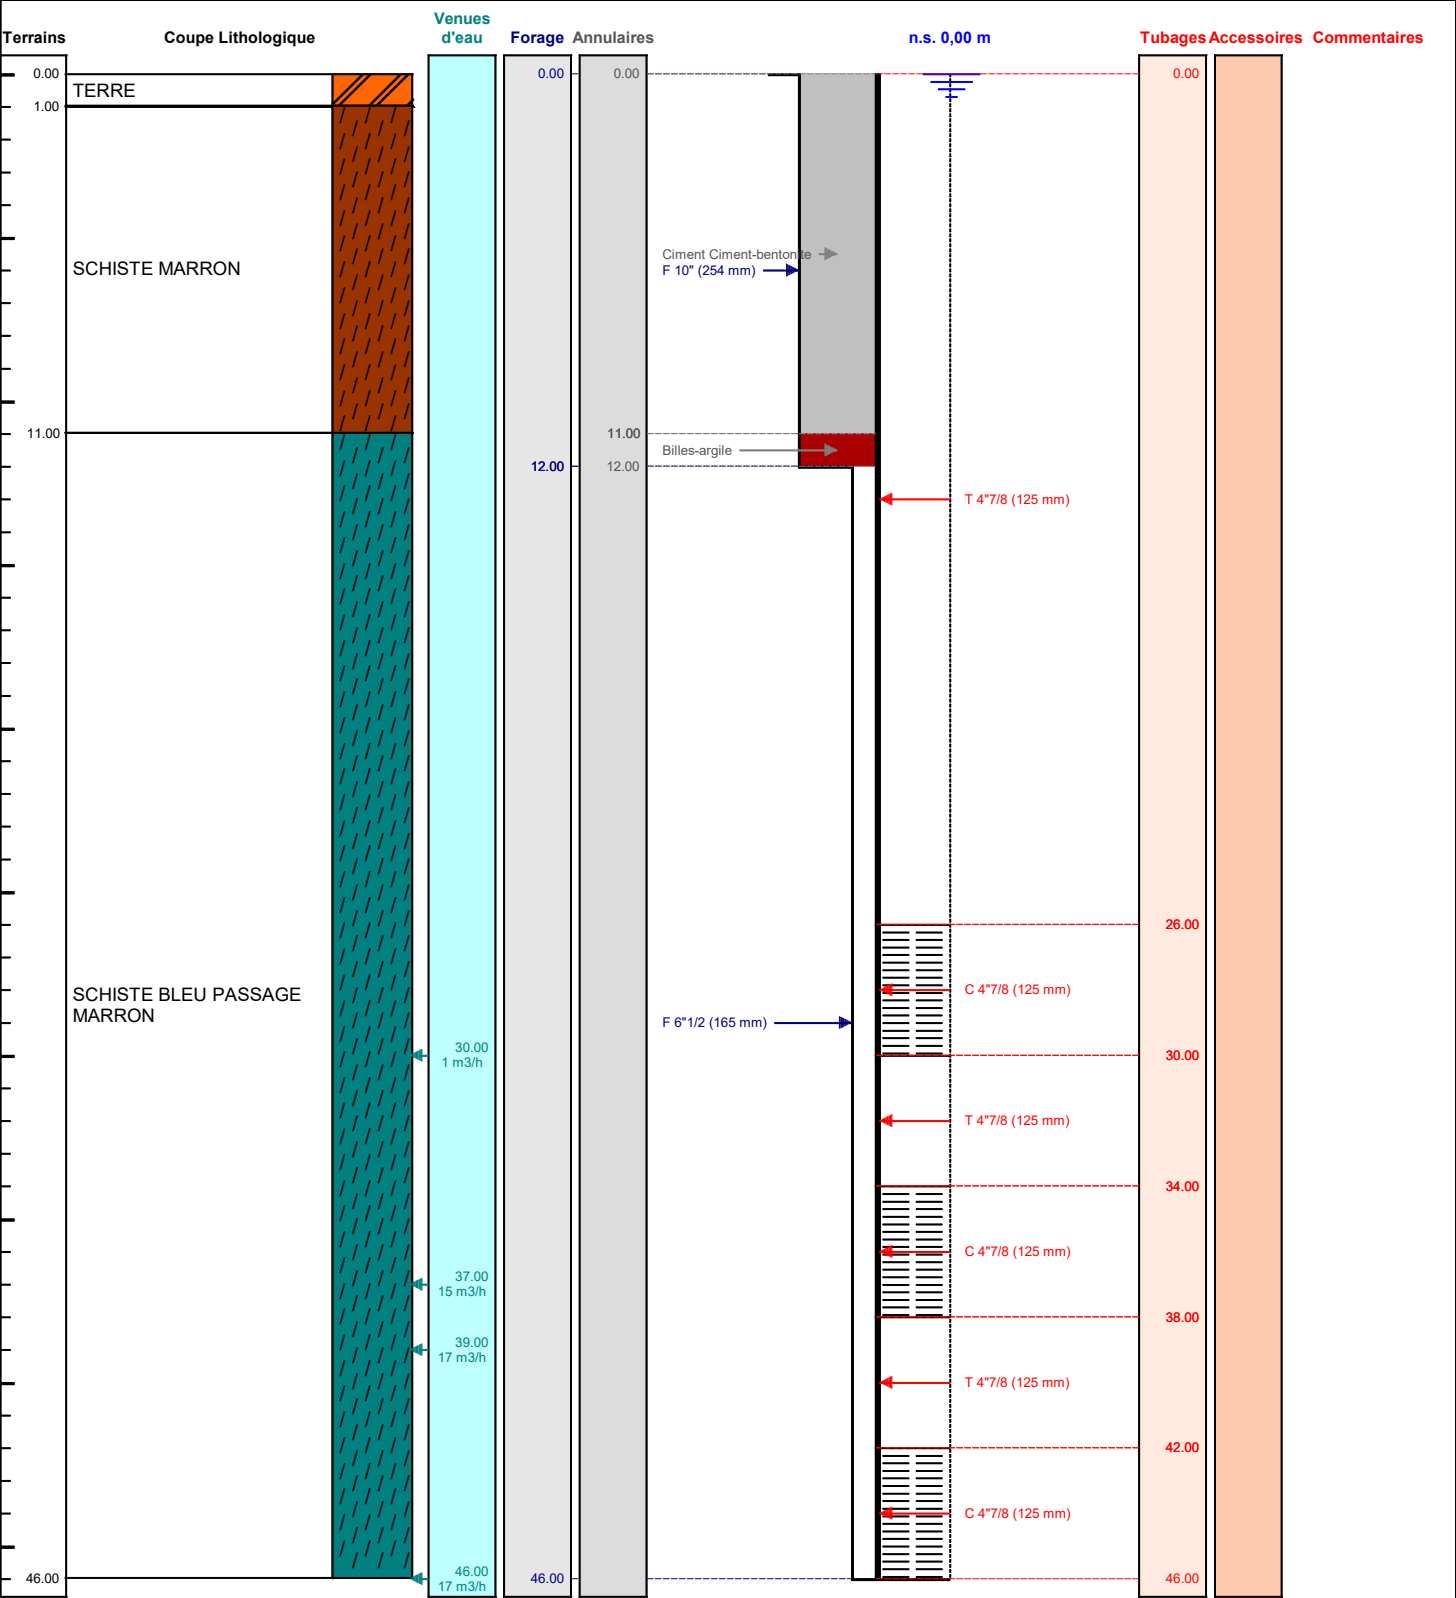

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
