

Rapport de fin de forage

Ouvrage BSS004KDLE

SCEA DE CONCEVREUX

Concevreux

10/01/2024

Récapitulatif

Identifiant de la déclaration : 764756

Nombre 1

Statut : Finalisée

Déclarant :

Nom du maître d'ouvrageDAO :

Propriétaire :

Nom du maître d'oeuvre :

Foreur :

Nom Usuel de l'ouvrageDAO : SCEA DE CONCEVREUX

Identifiant BSS : BSS004KDLE

Type de rapport : Rapport de fin de forage

Statut du rapport fin de forage En cours

Date de début : 31/10/2022

Date de fin : 18/11/2022

Nature : Forage

Usage : Irrigation par tout autre procédé

Département : Aisne

Commune : Concevreux

Direction : Vertical

Longueur forée : 25.0 m

Description technique

Méthodes de foration : 2

Diagraphies : 0

Equipements (tubages ou accessoires) : 4

Annulaires et Remplissages : 0

Venues d'eau : 0

Description géologique

Lithologies : 2

Formations : 0

Ages : 0

Commentaire

Dernière mise à jour le 10/01/2024 par Confidentiel

Identification de l'ouvrage

Déclaration

Identification de la déclaration : 764756

Statut : Finalisée

Ouvrage

Nom usuel de l'ouvrageDAO : SCEA DE CONCEVREUX

Identifiant BSS : BSS004KDLE

Date de Début : 31/10/2022

Date de Fin : 18/11/2022

Nature ouvrageDAO : Forage

Fonction : Exploitation, Eau, Exploitation/Eau

Usage : Irrigation par tout autre procédé

Direction : Vertical

Longueur forée (m) : 25.00 m

Liste des acteurs

Type	Siret	Raison Sociale	Nom	Prénom	Courriel	Téléphone	Adresse postale
Foreur	39773365000022		Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel		1 rue René Cassin Nangis
Déclarant	39773365000022		Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel		1 rue René Cassin Nangis
Maître d'Ouvrage (MOA)	32286388700020		Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel		2 RUE DE L'ABBAYE Coulonges-Cohan
Maître d'Œuvre (MOE)	32286388700020		Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel		Confidentiel
Propriétaire foncier	32286388700020		Confidentiel	Confidentiel	Confidentiel		Confidentiel

Journal des travaux

Date de Début	Date de fin	Phase de chantier	Description
31/10/2022	04/11/2022	Mise en place foration tubage	Mise en place foration 6m tubage acier 6m cimentation foragtion jusque 25m
07/11/2022	10/11/2022	Equipement gravier acide	Equipement PVC gravillonnage acidification air-lift pompage de développement
14/11/2022	17/11/2022	Pompages repli	Pompages paliers et longue durée, repli du chantier

Localisation

Emplacement : A terre

Coordonnées géographiques (X, Y)

Système de référence spatial : RGF93 / Lambert-93

Unité : mètre

Méthode utilisée : Mode d'obtention inconnu

X : 756861.0

Précision :

Y : 6920353.0

Altimétrie (Z)

Altitude calculée : 49.43


Altitude (m) :

Méthode utilisée : MNT

Méthode utilisée : Mode d'obtention inconnu

Précision : Précision altimétrique

Précision : Précision altimétrique

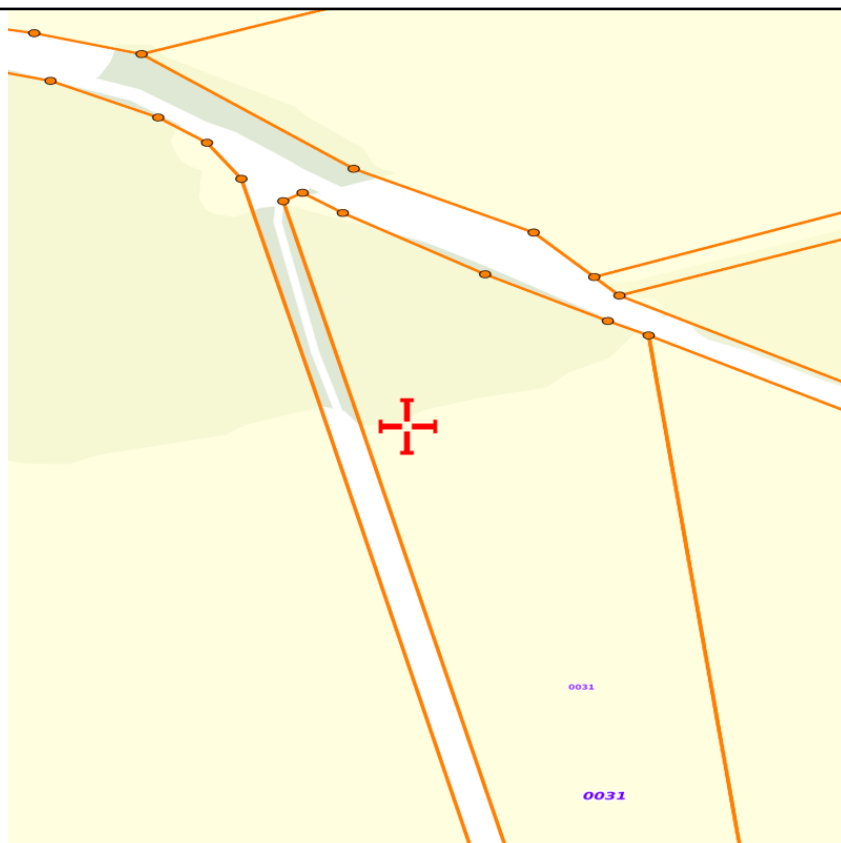

Description technique

Hauteur référence

Niveau zéro de référence : Sol


Méthodes de forage

De (m)	à (m)	Diamètre (mm)	Diamètre (pouces)	Méthode de foration	Fluide
0.00	5.00	650	25"5/8	Rotary Tricone	Eau
5.00	25.00	508	20"	Rotary Tricone	Eau

Description technique : Equipements

De (m)	à (m)	Type d'équipement (tubage ou accessoire)	Diamètre (mm)	Diamètre (pouces)	Nature du tube	Epaisseur du tube (mm)	Centreurs (nbre)	Slot (mm)	% vide	Type lumière
0.00	6.00	Tube	530	20"7/8	Acier Ordinaire	5.00				
0.00	9.00	Tube plein	400	15"3/4	P.V.C.Lisse	35.00	2			
9.00	25.00	Crépine	400	15"3/4	P.V.C	35.00	2			
25.00	25.00	Fond plat	400	15"3/4	P.V.C	35.00				

Description technique : Coupe technique

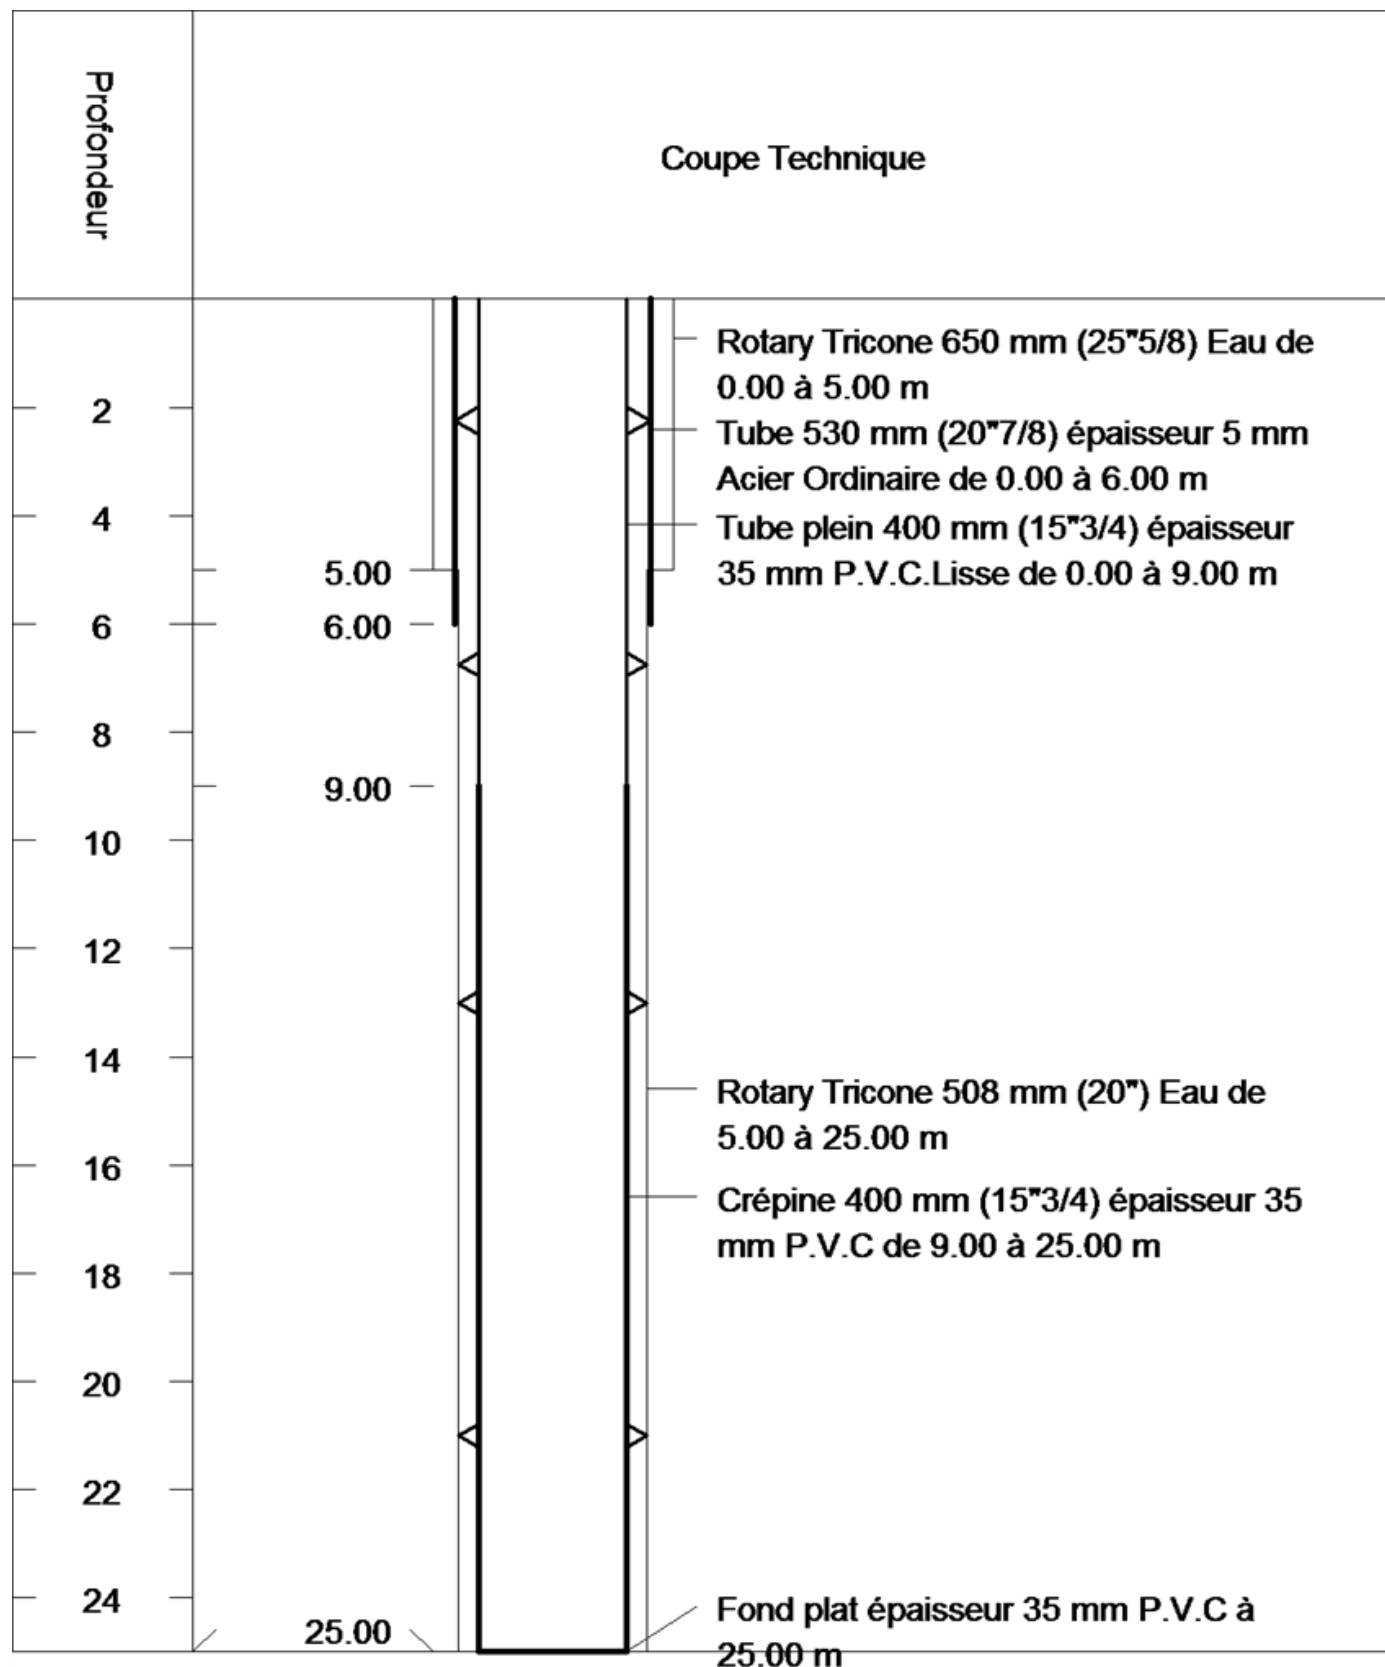

Description géologique : Lithologies

Hauteur référence

Niveau zéro de référence : Sol

Lithologies

De (m)	à (m)	Lithologie	Couleur	Qualifiant	Composant	Commentaire
0.00	5.00					Sables et graviers
5.00	25.00	Craie				Craie

Description géologique : Coupe géologique

Profondeur	Lithologie	Description	Légende lithologie
2	5.00		Sables et graviers
4			
6	25.00	Craie	Craie
8			
10			
12			
14			
16			
18			
20			
22			
24			

Coupe générale

