


Essai de Pompage

Entreprise	AQUIFOR	Type pompe	ITT Lowara 16GS40 4KW
Client	MAIRIE LE TEICH STADE DUMARTIN	Profondeur pompe	12 M
Commune	LE TEICH	Longueur refoulement	10 M
Date	13/08/2014	Mesure debit	Débimètre electromagnétique
Durée	9h30	Mesure niveau	Capteur de pression céramique 0 à 6bars
Niv. Statique	3,80M	Origine	Haut du tubage acier galvanisé
Fond	18,33 M	Hauteur ppr/sol	
		Enregistrement	Enregistreur numérique 8 voies

Essai de pompage le 13/08/14

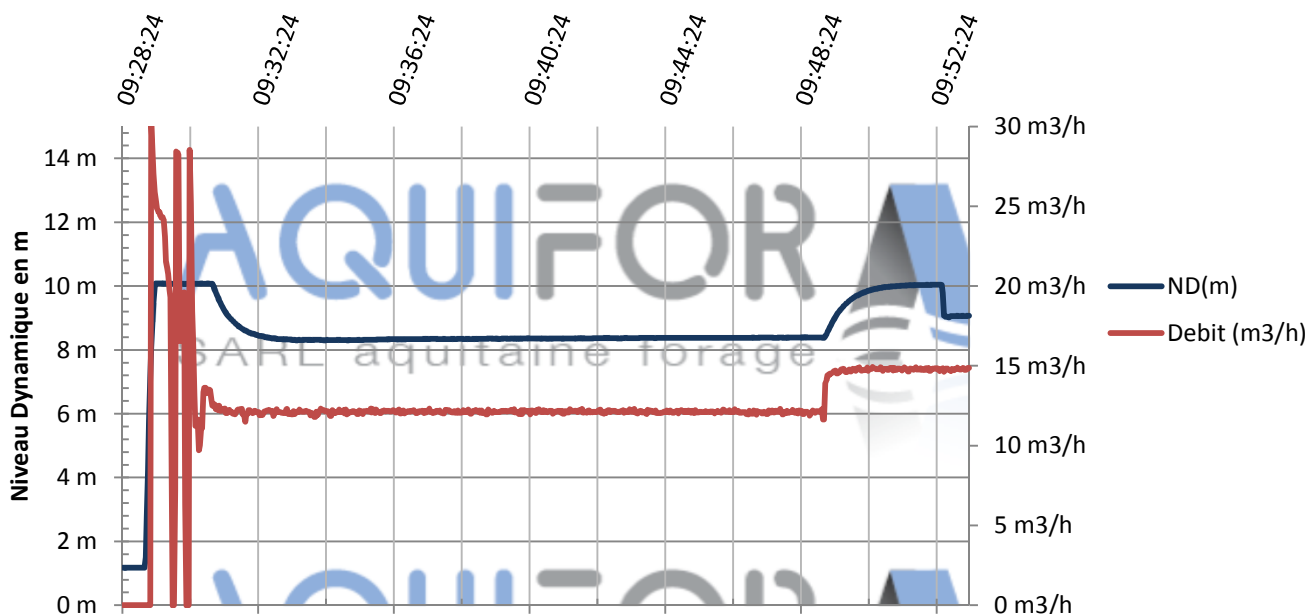

Essai de pompage le 13/08/14

