

FORAGE AGRICOLE DE REMPLACEMENT

BSS003 IJVE

Entreprise:	FORAQUITAIN
Client:	ASA DU GEME MATRIC 40120 BOURRIOT BERGONCE
Maître d'oeuvre:	ASA DU GEME /
Exploitant:	ASA DU GEME MATRIC 40120 BOURRIOT BERGONCE

Code National BSS :

N° Déclaration **: 40-2018-00466

Police de l'eau * : 40127

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : GEME

40120 BOURRIOT BERGONCE

Coordonnées : Longitude 438 209 Latitude 6 343 023 **Altitude :** 111.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 13/03/2019

Resp. M. Ouvrage : M. SICARD

Date fin de l'ouvrage : 20/03/2019

Resp. M. Oeuvre : FORAQUITAIN

Machine : FAILING 1500

Resp. Chantier : M. JURQUET

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 1.40 m

Date fin de pompage : 19/03/2019

Débit Maxi. d'essai : 11.40 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 6.16 m

Notes : COMPLEMENT DU F1 : Top remblai 22,10m, mise en place de 260 litres de gravier roulé et calibré 1-2,5 de 22,10 à 8,90m. Injection de 164 litres laitier de 8.90 à 0.5m.
Découpe du tube PVC à - 0,5m / sol.

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE AGRICOLE DE REMPLACEMENT

Client:	ASA DU GEME		
Maître d'oeuvre:	ASA DU GEME		
Lieu de l'ouvrage :	GEME		
	40120	BOURRIOT BERGONCE	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.70	TERRE NOIRE
0.70	17.80	SABLES BLANCS LEGEREMENT ARGILEUX
17.80	24.00	SABLES GROSNIERS
24.00	24.50	ARGILE BLEUE COMPACTE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	0.50	12"3/4	323.00	Tariere	Eau-claire
0.50	24.50	10"3/4	273.00	Battage	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	0.50	10"3/4	273.00	6.30		Acier-ordinaire	Cuvelage		
-0.40	14.70	6"5/8	167.00	5.00		P.v.c.	Cuvelage		
14.70	24.40	6"5/8	167.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.50	10"3/4	273.00	Ciment	Clk	Annulaire			0.08
0.50	25.00	6"5/8	167.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	1.03

FORAGE AGRICOLE DE REMPLACEMENT

Travaux réalisés : 1/1
du : 13/03/2019 au : 20/03/2019

Client : ASA DU GEME

Maitre d'oeuvre : ASA DU GEME

Localisation de l'ouvrage : GEME

40120 BOURRIOT BERGONCE

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X): 438 209


Latitude (Y): 6 343 023

Altitude sol (Z): +111,000 m

Echelle : 1/128

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

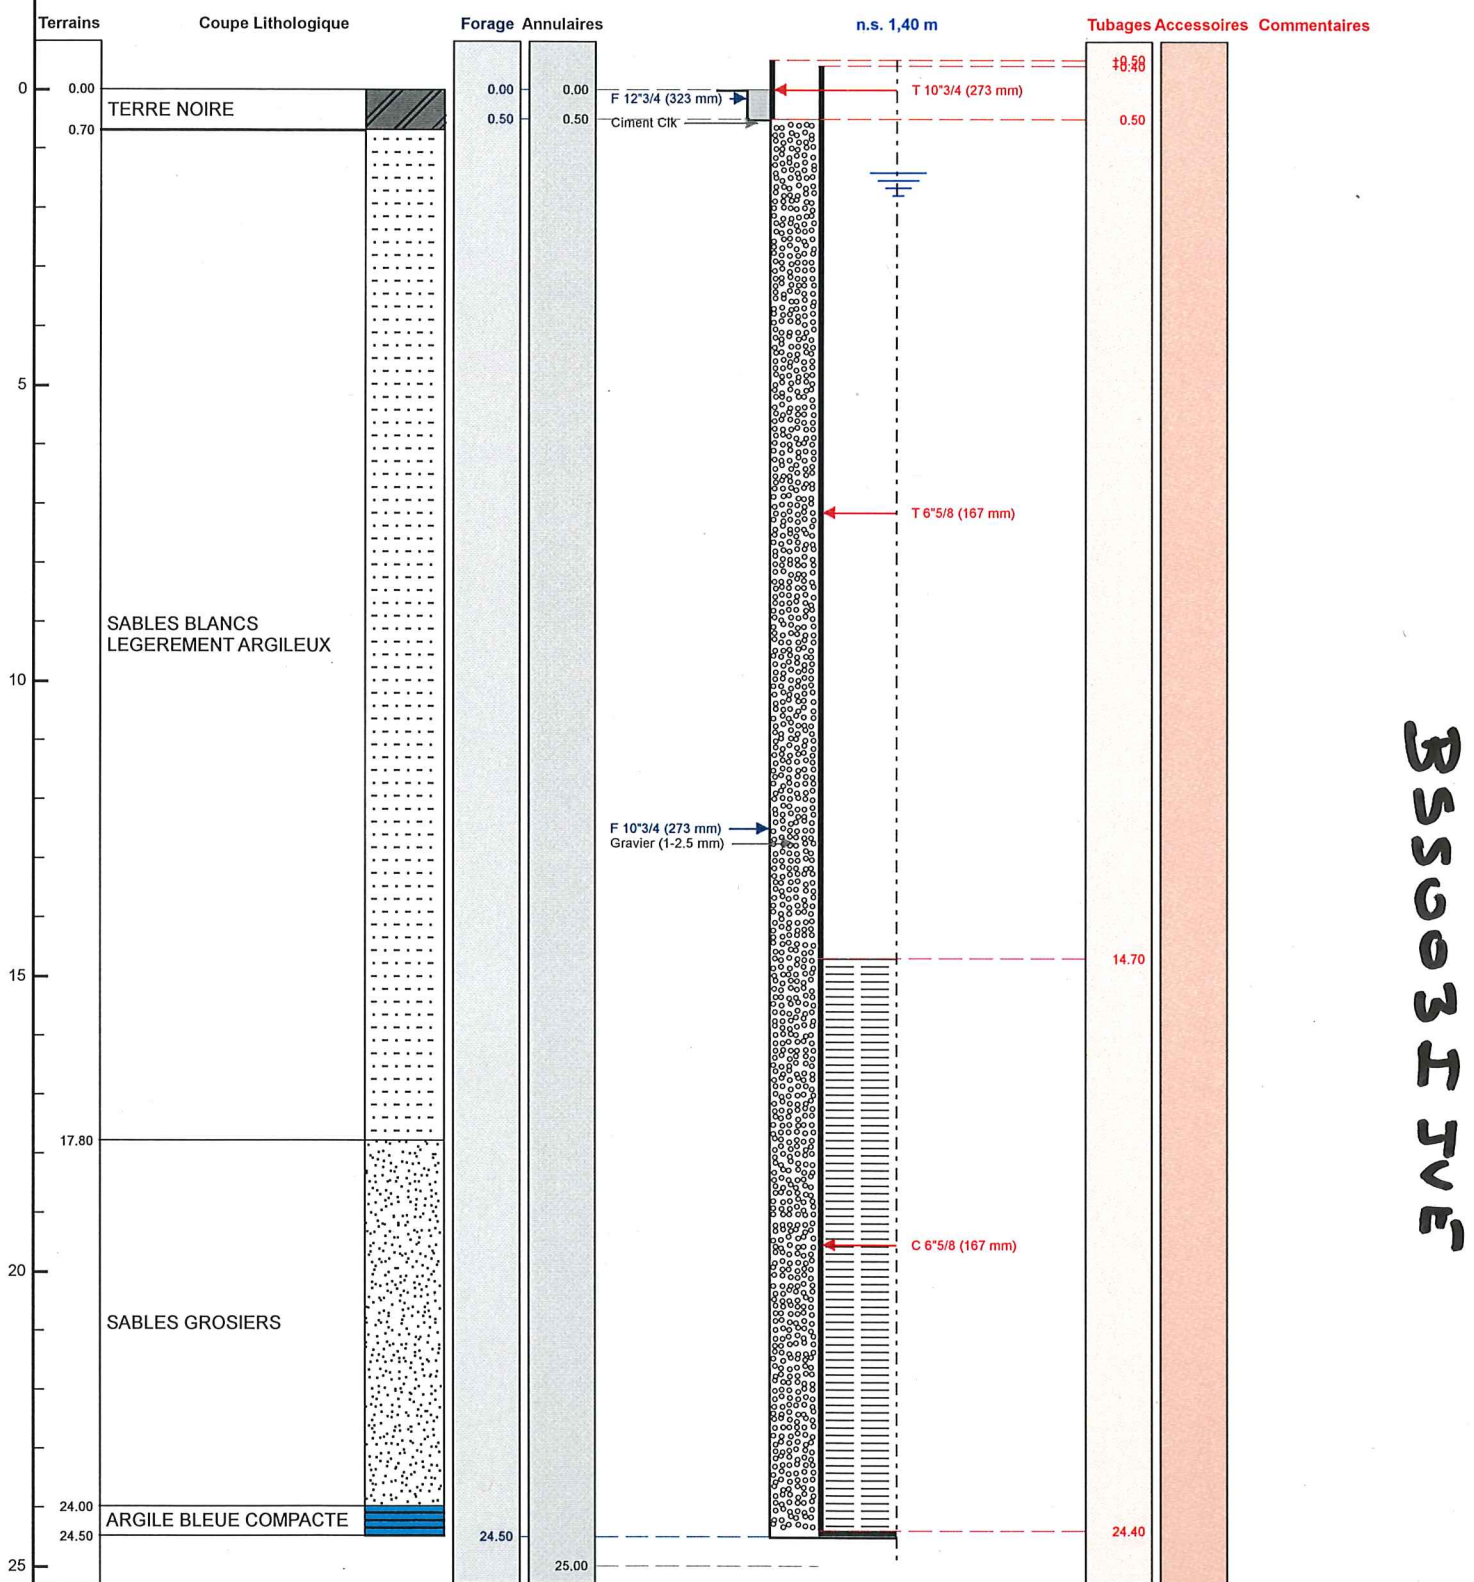

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
