

**POMPAGE D'ESSAI****FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

<b>Client:</b>			
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>ANTEA</b>		
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>Stade de football</b>		
	<b>67580</b>	<b>MERTZWILLER</b>	
Profondeur utile du forage:	13.00	m	Niveau repère/sol: 0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	400	mm	Niveau statique/sol: 2.31 m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe: 0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe: 0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m <sup>3</sup> /h	Hauteur de refoulement maxi: 0 mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement: 0 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **11/02/2016** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau


Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
11/02/2016	08:01	0h01	5.00	3.45	3.45	1.14	
	08:15	0h15		3.45	3.45	1.14	
	08:30	0h30		3.45	3.45	1.14	
	09:00	1h00		3.45	3.45	1.14	
	09:01	1h01	10.00	4.83	4.83	2.52	
	09:15	1h15		4.83	4.83	2.52	
	09:30	1h30		4.83	4.83	2.52	
	10:00	2h00		4.83	4.83	2.52	
	10:01	2h01	12.00	5.30	5.30	2.99	
	10:15	2h15		5.33	5.33	3.02	
	10:30	2h30		5.36	5.36	3.05	
	11:00	3h00		5.38	5.38	3.07	

Date début: 11/02/2016

Heure début: 08:00

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai

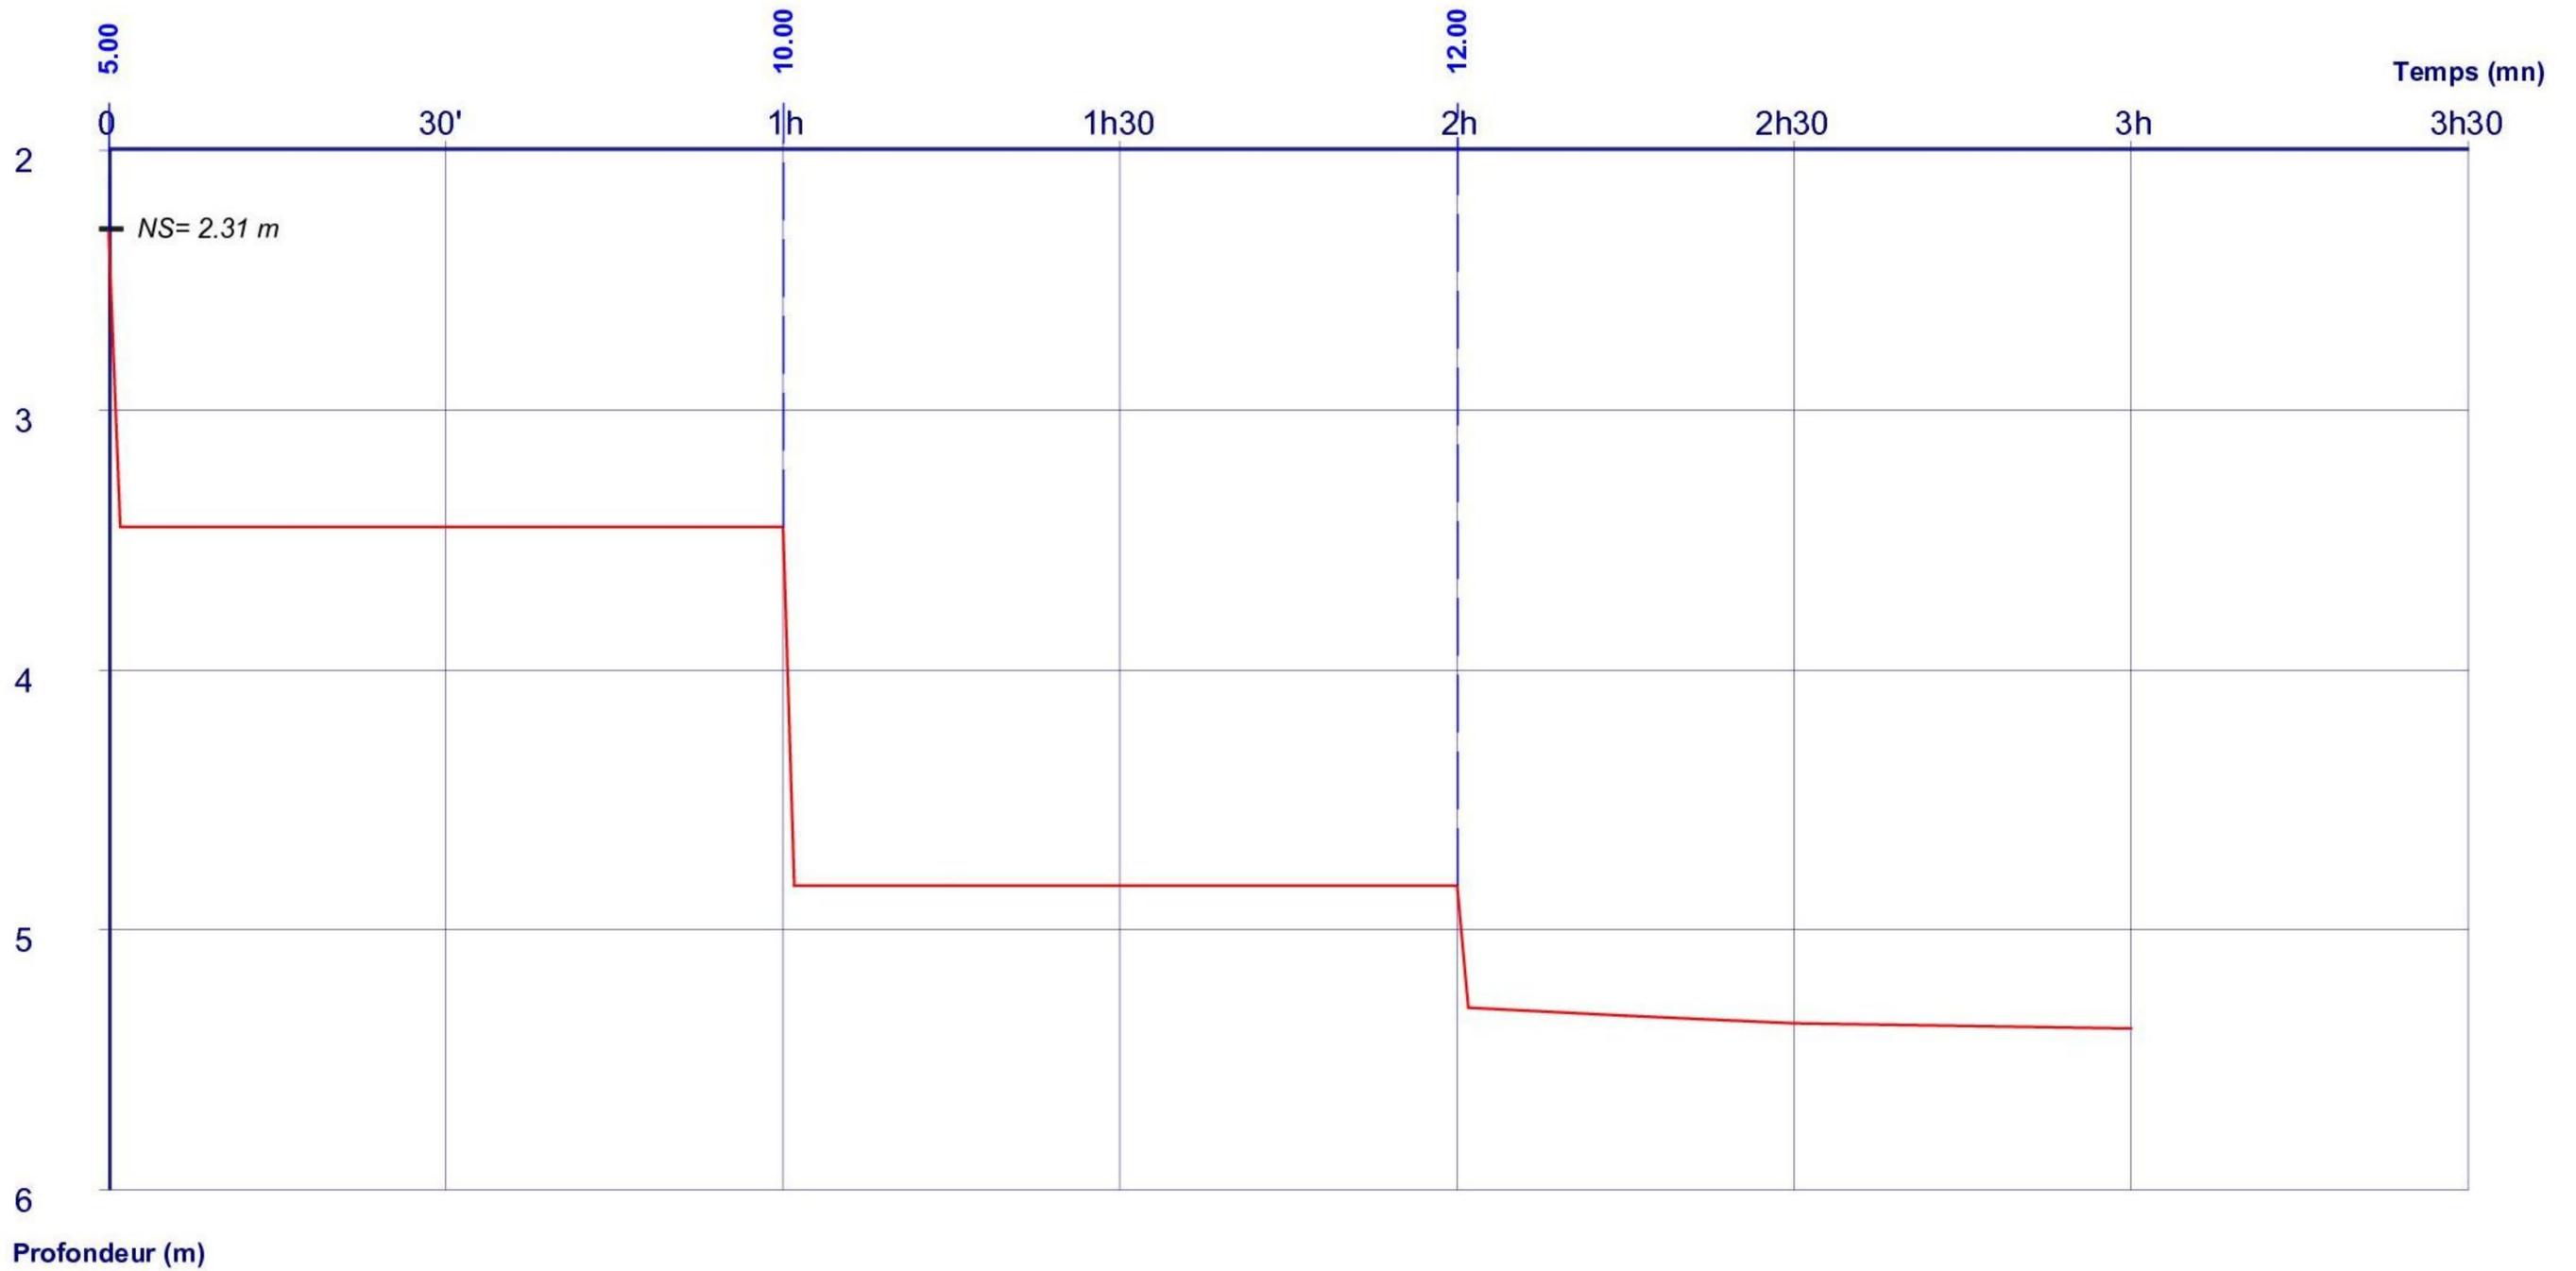

Débits:

0h00 - 1h00	=	5.00 m3/h
1h00 - 2h00	=	10.00 m3/h
2h00 - 3h00	=	12.00 m3/h
