

BSS003NVJM



ENVOLIS

Expertise eau

949 avenue du parc des expositions - 33260 LA TESTE DE BUCH
05 56 54 44 23 mail : contact@envolis.fr

FICHE CARACTERISTIQUES OUVRAGE

Département : Gironde (33)
Commune : 33 160 Saint-Médard-en-Jalles
Client : CDC BIODIVERSITE
Adresse : 102, rue Réaumur
75 002 PARIS
Date réalisation : 04/12/2019
Profondeur ouvrage : 3,40 m/TN
Objet : Piézomètre
Niveau statique : 0,01 m/TN (05/12/2019)
0,39 m/capot (05/12/2019)


IDENTIFICATION : PZ 11

Coordonnées (Lambert 93)
X : 399870,34 Y : 6431541,15



Entreprise forage : ENVOLIS

de	à	COUPE GEOLOGIQUE	Etage
TN	- 0,30 m/TN	Sable noir saturé en eau	Quaternaire
- 0,30 m/TN	- 0,70 m/TN	Sable blanc (légèrement argileux) saturé en eau	Quaternaire
- 0,70 m/TN	- 1,80 m/TN	Sable argileux beige saturé en eau	Quaternaire
- 1,80 m/TN	- 3,40 m/TN	Sable et argile beige à gris saturé en eau	Quaternaire

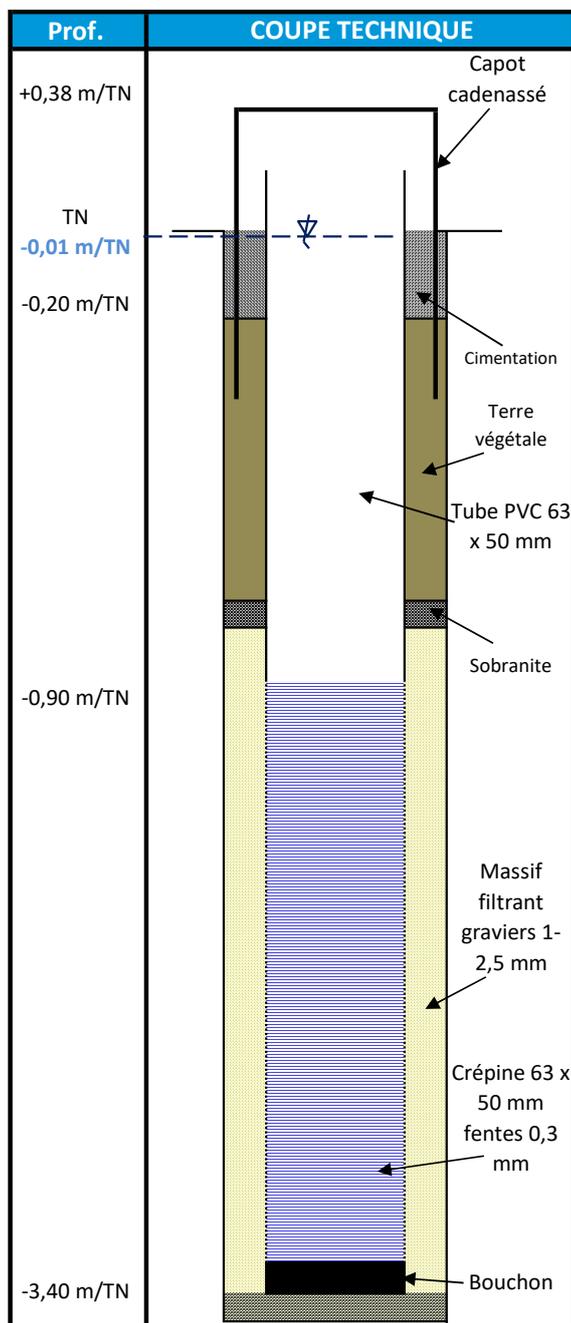

OBSERVATIONS CHANTIER

Implantation réalisée d'après un plan fourni par le client : CDC BIODIVERSITE.

TN = Terrain Naturel avant intervention

DEROULEMENT TRAVAUX

TN	-3,40 m/TN	Forage diamètre 125 mm
+0,33 m/TN	-0,90 m/TN	Mise en place tube plein forage diam. 63 x 50 mm
-0,90 m/TN	-2,40 m/TN	Mise en place crépine 0,3 mm diam. 63 x 50 mm
TN	-0,20 m/TN	Cimentation annulaire en surface
-0,20 m/TN	-0,65 m/TN	Terre végétale/Sable
-0,65 m/TN	-0,70 m/TN	Sobranite
-0,70 m/TN	-3,40 m/TN	Massif filtrant de graviers calibrés 1 - 2,5 mm
+0,38 m/TN	-0,62 m/TN	Capot métallique cadénassé
