

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'ARROSAGE

à
Val de Vesle (51)

BSS004BADK

Affaire suivie par :

**TRAVAUX REALISES
LE
5 Janvier 2021**

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	6 Impasse de la Vesle - 51360 Val de Vesle		
Date :	05/01/2021	n° DRIRE :	2279/2021
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage		
Lieu du chantier :	Val de Vesle, Courmelois		

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	20,45
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	8,00	280	Tarière	à sec
8,00	9,00	200	Battage	à sec
9,00	20,50	171	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	9,00	200	200/184	PVC		x
-0,75	8,30	140	140/126	PVC		x
8,30	20,40	140	140/126	PVC	x	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	6 Impasse de la Vesle - 51360 Val de Vesle		
Date :	05/01/2021	n° DRIRE :	2279/2021
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage		
Lieu du chantier :	Val de Vesle, Courmelois		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	8,00	CPJ45	x		280	200
0,00	8,00	CPJ45	x		184	140
8,00	8,30	Jupe			184	140

POMPAGE	NS (m) :	2,44	Côte / Sol (m):	-0,75	Pompe :	SP 8/10
----------------	----------	------	-----------------	-------	---------	---------

ND (m)	Q (m3)	Temps
2,50	13,00	2h
+ Arrêts // Démarrages		
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
2,50	13,00	1h
Débit spécifiques		
Q' =	216,67	m ³ / h / m


Observations :


La crépine de la pompe de surface ou le bas de la pompe immergée sera positionnée à -8,00 m maximum.

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	6 Impasse de la Vesle - 51360 Val de Vesle	
Date :	05/01/2021	n° DRIRE : 2279/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Val de Vesle, Courmelois	

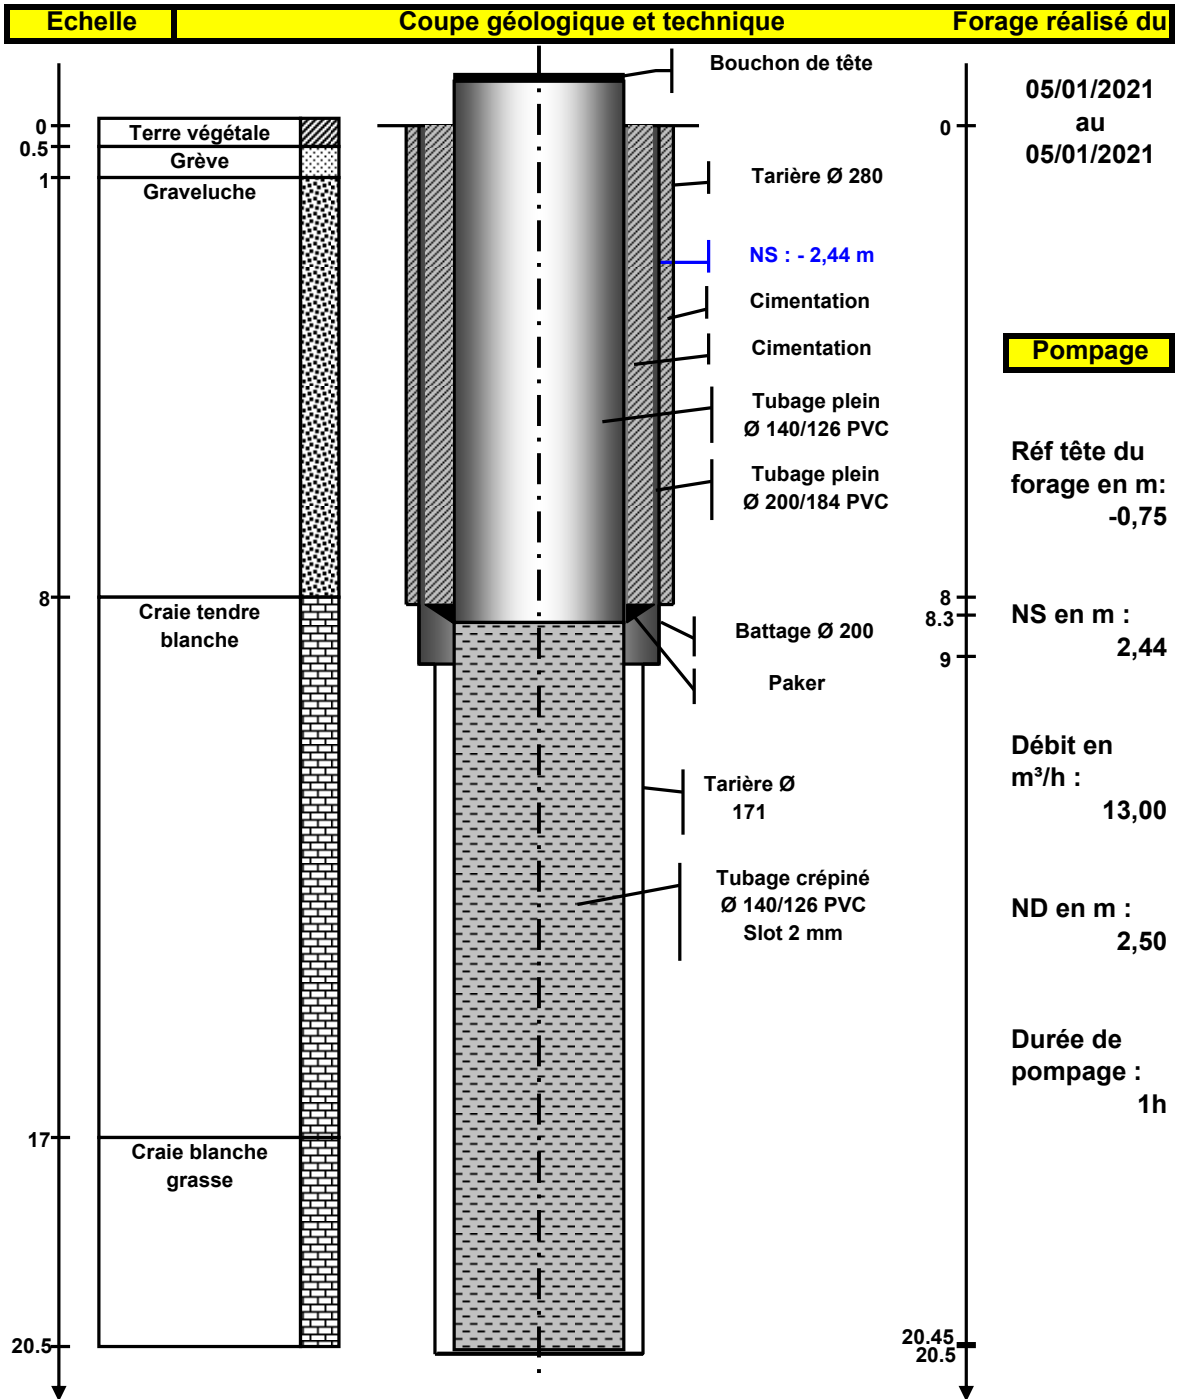

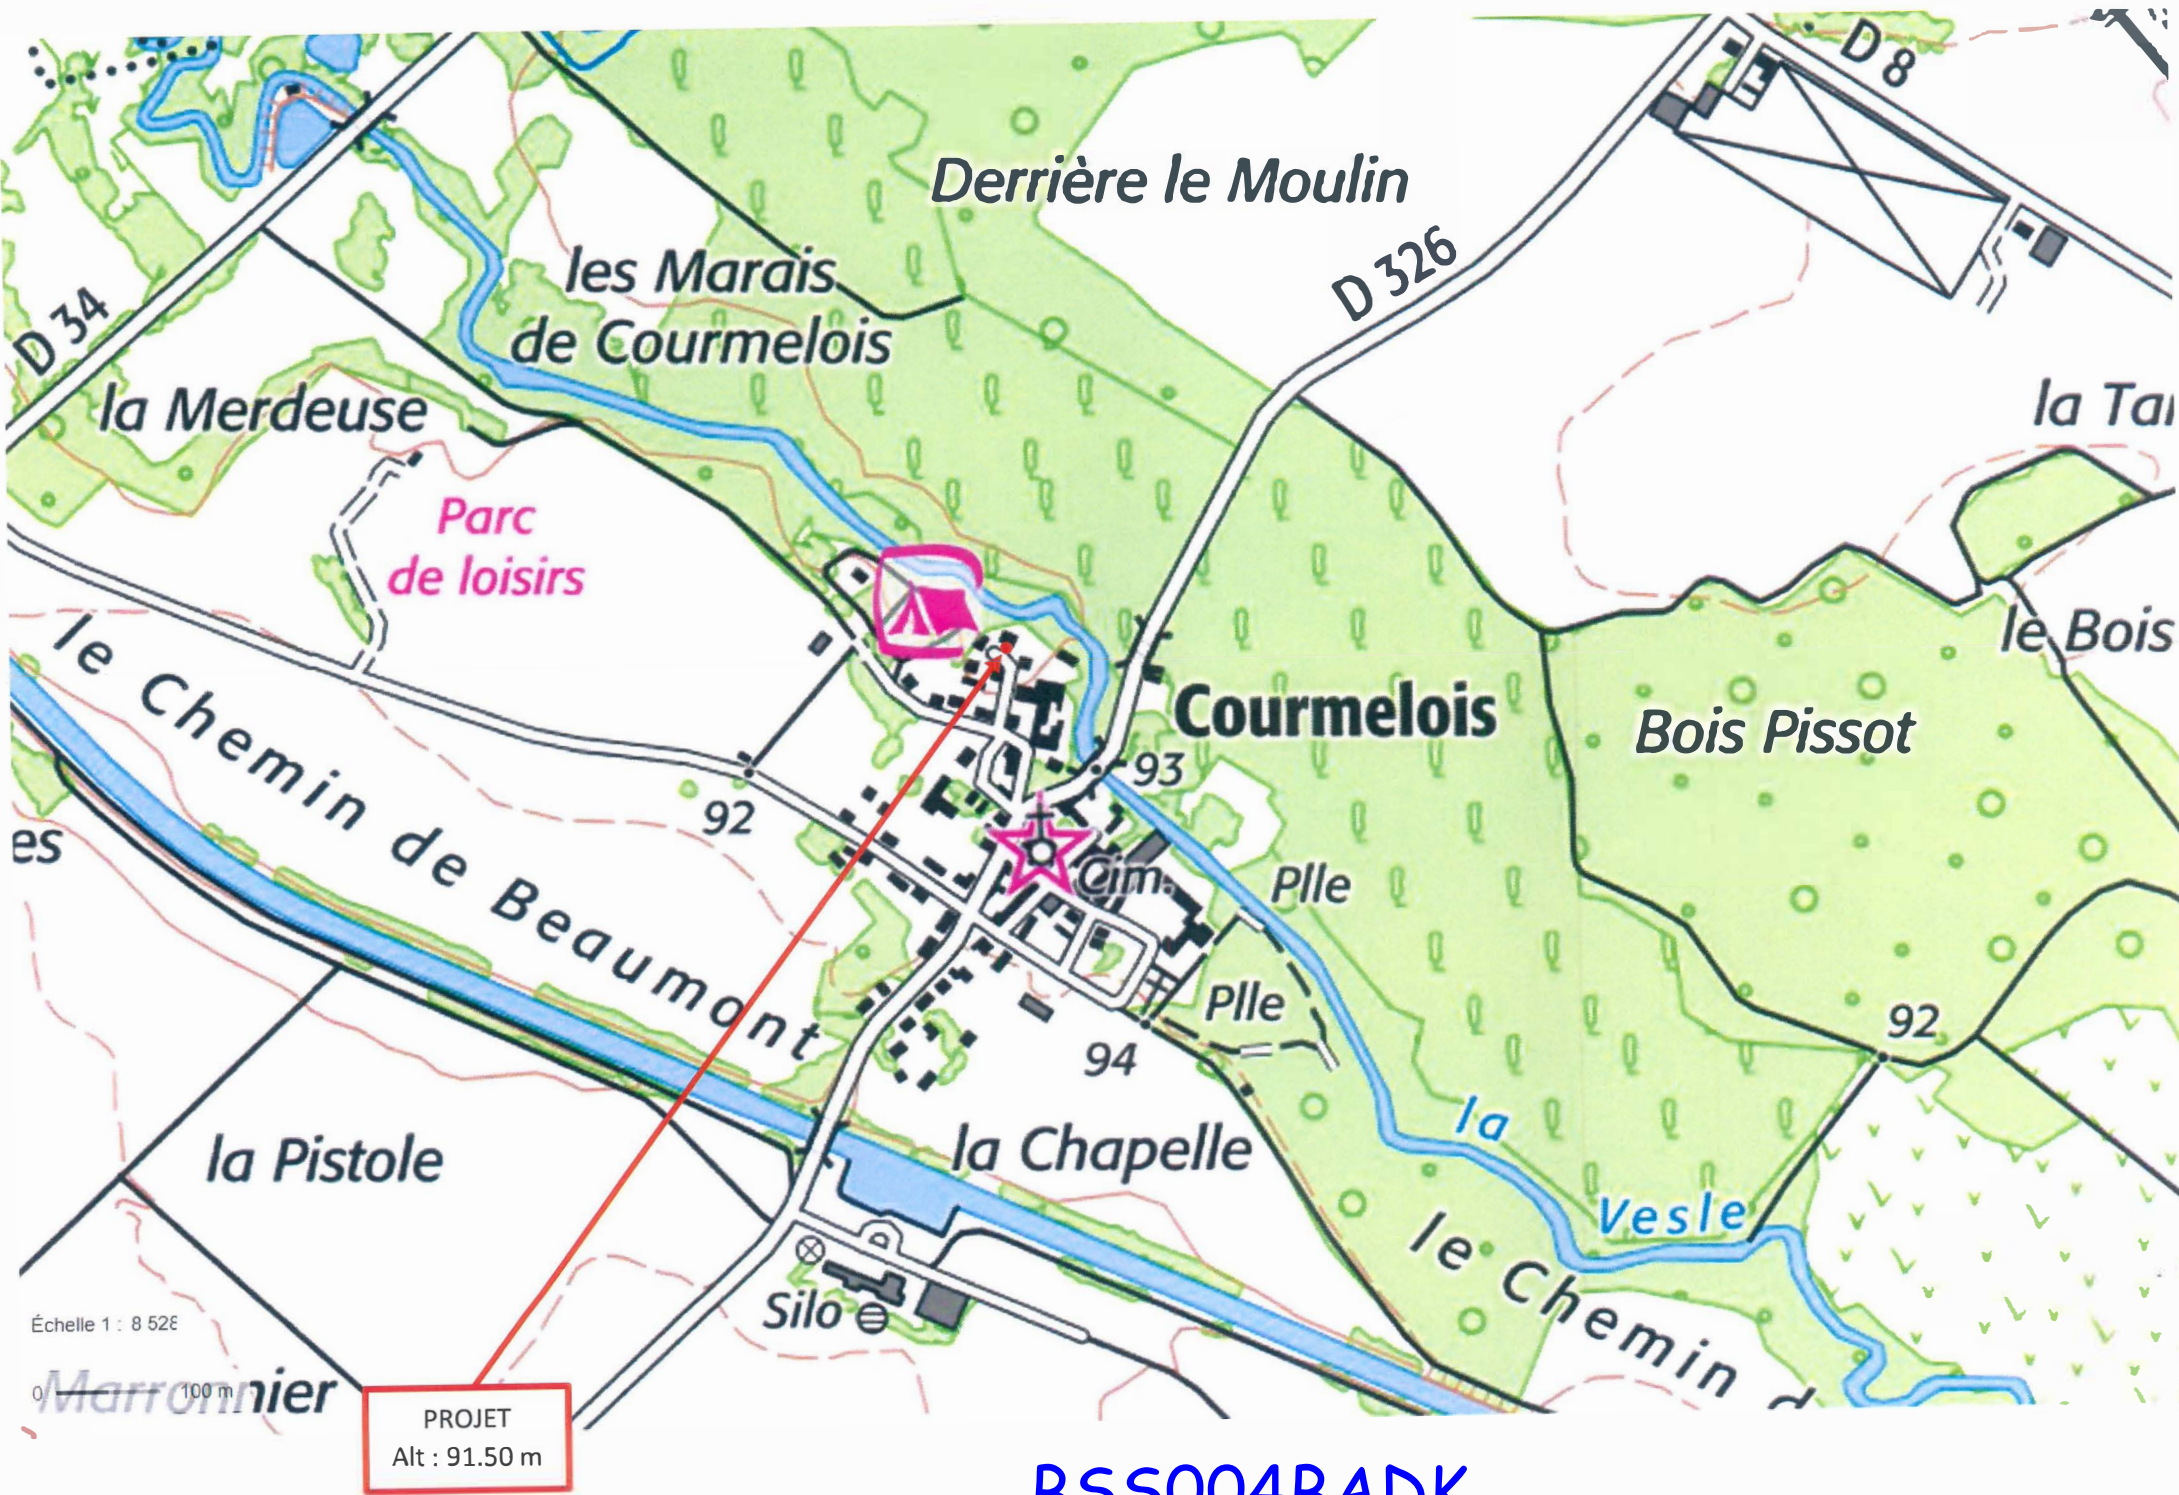

PROJET
Alt : 91.50 m

BSS004BADK
