

FORAGE D'EAU

Entreprise:	GTR FORAGES
Client:	GAEC DE LA BERTINIERE
Maître d'oeuvre:	GDS SERVICES
Exploitant:	GAEC DE LA BERTINIERE

Code National BSS : BSS004BLFM

N° Déclaration ** : 13-61-002

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : La Bertiniere

61600 LA SAUVAGERE

Coordonnées : Longitude 000°25'34,96"W Latitude 048°37'20,3"N **Altitude :** 240.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 06/03/2013

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 07/03/2013

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 5.75 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Air lift de nettoyage pendant 1 heure



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



Client: GAEC DE LA BERTINIERE

Maître d'oeuvre: GDS SERVICES

Lieu de l'ouvrage : La Bertiniere

61600 LA SAUVAGERE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre
0.50	18.00	Granite jaune
18.00	64.00	Granite bleu

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	64.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
12.00	1.00
28.00	2.50
63.00	4.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	29.50	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
29.50	56.05	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
56.05	59.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
59.00	61.95	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
61.95	63.90	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Gravitaire			
10.00	11.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				0.03
11.00	64.00	4"7/8	125.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	0.97

FORAGE D'EAU

Client : **GAEC DE LA BERTINIERE**
 Maitre d'oeuvre : **GDS SERVICES**
 Localisation de l'ouvrage : **La Bertiniere**
61600 LA SAUVAGERE


Travaux réalisés : **1/1**
 du : 06/03/2013 au : 07/03/2013

Coordonnées de l'ouvrage :
 Géographique
 Longitude (X): 000°25'34,96"W
 Latitude (Y): 048°37'20,3"N
 Altitude sol (Z): +240,000 m

Echelle : 1/322

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

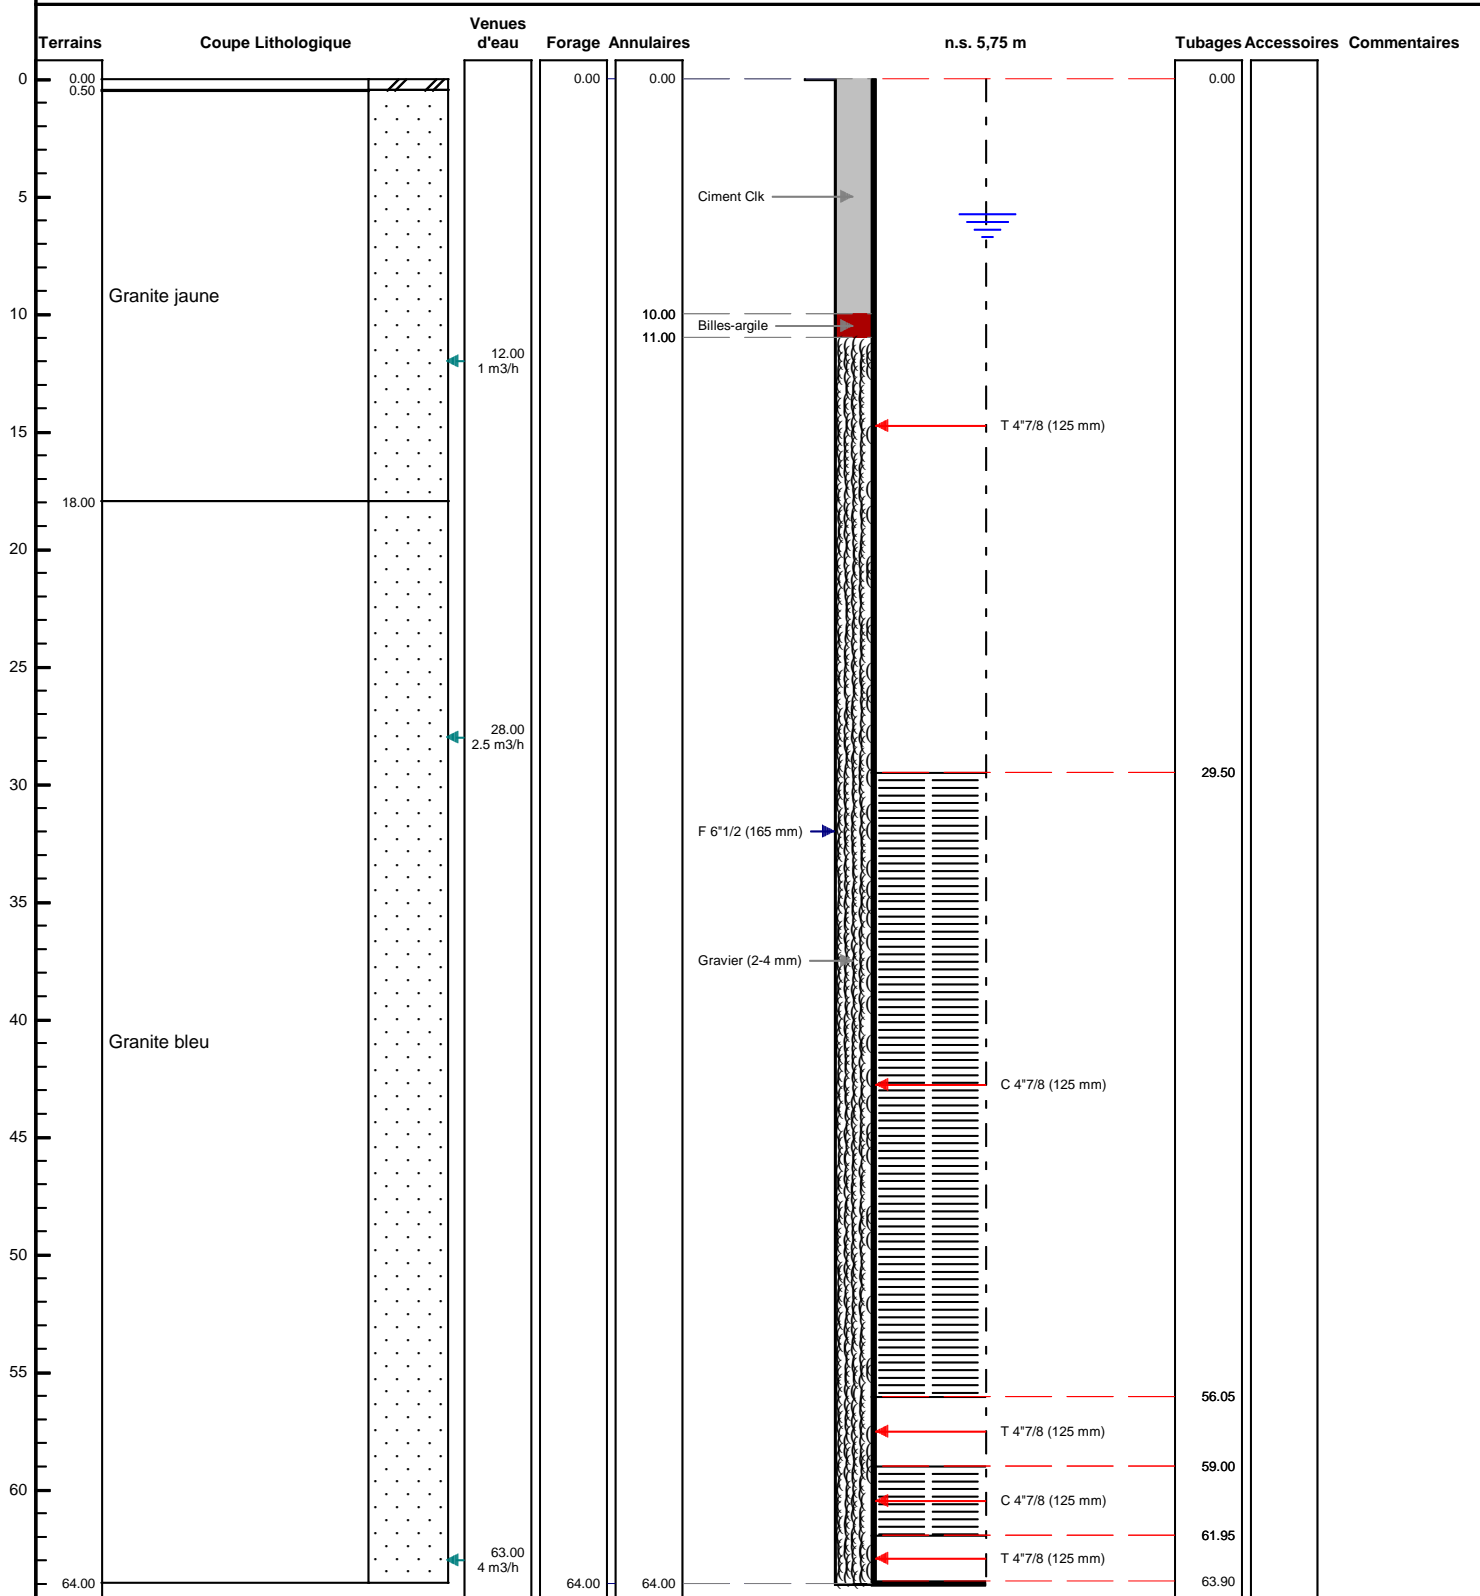

Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise
