

DOSSIER TECHNIQUE

PIEZOMETRE



Entreprise:	AQUAFORAGE
Client:	ORANO MINING SA 2 Rte de Lavaugrasse - CS 30071 87250 BESSINES SUR GARTEMPE
Maître d'oeuvre:	ORANO MINING SA 2 Rte de Lavaugrasse - CS 30071 87250 BESSINES SUR GARTEMPE
Exploitant:	ORANO MINING SA 2 Rte de Lavaugrasse - CS 30071 87250 BESSINES SUR GARTEMPE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Site de Lodève-Soumont - Route du Mas d'Alary
34700 SOUMONT

Coordonnées : Longitude 003°20'29,26"E Latitude 043°42'20,27"N **Altitude :** 198.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 09/12/2019 **Resp. M. Ouvrage :** P. CHIRI

Date fin de l'ouvrage : 20/12/2019 **Resp. M. Oeuvre :** P. CHIRI

Machine : FOREUSE PORTEUR **Resp. Chantier :** MIAS

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 44.33 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 8.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIEZOMETRE



Client: ORANO MINING SA
Maître d'oeuvre: ORANO MINING SA
Lieu de l'ouvrage : Site de Lodève-Soumont - Route du Mas d'Alary
34700 SOUMONT

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	115.80	Calcaire plus ou moins clair

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	3.00	13"7/8	352.00	M.f.t.	Air
3.00	35.00	10"3/4	273.00	Roto-percussion	Air
35.00	115.80	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	35.00	4"7/8	125.00	6.00		P.v.c.	Tube-plein		
-0.50	35.00	7"5/8	193.70	6.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
35.00	112.20	4"7/8	125.00	6.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
112.20	115.20	4"7/8	125.00	6.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	33.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 45	Gravitaire			0.56
33.00	35.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Sopranite				
0.00	35.00	7"5/8	193.70	Ciment	Cpa 45	Gravitaire			0.72
35.00	115.20	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	0.90
115.20	115.80	Rebouc	0.00	Remblai					

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
-0.50	-0.50	Tête de forage
115.20	115.20	Bouchon

PIEZOMETRE

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : Site de Lodève-Soumont - Route du Mas d'Alary

34700 SOUMONT

Travaux réalisés :

du : 09/12/2019 au : 20/12/2019

1\1

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

Longitude (X): 003°20'29,26"E


Latitude (Y): 043°42'20,27"N

Altitude sol (Z): +198,000 m

Echelle : 1/584

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

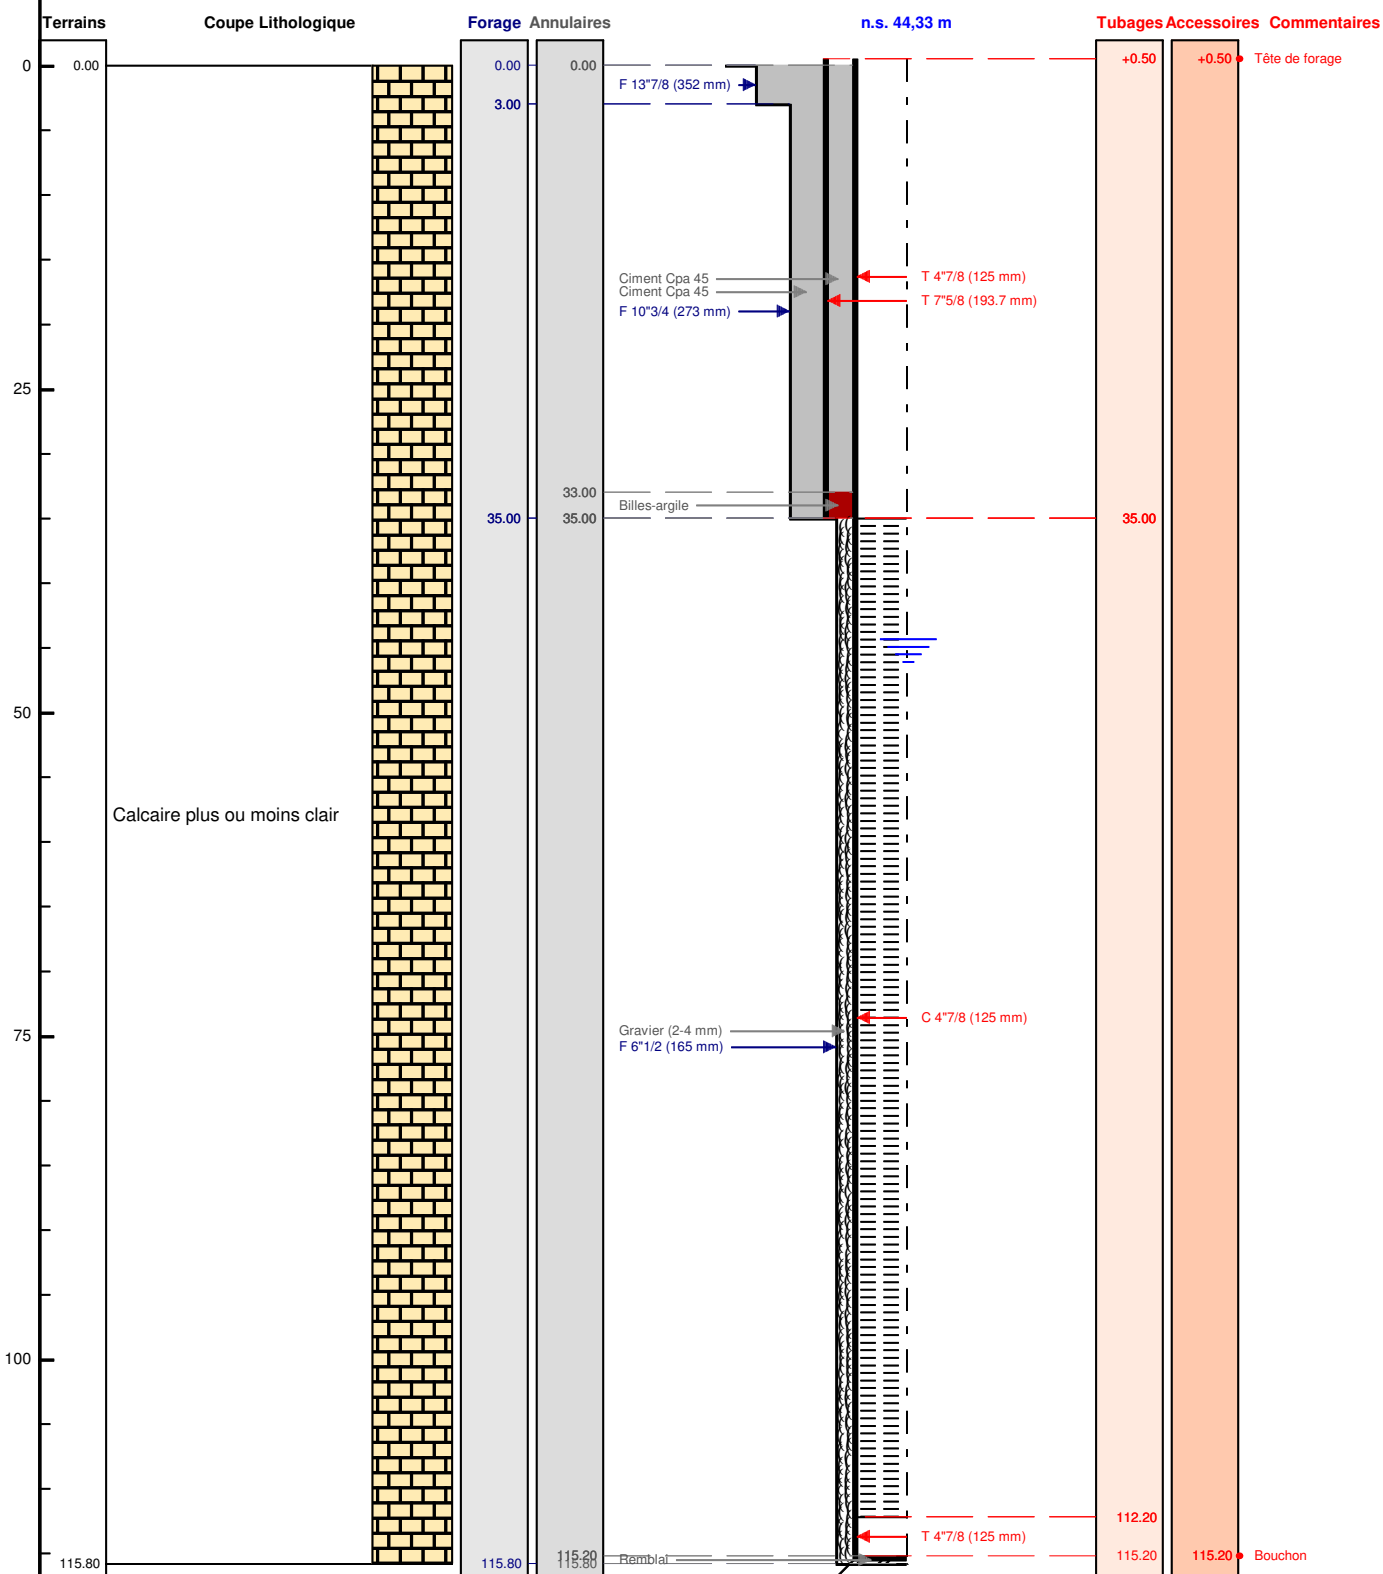

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise
