



bourgeois.forage@orange.fr
24 rue du Corps de Garde
10700 Chapelle Vallon
Port : 06.19.18.37.35
Tel : 03.25.47.30.72
Site : www.bourgeois-forage-aube.fr

BSS004JRQB

2-FORAGE DE REINJECTION :

2.1-Méthodologie :

-de 0m à -20m : foration au Rotary à l'eau claire Tricône à dents Ø 203mm

2.2-Equipement en PVC de Ø 115/125mm manchonné :

-de 0m à -10m : tube plein

-de -10m à -20m : tube crépiné fentes de 1mm

Mise en place d'un bouchon de fond PVC manchonné

Tête de puits : capot PVC vissé

2.3-Massif filtrant :

-de -8m -20m : mise en place de gravillon siliceux calibré 4/8mm

2.4-Etanchéité :

-de -6m à -8m : mise en place d'un bouchon d'argile gonflante de type Orégonite

2.5-Cimentation :

-de -0,70m à -6m : cimentation annulaire avec injection par canne de coulis de ciment Calcia

2.6-Lithologie :

-de 0m à -0,40m : terre végétale

-de -0,40m à -10,50m : craie jaune

-de -10,50m à -20m : craie blanche

2.7-Essai de pompage :

Repère au PVC à + 0,60m du sol

NS = 5,01m

ND = 7,50m

Débit = 8m³/h

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BOURGEOIS FORAGE
Client:	<div></div> <div>11 CHENEVIERES</div> <div>51120 ST QUENTIN LE VERGER</div>
Maître d'oeuvre:	<div></div> <div>11 CHENEVIERES</div> <div>51120 ST QUENTIN LE VERGER</div>
Exploitant:	<div></div> <div>11 CHENEVIERES</div> <div>51120 ST QUENTIN LE VERGER</div>

Code National BSS : **BSS004JRQB**

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

51120 ST QUENTIN LE VERGER

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/11/2023 Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 23/11/2023 Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK 440 Resp. Chantier :

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 5.01 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 8.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 2.49 m

Notes : REALISATION D'UN FORAGE DE REINJECTION DE 20 METRES

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

51120ST QUENTIN LE VERGER

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.40	TERRE VEGETALE
0.40	10.50	CRAIE JAUNE
10.50	20.00	CRAIE BLANCHE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"	203.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
10.00	20.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.70	6.00	4"7/8	125.00	Ciment	Coulis	Injection par canne			0.11
6.00	8.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Oregonite				0.04
8.00	20.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	0.24

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
20.00	20.00	Bouchon

FORAGE D'EAU		Travaux réalisés :	1/1
		du : 22/11/2023 au : 23/11/2023	
Client :		Coordonnées de l'ouvrage :	
Maitre d'oeuvre :		Lambert 1 carto métrique	
Localisation de l'ouvrage :		Longitude (X):	0
		Latitude (Y):	0
		Altitude sol (Z):	+0,000 m
	51120 ST QUENTIN LE VERGER		

Localisation de l'ouvrage :

51120 ST QUENTIN LE VERGER

Travaux réalisés : 1\1
du : 22/11/2023 au : 23/11/2023

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/101

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

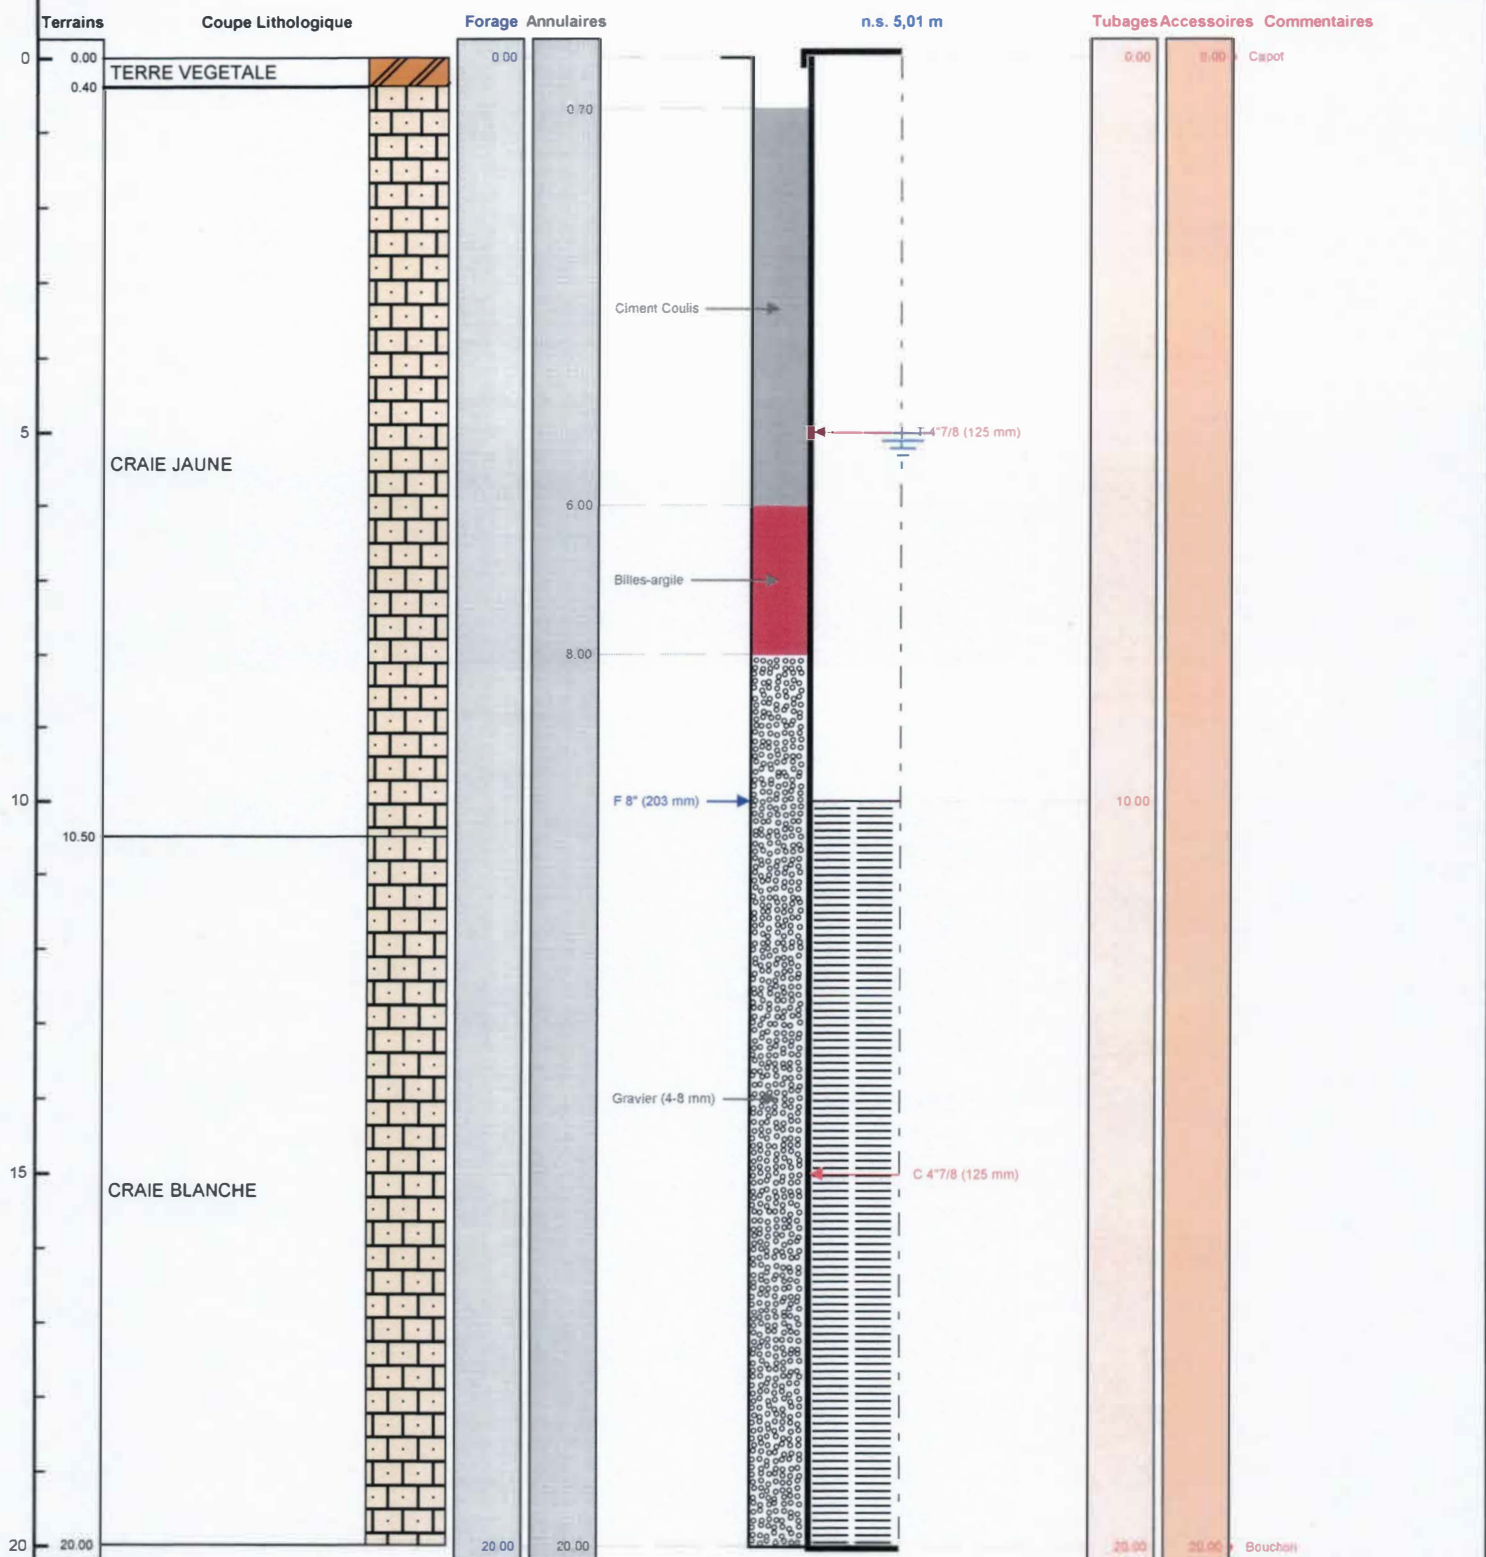

Le 04.11.2023 à Leptevallon
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

EURL BOURGEOIS FORAGE

24 Rue du Corps de Garde

10700 CHARLEE WALLON

Port. 06 18 18 33 35 03 25 47 30 72

Mail: bourgeois.forage@orange.fr

SUBJECT: [REDACTED]

Lambert 1 carto métrique	Long.:	0	Lat.:	0	Alt.:	+0,000	m
--------------------------	--------	---	-------	---	-------	--------	---

PAGE: 3

BSS004JRQB
