DOSSIER TECHNIQUE

PZ3

Entreprise: **SUBTERREA**

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : ZA La Varenne
63300 THIERS

Coordonnées : **Longitude** 739 274 **Latitude** 6 526 215 ***Altitude :***
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 17/07/2019

Date fin de l'ouvrage : 18/07/2019

Machine :

Resp. M. Ouvrage :

Resp. M. Oeuvre :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Date fin de pompage :

Nombre de nappes identifiées :

Niveau statique non perturbé : 5.03 m

Débit Maxi. d'essai :

Rabattement correspondant :

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

PZ3

Client:	
Maître d'oeuvre:	
Lieu de l'ouvrage :	**ZA La Varenne**
	63300 **THIERS**

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.10	Sables fins argileux beiges
3.10	3.50	Sables argileux noirs
3.50	5.30	Sables et graviers beiges
5.30	5.80	Sables grossiers beiges
5.80	10.00	Sables argileux gris-vert

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	9.56	4"1/2	115.00	M.f.t.	Air

** Reconnaissance*

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	2.56	2"1/2	63.00	0.00		Autre	Tube-plein		
2.56	9.56	2"1/2	63.00	0.00		Autre	Crepine fentes		
9.56	9.60	2"1/2	63.00	0.00		Autre	Bouchon-de-pied		

PZ3

Client :

Maitre d'oeuvre :


Localisation de l'ouvrage : ZA La Varenne

63300 THIERS

Travaux réalisés : 1\1
du : 17/07/2019 au : 18/07/2019

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert-93 métrique
Longitude (X): 739 274
Latitude (Y): 6 526 215
Altitude sol (Z):

Echelle : 1/50 — Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) — Nombre de forages : 1

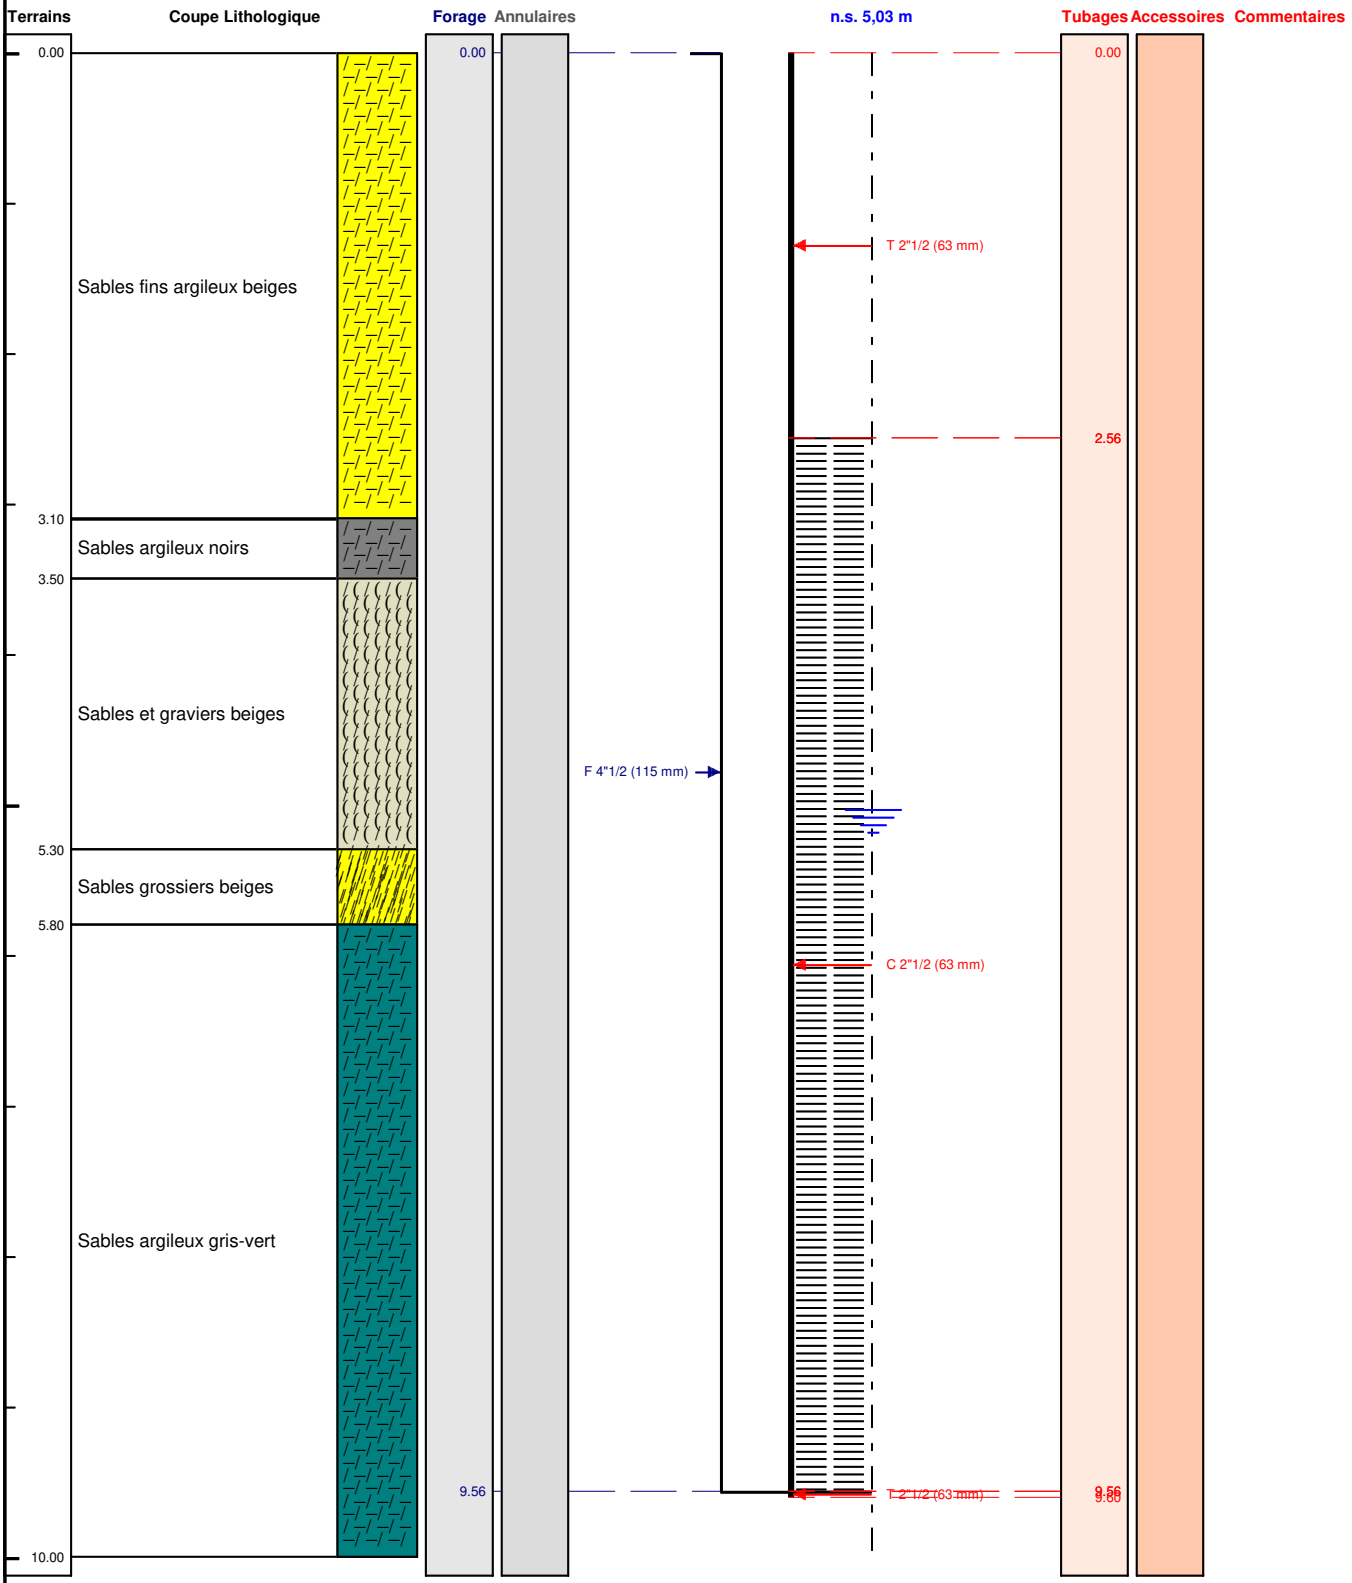

Le ...../...../..... à .....
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

SUB TERREA Forages et Géoservices
