Fiche technique piézomètre

Client	
Chantier	**Montmassacrot**

piézo n°: 113

Caractéristiques générales	
Technique	ODEX MFT
Diamètre foration	170/140mm
Equipement PVC	80x90mm
Tête de puits	capot métallique + dalle

Données Hydrogéologiques	
Venue d'eau	10m / 60m
Niveau statique	

Consommables utilisés		
PVC plein	7,0	
Crépines	55,0	
Argile	1	0,50m
Gravier	48 sacs	25kg
Cimentation	1	2m

Terrains traversés	
de --------- à	Formations
0 à 4,50 m	remblaie
4,50 à 11 m	arènes
11 à 62m	granites
	arrêt forage à 62m grosse arrivée
	d'eau à 60m

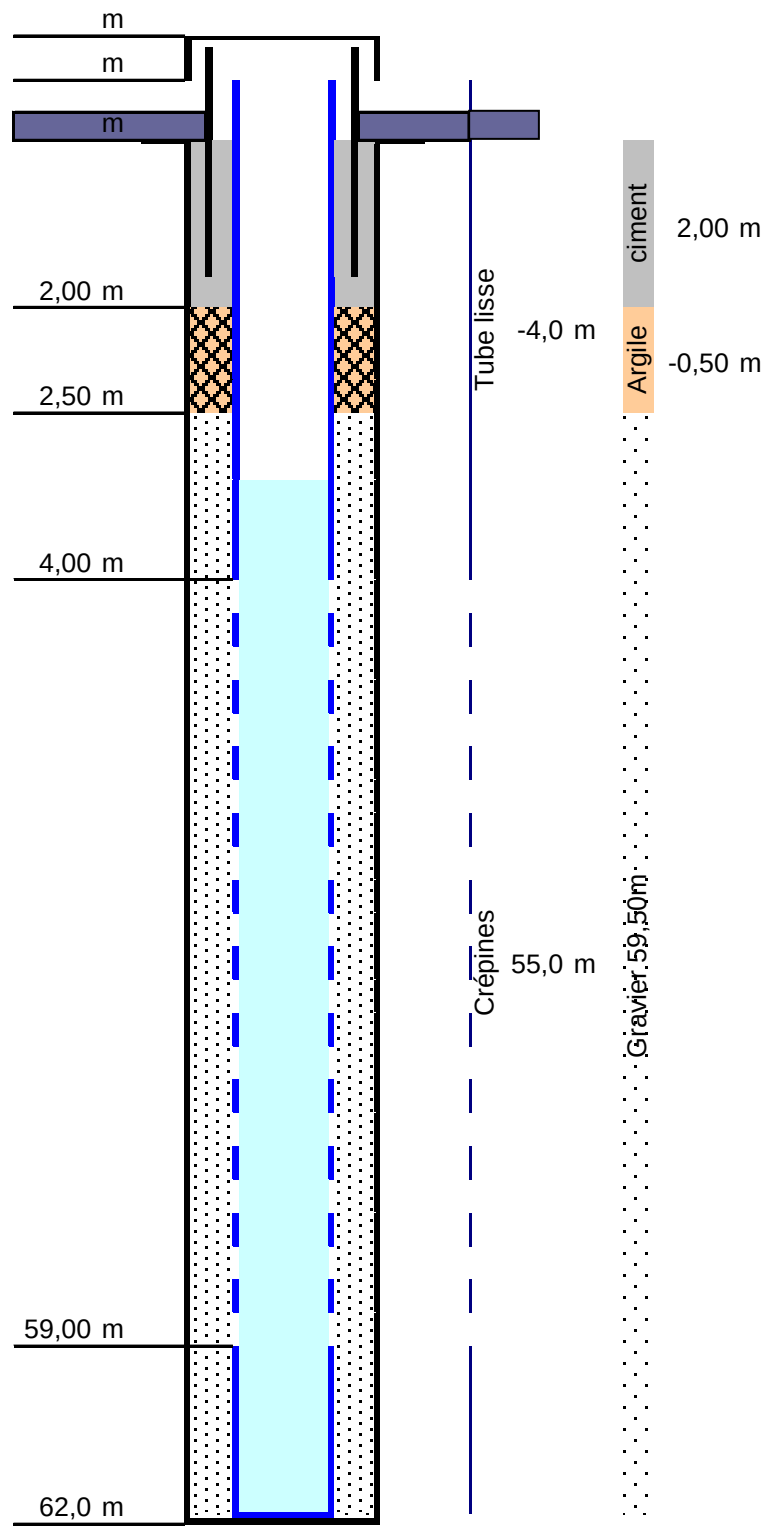

SOLTECH
GROUPE ALOMA

Fiche technique piézomètre

Client	
Chantier	**Montmassacrot**

piézo n°114 bis

Caractéristiques générales	
Technique	ODEX MFT
Diamètre foration	170/140 mm
Equipement PVC	80x90 mm
Tête de puits	capot métallique + dalle

Données Hydrogéologiques	
Venue d'eau	de 43 à 63 m
Niveau statique	

diamètre 170

Consommables utilisés (théoriques)		
PVC plein	6 m	
Crépines	64 m	
Argile	0,5 m	
Gravier	51 sacs	
Cimentation	2 m	

Terrains traversés	
de --------- à	Formations
0 à 3,2 m	Remblais
3,2 à 7 m	Arènes
7 à 43 m	alternance granites/granites altéré
43 à 62 m	Fracture argileuse avec cuttings à
	grosse granulomètrie
62 à 72 m	lamprophyre
	Arret à 72 m car trop d'éboulements
	2 m d'éboulement dans le fond du forage

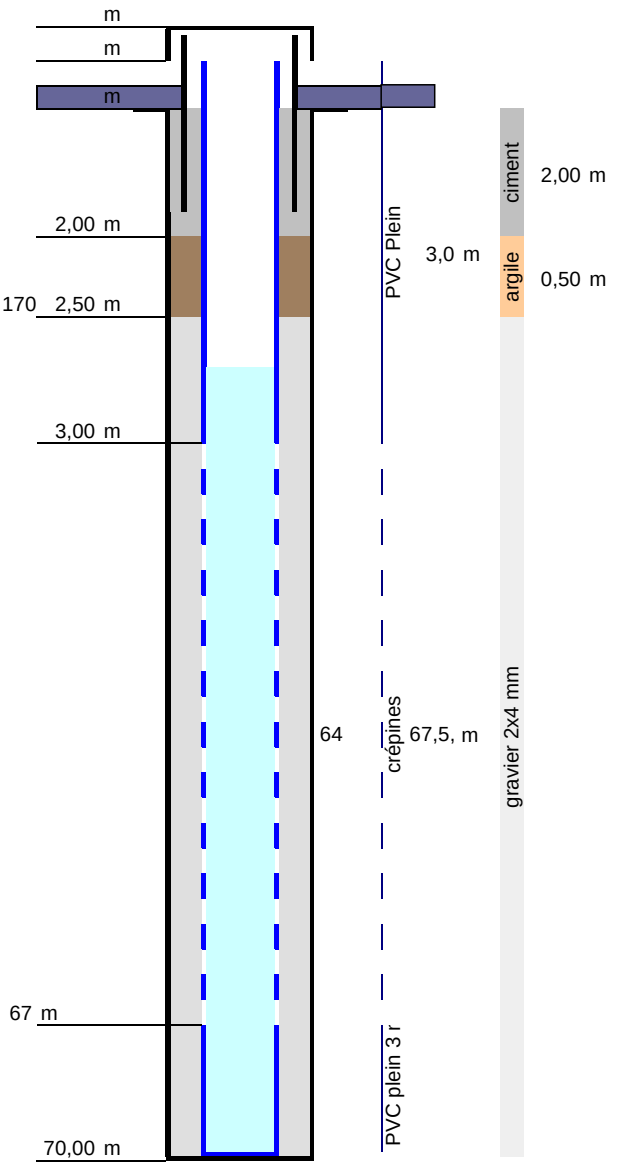

Fiche technique piézomètre

Client	
Chantier	**Montmassacrot**

piézo n°: 115

Caractéristiques générales	
Technique	ODEX MFT
Diamètre foration	170/140mm
Equipement PVC	80x90mm
Tête de puits	capot métallique + dalle

Données Hydrogéologiques	
Venue d'eau	8 à 10m
Niveau statique	10,3

Consommables utilisés		
PVC plein	6,0	
Crépines	44,0	
Argile	1	0,50m
Gravier	42 sacs	25kg
Cimentation	1	2m
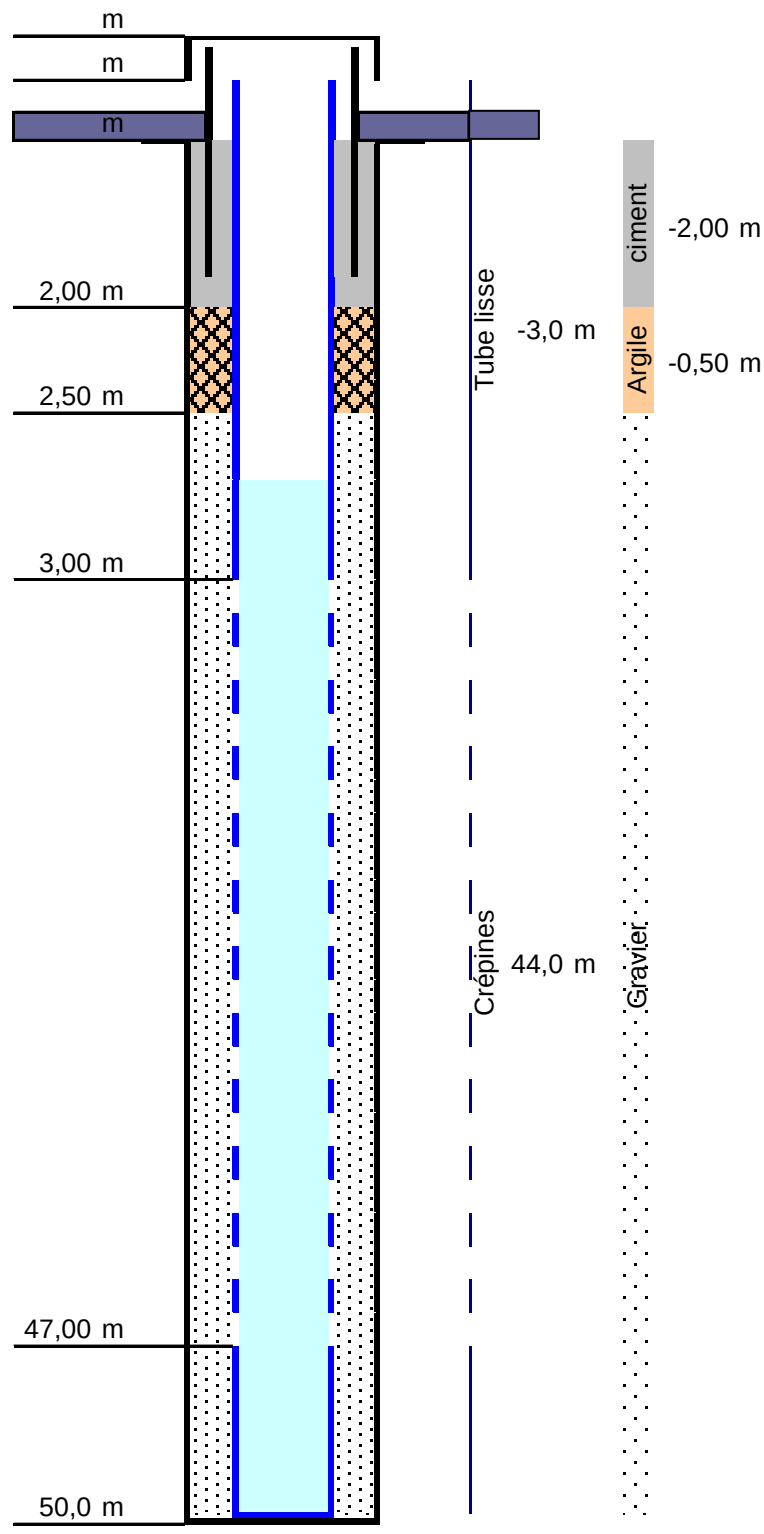
Terrains traversés	
de --------- à	Formations
0 à 8 m	arènes sableuses
8 à 20 m	granite
20 à 50 m	lamprophyre
